

Қазақстан Республикасы
Ақмола облысы
Қосшы қаласы
«Жибек-ТД» ЖШС



Республика Казахстан
Акмолинская область
город Косшы
ТОО «Жибек-ТД»

**Проект
«Санация участка русла реки Нура с
последующим укреплением берега на границах
контрактной территории карьера гравийно-
песчаной смеси (ГПС), площадью 80га,
принадлежащего ТОО «Жибек-ТД»,
расположенного на участке «Южное Косшы»
г.Косшы.**

**Руководитель
ТОО «Жибек-ТД»**

А.Д. Хожабергенова

г. Косшы 2024 г



Товарищество с ограниченной ответственностью
«Noosphere ecology system»

**Проект
«Санация участка русла реки Нура с
последующим укреплением берега на границах
контрактной территории карьера гравийно-
песчаной смеси (ГПС), площадью 80га,
принадлежащего ТОО «Жибек-ТД»,
расположенного на участке «Южное Косшы»
г.Косшы.**

Директор
ТОО «NES»



Ш.М. Баймашева

г. Караганда 2024 г.

ПЛОЩАДКА СТРОИТЕЛЬСТВА:

Проектируемый участок Санация участка русла реки Нура с последующим укреплением берега на границах контрактной территории карьера гравийно-песчаной смеси (ГПС), площадью 80га, принадлежащего ТОО «Жибек-ТД», расположенного на участке «Южное Косшы» г. Косшы

КОМПЕТЕНТНЫЙ ОРГАН: РГУ «Нура-Сарысуская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан»
г.Караганда, ул.Алиханова 11А

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области», г.Кокшетау, ул.Абая 89

СОЗАКАЗЧИК: ТОО «Жибек-ТД» г.Косшы, улица А.Есмагамбетулы 28, офис: г.Астана, пр. Б.Момышулы дом 2В, кв.45

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО «Noosphere ecology system» г.Караганда, мкр 23, дом 20/2, кВ.41

Аннотация

Цели проекта:

Предотвращение возможных затоплений с последующим укреплением берега, при прохождении паводка на участке русла реки Нура в границах контрактной территории карьера гравийно-песчаной смеси (ГПС), площадью 80га, принадлежащего ТОО «Жибек-ТД», расположенного на участке «Южное Косшы» г.Косшы, предотвращения дальнейшего загрязнения, засорения и подмыва правого берега р. Нура, поддержания водного объекта в состоянии, соответствующим санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям.

Для выполнения поставленных целей настоящим проектом предусмотрена санация р. Нура, включающая в себя:

- культуртехнические работы (береговая зона).
- спрямление и отвод русла реки от контрактной территории карьера гравийно-песчаной смеси (ГПС), площадью 80га, принадлежащего ТОО «Жибек-ТД», расположенного на участке «Южное Косшы».
- очистка дна русла реки от донных и иловых отложений.
- дноуглубительные, русло выпрямительные и берегоукрепительные работы.
- расчистка от растительности и мусора русла реки и береговой территории.

Начало проведения мероприятий по санации реки Нура – 2024 год.

Ожидаемые результаты:

- предотвращение ЧС в паводковый период;
- улучшение гидрологического режима р. Нура в районе контрактной территории карьера гравийно-песчаной смеси (ГПС), площадью 80га, принадлежащего ТОО «Жибек-ТД», расположенного на участке «Южное Косшы»;
- улучшение состояния окружающей природной среды.

Для определения видов и объемов санации проведены следующие работы:

- инженерно-геодезические изыскания;
- инженерно-геологические и инженерно-гидрологические изыскания;
- инженерно-гидрологические работы;
- изучение ранее выполненных проектных материалов и картографических материалов прошлых лет;
- изучения проектных материалов по установлению водоохраных зон, полос и режима их хозяйственного использования на р. Нура;
- обследование состояния берегов реки Нура.

Содержание

Аннотация	2
Введение	6
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	7
1.1. Месторасположение объекта.....	7
1.2. Общая характеристика реки Нура	7
1.3. Экологическая и санитарно - гигиеническая характеристика реки Нура и ее береговых зон.....	10
2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ	11
2.1. Краткая климатическая характеристика района строительства	11
2.2. Инженерно-геологические и гидрогеологические условия	12
2.3. Почвы и растительность	15
2.4. Животный мир	16
2.5. Гидрологические условия	16
3. ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ	19
3.1. Современное состояние русла реки Нура	19
3.2. Гидротехнические решения.....	22
4. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	23
5. ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА	24
5.1. Общие сведения.....	24
5.2. Характеристика земельного участка	24
5.3. Подготовка строительного производства	24
5.4. Производство работ.....	25
5.4.1. Последовательность работ.....	28
5.5. Берегоукрепительные сооружения	29
5.6. Потребности строительства.....	30
5.7. Охрана труда и техника безопасности в строительстве	30
5.8. Предложения по обеспечению контроля качества строительных работ	34
5.9. Противопожарные мероприятия при строительстве.....	35
5.10. Мероприятия по охране окружающей среды в период строительства	35
6. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	36
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	38
ПРИЛОЖЕНИЯ	39

Список приложений

Приложение 1 – Сметный расчет	40
Приложение 2 – План устройства насыпи и берегоукрепительных работ	50

Список таблиц

Таблица 2.1-1 Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере	11
Таблица 5.4.1-1 Очистка от кустарников	28
Таблица 5.4.2-1 Срезка и выемка грунта с береговой линии (создание контура русла)	28
Таблица 5.4.3-1 Очистка дна и углубление русла	28
Таблица 5.4.4-1 Устройство насыпи струенаправляющих дамб с послойным уплотнением.....	29

Список рисунков

Рисунок 1.1-1 Ситуационная схема расположения проектируемого объекта.....	7
Рисунок 2.5-1 – Гидрогеологическая карта.....	17
Рисунок 3.1-1 – Русло реки Нура	19
Рисунок 3.1-2 – Правый обрывистый берег в пойме реки.....	20
Рисунок 3.1-3 – Вид на пойму реки	20
Рисунок 3.1-4 – Заросшая пойма и русло реки	21
Рисунок 3.1-5 – Заросшая пойма и растительность на берегу	21
Рисунок 5.4-1 – Параметры дамбы	25
Рисунок 5.4-2 – Месторасположение струенаправляющей дамбы.....	27

Список условных обозначений использованных единиц измерения

$^{\circ}\text{C}$	градус Цельсия
г	грамм
ГДж	гигаджоуль
кг	килограмм
м	метр
мг	миллиграмм
МДж	мегаджоуль
с	секунда
см	сантиметр
т	тонна

Введение

Рабочий проект по санации участка русла реки Нура с последующим укреплением берега на границах контрактной территории карьера гравийно-песчаной смеси (ГПС), площадью 80га, принадлежащего ТОО «Жибек-ТД», расположенного на участке «Южное Косшы», предотвращения дальнейшего загрязнения, засорения и подмыва правого берега реки, разработан на основании Договора между ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области» с ТОО «Жибек-ТД» и ТОО «NES» и Задания на проектирование.

Проектно-сметная документация соответствует действующим в Республике Казахстан нормам и правилам и отвечает требованиям, направленным на формирование полноценной среды обитания и жизнедеятельности человека.

В целях предотвращения возможных затоплений, при прохождении паводка реки Нура, поддержания водного объекта в состоянии, соответствующим санитарно-эпидемиологическим требованиям проектом предусмотрена санация участка русла реки Нура с последующим укреплением берега на границах контрактной территории карьера гравийно-песчаной смеси (ГПС), площадью 80га, принадлежащего ТОО «Жибек-ТД», расположенного на участке «Южное Косшы».

Начало проведения мероприятий по санации реки Нура – 2024 год.

Ожидаемые результаты: улучшение гидрологического режима реки Нура, улучшение состояния окружающей природной среды, предотвращение чрезвычайных ситуаций в паводковый период.

Проектом не предусматривается *рекультивация* береговых зон и прилежащих территорий, так как после проведения строительно-монтажных работ не произойдет нарушение земель. В первичном окультуривании тоже нет необходимости, так как санация предусматривает восстановление растительного слоя.

При разработке основных положений использовалась следующая основная нормативная литература:

1. СН РК 1.02 – 03 – 2011 г. «Порядок разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство».

2. СНиП РК 3.04 – 01 – 2008 «Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования».

3. СНиП РК 1.03 – 06 – 2002 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений».

4. СНиП РК 1.02 – 18 – 2004 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.

5. СНиП РК 3.01 – 26 – 2004 Геодезические работы в строительстве.

6. СНиП РК 1.03.05 – 2001 Охрана труда и техника безопасности в строительстве.

7. СНиП РК 1.04.03 – 2008* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений».

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Месторасположение объекта

Длина исследуемого участка реки Нура составляет порядка 530 м. Как раз на этом участке, в границах контрактной территории карьера гравийно-песчаной смеси (ГПС), площадью 80га, принадлежащего ТОО «Жибек-ТД», расположенного на участке «Южное Косшы» река Нура изменила свое русло в сторону контрактной территории. Основное русло проходит у левого берега. Ширина поймы от 80 м в начале участка и 90-110 м в конце. Русло реки сильно меандрирует. Пойма густо поросла мелкими деревьями и кустарником.

Территория планируемых работ расположена в центральной части Казахского мелкосопочника и по административно-территориальному делению относится к Акмолинской области Республики Казахстан.



Рисунок 1.1-1 Ситуационная схема расположения проектируемого объекта

1.2. Общая характеристика реки Нура

Река Нура берет начало в центральной части Казахского мелкосопочника, в горах Кызылтас на высоте 1100-1250 м над уровнем моря и впадает в бессточное озеро Тениз (Тенгиз) на отметке около 304 м. Общая длина реки 978 км, площадь водосбора 58,1 тыс.км², средний уклон реки 0,7 промилле.

Бассейн реки Нуры расположен на территории Карагандинской (70% от площади водосбора реки 58,1 тыс.км²) и Акмолинской (30%) областей. Карагандинская часть реки имеет протяженность 571 км, Акмолинская - 407 км.

Средний многолетний сток реки в створе с наибольшей водностью (гидропост Романовское-с. Романовка) составляет 619 млн. м³/год. Сток зарегулирован 22 водохранилищами и множеством прудов общим полным объемом около 1 млрд. м³ с общей полезной емкостью 450 млн.м³.

Наиболее крупные притоки:

- р. Акбастау (впадает в р. Нуру с левого берега на 856-м км от ее устья, длина реки 108 км);
 - р. Ашысу (правый берег, 841-й км, длина 77 км);
 - р. Шерубайнур (левый берег, 638-й км, длина 268 км);
 - р. Есен (левый берег, 564-й км, длина 102 км);
 - р. Улькенкундызы (правый берег, 480-й км, длина 102 км).

Вся сеть основных притоков расположена в верхнем и среднем течении реки, где и происходит формирование основного стока Нуры. Между 125-м и 11-м километрами от устья, река протекает через группу озер, самое крупное из которых озеро Коргалжын, площадью 330 км² при отметке 307,5 м БС.

Водосбор реки имеет расчлененный крупнохолмистый рельеф в верхней части, типичный для мелкосопочника (группы невысоких холмов, разделенные речными долинами) в средней части и равнинный рельеф с редкими холмами и слабо выраженным водоразделом с соседними реками Ишим (Есил), Куланутпес - в нижней части бассейна р. Нуры.

Водосборная площадь реки в области мелкосопочника сложена преимущественно твердыми кристаллическими и осадочными породами со значительным распространением щебнистых грунтов. В равнинной части представлены, в основном, неогеновые глины и суглинки, перекрытые с поверхности суглинками и супесями четвертичного периода. Преобладающие почвы: каштановые разного типа и солонцеватые.

Растительный покров характерен травяными комплексами, чаще всего ковыльно-типчаковых степей. Местами в долине реки встречаются заросли кустарника.

Распаханность довольно значительная - до 30% на отдельных участках водосбора.

Долина реки в верхнем и среднем течении хорошо выражена, шириной обычно 1-2 км, в местах впадения крупных притоков - до 10 км. В нижнем течении долина выражена обычно неясно, ее пологие склоны сливаются с водоразделом, ширина долины здесь доходит до 25-30 км. Дно долины сложено, в основном, рыхлыми песчано-галечниковыми отложениями, подстилаемыми глинами и суглинками. Мощность рыхлых отложений до 30 м в равнинной части.

Ширина поймы в верховьях и среднем течении 0,5-5 км, в низовьях до 20 км, но в районе поселка Коргалжын она местами сужается до 100-300 м. Глубина затопления поймы при высоком половодье до 3 м, продолжительность затопления до 30-40 дней в нижнем течении Нуры.

Русло Нуры часто разветвляется на протоки длиной до 10 км. Часть проток превратилась в старицы. Ширина русла от 5-10 м в верховье до 30-40 см в нижнем течении. Глубина в плесах от 2 до 5 м. От озера Коргалжын до озера Тениз русло узкое, ниже озера Асаубалык русло слабо разработано и часто пересыхает.

Берега устойчивые, часто обрывистые. Высота от 10-12 м до 0,2-0,5 м. Скорости течения в межень на перекатах 0,2-1,5 м/с, на плесах - 0,2-0,5 м/с, в нижнем течении местами менее 0,1 м/с.

Река Нура. Годовой объем стока в рассматриваемом районе в среднем равен 466 млн. м³ Уровень воды в реке может подниматься на 2-3 м. В период половодья река опресняется и имеет гидрокарбонатно-кальциевую воду. В межень вода становится хлоридно-натриевой.

Озеро Коргалжын. – обширное водно-болотное пространство, расположенное в низовьях р. Нуры. Более 70 % поверхности озера покрыто густыми зарослями тростника и рогозы, которые делят его на плесы, имеющие самостоятельные названия. Султан-Кельды,

Есей, Кокай, Жаманколь, Казацкое и др. На озере около 40 небольших островков, скрытых зарослями тростника. Площадь в конце 50-х годов составляла 315 км² при длине 30 км и ширине 20 км, в конце 90-х годов – 471 км² при длине 36 км и ширине 30 км. Многолетняя амплитуда колебания уровня воды – 3 м. Максимальные глубины не превышают 2,5-3 м. Средняя глубина 1,6 м. В 1940 г. озеро было совершенно высохшим. Общая минерализация воды – от 0,648 до 2,486 г/л. Химический состав – хлоридно-натриевый. Прочие многочисленные озера в окрестностях заповедника расположены по днищам замкнутых понижений и характеризуются мелководностью, а также непостоянством площади. Весной озёра разливаются, а летом резко уменьшаются в размерах и даже пересыхают. Соляные озера превращаются в солончаки и ссоры, а пресные почти сплошь застают тростником, камышом, пыреем. Соляные озера Туз и Актайлак обладают запасами поваренной соли и лечебных грязей. Грязь не используется по причине удаленности озер от населенных пунктов, а поваренная соль из-за несоответствия государственному стандарту не имеет промышленного значения. Основной источник пополнения запасов воды в озёрах - зимние осадки в период снеготаяния. Приток воды происходит обычно в весенние половодье по степным речкам, которые слабо дренируют местность, и временными водотоками- карасу. В многоводные весны количество поступающей воды превышает норму в 5-8 раз, а в маловодные весны – стока с водосбора может и не быть.

1.3. Экологическая и санитарно - гигиеническая характеристика реки Нура и ее береговых зон

При оценке экологического состояния водных экосистем реки Нуры в качестве индикаторных биообъектов были использованы: планктон, бентос, водные растения, сельхозкультуры и ткани рыб. При выборе индикаторных видов водных организмов учитывались особенности вида, привлекательные для биохимического мониторинга, достаточную для анализа биомассу, широкий ареал распространения, способность к накоплению ртути.

По состоянию зоопланктона качество воды соответствовало III классу, т. е. умеренно загрязненные воды, однако биоценозы реки имеют в разной степени выраженные элементы биологического регресса.

Предельно допустимая концентрация (ПДК) ртути в мышцах рыбы, согласно санитарных правил и нормативов Казахстана (СанПиН 4.01.071.03 п. 29), принималась в размере 0,3 мг /кг (не хищная пресноводная рыба) и 0,6 мг/кг (хищная пресноводная рыба). У большего числа исследованных особей в мышечной ткани была обнаружена ртуть выше пределов допустимой концентрации.

При рассмотрении уровня накопления ртути по видам рыб на всех обследованных точках, можно отметить, что наиболее интенсивными аккумуляторами являются щука и окунь. Это хищные виды, таким образом, накопление ртути в теле рыбы зависит от способа ее питания.

Высшие водные растения, являющиеся одним из начальных звеньев трофической цепи, способны аккумулировать значительное количество металлов числе и ртуть, тем самым, ускоряя самоочищение воды в водоемах. Макрофиты служат своего рода биологическим фильтром, проходя через который, сточные воды в определенной степени очищаются от загрязняющих компонентов.

2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

2.1. Краткая климатическая характеристика района строительства

Климат района резко континентальный, с суровыми малоснежными зимами и жарким засушливым летом. По данным наблюдений метеостанции г. Астана средняя годовая температура +1,4°C. Наиболее теплый месяц июль (средняя температура +20,2°C), холодный – январь (-17,4°C). Максимальные зарегистрированные значения температур +40°C и -45°C. Промерзание почвы достигает 2,0м. Среднегодовое количество осадков 411мм. Высота снежного покрова не превышает 39см, среднегодовая скорость ветра составляет 5,3м/сек.

Скорость ветра 5-7м/сек, реже 12м/сек, иногда достигает до 18-22м/сек.

Основные метеорологические характеристики района и сведения на повторяемость направлений ветра в районе проведения работ, по данным многолетних наблюдений, приведены в таблице 2.1-1.

Таблица 2.1-1 Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

Наименование характеристик	Величина
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А	200,0
Коэффициент рельефа местности	1,0
Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С	20,4
Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца, град С	-15,9
Среднегодовая повторяемость направлений ветра, %	
С	6
СВ	12
В	11
ЮВ	12
Ю	14
ЮЗ	20
З	17
СЗ	8
Штиль	
Среднегодовая скорость ветра, м/с	3,2
Скорость ветра по средним многолетним данным, повторяемость которой составляет 5%	9,1

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова - 5 ноября. Из-за сильных ветров толщина снегового покрова распределяется весьма неравномерно. В основном снег сосредотачивается в пониженных частях рельефа. Возвышенные же участки часто бывают снегового покрова почти лишены. Высота снежного покрова меняется от 6 до 55 см, в среднем 16 см. Малая мощность снегового покрова и продолжительные морозы в зимний период обуславливают значительную глубину промерзания почвы (для суглинков и глин) от 67 до 260 см, в среднем – 184 см. Нормативная глубина промерзания – 210 см. Среднемноголетнее годовое количество атмосферных осадков составляет 279 мм. при колебаниях от 180 – 220 до 310 – 450 мм.

Относительная равнинность рельефа, незащищенность территории от проникновения в ее пределы воздушных масс, высокий размах колебания температур благоприятствует развитию ветровой деятельности. В течение года отмечается только 50 – 70 безветренных дней. Среднегодовая скорость ветра составляет 5,5 м/сек. Наибольшие

скорости ветра возможны один раз в году – 32 м/сек, в пять лет – 37 м/сек, в десять лет – 39 м/сек. Одной из характерных особенностей климата являются почти постоянные ветры в течение года, дующие нередко с большой силой и преимущественно зимой. Среднегодовая скорость ветров составляет 5,5 м/с. В холодный период года преобладают ветра южных направлений (Ю, ЮЗ, ЮВ), в теплое время года возрастает интенсивность ветров северо-восточного направления.

Среднемесячные значения относительной влажности воздуха в районе колеблются в пределах 54 – 81%. Высокие температуры воздуха и ветры создают дефицит влагонасыщения, который особенно возрастает летом. Среднегодовое испарение с водной поверхности определяется величиной от 600 до 700 мм, достигая в отдельные годы 900-1100 мм, испарение с почвы составляет 100-150 мм. Период интенсивного испарения совпадает с периодом выпадения максимального количества осадков. Таким образом, летние атмосферные осадки в основной своей массе испаряются, а на питание подземных вод их поступает не более 10%.

2.2. Инженерно-геологические и гидрогеологические условия

Геоморфология и рельеф

В географическом отношении территория Акмолинской области в основном расположена в северной части Центрально-Казахстанского мелкосопочника. Казахский мелкосопочник (Сары-Арка, Центрально-Казахстанский мелкосопочник; каз. Сары Арқа — «жёлтый хребет») — степь в центральном Казахстане, с небольшими, обрывистыми низкогорными массивами (отсюда и название «мелкосопочник», то есть мелкие сопки).

На западе мелкосопочник ограничен Тургайской ложбиной, на северо-востоке долиной Иртыша, на севере Западно-Сибирской равниной, на юго-западе Туранской низменностью. Протяжённость с запада на восток 1200 км, ширина на западе 900 км и на востоке 400 км. В центре расположены Каркаралинские горы (1403 м). Южнее массив Кызылрай с горой Аксоран максимальной высотой 1565 м (высшая точка мелкосопочника). На юго-западе горы Улытау (1133 м).

На севере изолированно расположена Kokчетавская возвышенность (947 м). На востоке хребты Чингизтау (1077 м), Акшатау (1305 м). По окраинам раскиданы обособленные довольно высокие массивы небольшого (15-30 км) размера - Баянаул (1026 м), Дегелен (1084 м), Жаксы-Жалгызтау (729 м), Бурабай (947 м), Нияз (833 м) и др. В южной части мелкосопочника, в 70 км от Балхаша находится массив Бектау-Ата (1213 м).

Рельеф рассматриваемого района - среднехолмистая возвышенность. Абсолютные отметки колеблются от 460 до 485м. Почвы светло-каштановые, тёмно-каштановые с пятнами солончаков суглинистые, на равнинных участках и в понижениях засолены.

На рассматриваемой территории преобладает типчаково-полынная и кустарниковая растительность. По долинам рек и логов располагаются участки луговой растительности.

Гидрогеологические условия участка работ

Характерной особенностью гидрографии рассматриваемого района является густая речная сеть и относительно большое количество временных водотоков, имеющих сток только в период весеннего снеготаяния.

Гидрографическая сеть рассматриваемого района представлена рекой Нура, река Нура является главной водной артерией огромной Тенгиз-Кургальжинской впадины. Она бреет начало с западных отрогов гор Кызылтас Каркаралы-Актауского низкогорного массива на высоте 1000-1200м. Общая длина реки 978км. Общая площадь водосбора 58100км². Основной приток Нуры – р.Шерубайнур. Впадает в озеро Тенгиз. Наиболее крупный ее приток это река Сокур.

Река Шерубайнур - за начало принято слияние двух пересыхающих логов, расположенных на западном склоне г.Жаман-Каражол с абсолютной отметкой 922м.

Впадает в р.Нуру слева на 638км от устья. Основные притоки: р.Жартас, р.Бесбалдак, р.Карамыс, р.Талды.

Р.Сокур, русло реки умеренно извилистое, слабо разветвлённое. Наибольшая ширина 40м, наименьшая 1,5-2,0м. Дно ровное, гравелисто-галечно-песчаное. Берега супесчаные и суглинистые, легко размывающиеся, высота их 0,1-2,2м. Общая площадь водосбора 15600км².

Река Нура берет начало в центральной части Казахского мелкосопочника, в горах Кызылтас на высоте 1100-1250 м над уровнем моря и впадает в бессточное озеро Тениз (Тенгиз) на отметке около 304 м. Общая длина реки 978 км, площадь водосбора 58,1 тыс.км², средний уклон реки 0,7 промилле.

Бассейн реки Нуры расположен на территории Карагандинской (70% от площади водосбора реки 58,1 тыс.км²) и Акмолинской (30%) областей. Карагандинская часть реки имеет протяженность 571 км, Акмолинская - 407 км.

Средний многолетний сток реки в створе с наибольшей водностью (гидропост Романовское-с. Романовка) составляет 619 млн. м³/год. Сток зарегулирован 22 водохранилищами и множеством прудов общим полным объемом около 1 млрд. м³ с общей полезной емкостью 450 млн.м³.

Наиболее крупные притоки:

- р. Акбастау (впадает в р. Нуру с левого берега на 856-м км от ее устья, длина реки 108 км);
 - р. Ащысу (правый берег, 841-й км, длина 77 км);
 - р. Шерубайнур (левый берег, 638-й км, длина 268 км);
 - р. Есен (левый берег, 564-й км, длина 102 км);
 - р. Ульгенкундызы (правый берег, 480-й км, длина 102 км).

Вся сеть основных притоков расположена в верхнем и среднем течении реки, где и происходит формирование основного стока Нуры. Между 125-м и 11-м километрами от устья, река протекает через группу озер, самое крупное из которых озеро Коргалжын, площадью 330 км² при отметке 307,5 м БС.

Водосбор реки имеет расчлененный крупнохолмистый рельеф в верхней части, типичный для мелкосопочника (группы невысоких холмов, разделенные речными долинами) в средней части и равнинный рельеф с редкими холмами и слабо выраженным водоразделом с соседними реками Ишим (Есил), Куланутпес - в нижней части бассейна р. Нуры.

Водосборная площадь реки в области мелкосопочника сложена преимущественно твердыми кристаллическими и осадочными породами со значительным распространением щебнистых грунтов. В равнинной части представлены, в основном, неогеновые глины и суглинки, перекрытые с поверхности суглинками и супесями четвертичного периода.

Преобладающие почвы: каштановые разного типа и солонцеватые.

Растительный покров характерен травяными комплексами, чаще всего ковыльно-типчаковых степей. Местами в долине реки встречаются заросли кустарника.

Распаханность довольно значительная - до 30% на отдельных участках водосбора.

Долина реки в верхнем и среднем течении хорошо выражена, шириной обычно 1-2 км, в местах впадения крупных притоков - до 10 км. В нижнем течении долина выражена обычно неясно, ее пологие склоны сливаются с водоразделом, ширина долины здесь доходит до 25-30 км. Дно долины сложено, в основном, рыхлыми песчано-галечниковыми отложениями, подстилаемыми глинами и суглинками. Мощность рыхлых отложений до 30 м в равнинной части.

Ширина поймы в верховьях и среднем течении 0,5-5 км, в низовьях до 20 км, но в районе поселка Коргалжын она местами сужается до 100-300 м. Глубина затопления поймы при высоком половодье до 3 м, продолжительность затопления до 30-40 дней в нижнем течении Нуры.

Русло Нуры часто разветвляется на протоки длиной до 10 км. Часть проток превратилась в старицы. Ширина русла от 5-10 м в верховье до 30-40 см в нижнем течении. Глубина в плесах от 2 до 5 м. От озера Коргалжын до озера Тениз русло узкое, ниже озера Асаубалык русло слабо разработано и часто пересыхает.

Геолого-литологическое строение участка работ

В районе реки Нуры четвертичные отложения распространены повсеместно, за исключением небольших площадей, занятых палеозоем, древней корой выветривания и неогеном. Представлены они разнообразными генетическими типами, среди которых наибольшим развитием пользуются аллювиальные, пролювиальные, элювиальные и делювиальные разности.

Мощность четвертичных отложений колеблется от 0 до 10 м на водоразделах и от 10 до 60 м в речных долинах; характерно нарастание мощности отложений с севера на юг и с запада на восток.

Нижнечетвертичные отложения. Среди нижнечетвертичных отложений выделяются аллювиально-пролювиальный, эоловый, озерный и делювиально-пролювиальный генетические типы.

Аллювиально-пролювиальные осадки слагают третью надпойменную террасу реки. Они с размывом перекрывают неогеновые глины, древнюю кору выветривания и породы палеозоя. Для этой толщи типично двучленное строение; в основании лежат конгломераты, гравелиты и песчаники, а наверху — галечники и грубоцернистые пески.

В конгломератах и конгломерато-брекчиях песчано-глинисто-карбонатный цемент крустификационного типа составляет 10 – 30 % от массы породы. Последние залегают по речным долинам в виде линз мощностью 2 – 4 м на западе района и мощностью до 12 – 3 м - в его восточной части. Грубоцернистые пески кварц - полевошпатового состава с гравием и галькой плохой окатанности и щебнем. Они неясно слоистые, несортированные. Мощность песков и галечников 2 – 3 м.

Делювиально-пролювиальные образования распространены вокруг сопок останцев в пределах денудационных равнин и вокруг отдельных гряд и гор в пределах мелкосопочного и низкогорного рельефа, располагаясь на различных гипсометрических уровнях, часто выше, чем более молодые шлейфы. Почти повсеместно в их базальных горизонтах отмечаются аллювиально-пролювиальные конгломераты. Толща представлена красно - бурыми суглинками и супесями с большим количеством неравномерно распределенных глыб, щебня и галек, составляющих 30 – 40 % массы породы. Средний размер обломков 0,1 - 0,2 м, максимальный 1 – 2 м. Преобладают угловато - окатанные разности, но встречаются и галечники хорошей окатанности.

Средне-верхнечетвертичные отложения

Аллювиально-пролювиальные осадки этого возраста имеют наиболее широкое распространение. Вместе со среднечетвертичным аллювием они слагают вторую надпойменную террасу рек района и отличаются от него меньшей дифференцированностью материала, обогащенностью щебнем и меньшими размерами обломков.

Аллювиально-пролювиальные отложения с размывом перекрывают нижнечетвертичные конгломераты и нижнележащие породы. Они представлены серовато - коричневыми глинами, суглинками, щебнисто - гравийными песками и галечниками. Галька слабо окатанная, а песок — крупнозернистый. Характерна карбонатизация материала, уменьшение величины обломков сверху вниз по разрезу, а также цементация базальных горизонтов толщи суглинком и мелкозернистым песком. Мощность отложений изменяется от 2 до 12 м.

Верхнечетвертичные отложения

Осадки этого времени представлены аллювиальными и аллювиально-пролювиальными разностями, слагающими первую надпойменную террасу, эоловыми песками и озерными образованиями.

В основании аллювиальной толщи залегают крупнозернистые пески с прослойями гравия и галечника. Они перекрыты суглинками серого цвета с включениями гравия. Характерно уменьшение количества обломочного материала в направлении от истоков к устью долин. Мощность отложений колеблется от 3 до 20 м. Современные отложения Современные отложения представлены аллювиальными, озерными и хемогенными образованиями. Современный аллювий слагает пойму и русло реки. На пойме он состоит из галечника, песка, супеси и суглинка; в русле - из песка, гравия, гальки. В составе современных отложений значительное место занимают покровные суглинки мощностью до 2,50 м, перекрывающие отложения поймы и, в не-которых случаях, осадки первой надпойменной террасы, а также днища сухих бессточных впадин. Они представлены лёссовидными породами палевого цвета, с характерной столбчатой отдельностью. Хемогенные, солончаковые образования в виде мелких пятен встречаются на речных террасах, равнинах и пологих склонах. Наиболее часто они приурочены к обнажениям неогеновых глин и древней коры выветривания. Представлены корками и выцветами солей преимущественно магнезиально- и калийно-сульфатного состава. Не менее широко распространены такырные образования, представленные листовато-слоистыми суглинками серовато-коричневого цвета мощностью до 0,50 м. Они приурочены к днищам понижений и накапливаются в периоды снеготаяния и дождей. Отмечается карбонатность материала и значительная его песчанистость.

2.3. Почвы и растительность

Почвы. Бассейн р. Нура расположен в основном в сухостепной и полупустынной зоне.

Территория отличается разнообразием рельефа, почвообразующих пород, глубины залегания и степени минерализации грунтовых вод, что отражается на разнообразии почвенного покрова. Особенно наглядно эта неоднородность проявляется по мере продвижения с севера на юг. Соответственно этим изменениям происходит изменение почвенного покрова.

Почвенный покров представлен черноземами южными, темно – каштановыми, каштановыми, светлокаштановыми, луговыми, лугово – болотными, солонцами, солончаками, горными каштановыми почвами.

По всему бассейну, начиная с истоков р. Нуры, преобладающие почвы по правобережью темно – каштановые, по левобережью темно- и светло – каштановые, солонцеватые со степными солончаками.

Как следствие тяжелого механического состава почвообразующих пород, фильтрационные свойства почв бассейна очень низкие, поэтому основная часть атмосферных осадков расходуется на поверхностный сток и вызывает линейную эрозию в балках и ложбинах, где происходит консолидация стока. Особенно интенсивно это процесс наблюдается в период снеготаяния, когда почвы находятся в промерзшем состоянии и совершенно лишены фильтрационных свойств.

В результате водной эрозии в реки поступает с поверхностным стоком большое количество взвешенных частиц, сильно загрязняющих речные воды.

Благодаря тяжелому механическому составу почв и почвообразующих пород, а также глубокому промерзанию почв в зимний период, модуль поверхностного стока в бассейне очень высок. Зимние и ранние весенние осадки практически полностью расходуются на поверхностный сток и создают паводки в период снеготаяния.

Растительность. Растительный покров весьма разнообразен и представлен травяными комплексами преимущественно ковыльно – типчаковых степей. Леса отсутствуют. Местами в долине реки встречаются заросли кустарника. Степень распаханности довольно значительная – до 30 % на отдельных участках водосбора.

В составе растительности этой зоны наблюдается господство узколистых злаков. Из ковылей преобладают красноватый ковыль и волосатик типчак, тонконог, овсец пустынnyй, тимофеевка. Из разнотравья растут: шалфей степной, люцерна желтая, клевер люпиновый, подмаренник, горичник, вероника, сонтрава, лапчатки, полыни, юринея, зоннак клубненосный. В более влажных местах обитания распространена красноковыльно – лугово - разнотравная степь. На обычновенных черноземах основными растениями являются ковыли красноватый и воло-сатик, типчак, тонконог, шалфей степной, василистик, снеголовик, порезник, го-ричник. В небольшом количестве присутствуют корневищные злаки – костер, пырей, вейник.

На засоленных почвах распространены грудница татарская, ромашник тысячелистниковый, черная полынь, гвоздики.

2.4. Животный мир

Наиболее типичные млекопитающие степной зоны - суслики, сурки, тушканчики, мышеборазные грызуны. Здесь широко распространены также волк, лисица, корсак, барсук, степной хорек. До недавнего времени сюда кочевали сайгаки. Из птиц преобладают журавли, кулики, жаворонки, беркуты, степные луны. Некоторые виды птиц (черный и белокрылый жаворонок, кречетка, азиатский зуек) являются эндемиками, что свидетельствует о достаточно древнем возрасте степного ландшафта.

Фауна рептилий представлена ящерицам, змеями и ужами.

В ихтиофауне преобладают щука, язь, елец, чебак, налим, окунь, ерш. В озерах обитают, кроме названных, карась и линь. В бассейне реки обитают три вида земноводных – лягушка озерная, лягушка остромордая и жаба зеленая.

Фауна беспозвоночных широко представлена вредителями растительности, клещами и другими кровососущими (слепни, комары, мухи, мошки, оводы). Из ядовитых насекомых распространены шмели и осы. Некоторые насекомые (пчелы, лесные муравьи, наездники) являются полезными.

2.5. Гидрологические условия

В пределах Нуринского гидрогеологического района выделяются следующие виды скопления подземных вод:

1) воды спорадического распространения аллювиально–пролювиально-делювиальных, такырно-солончаковых и озерных отложений (QIII-IV);

2) воды спорадического распространения закрепленных эоловых верхнечетвертичных – современных пылеватых песков (eol QIII-IV);

3) водоносный горизонт аллювиальных нижнечетвертичных - современных отложений (al QI-IV);


4) воды спорадического распространения делювиально-пролювиальных верхнеплиоценовых - верхнечетвертичных отложений (N23-QIII);

5) водоносный комплекс вулканогенно - осадочных и осадочно- вулканогенных девонских отложений (D);

Долина р.Нуры представлена песками, гравием и галечником с редкими прослойями глин. С поверхности отложения перекрыты суглинками мощностью до 2,5 м.

Ширина обводненной части аллювия изменяется от 12 - 16 до 25 – 30 м. При этом из-за четковидного строения ширина потока по долине существенно меняется, и на суженных участках она обычно не превышает нескольких сотен метров. Увеличение ширины и мощности грунтового потока в низовьях долины обусловлено приуроченностью ее к

крупной депрессии в палеозойском фундаменте. Средний уровень подземных вод находится на глубине 3,4 м (от 3,0 до 3,9 м).

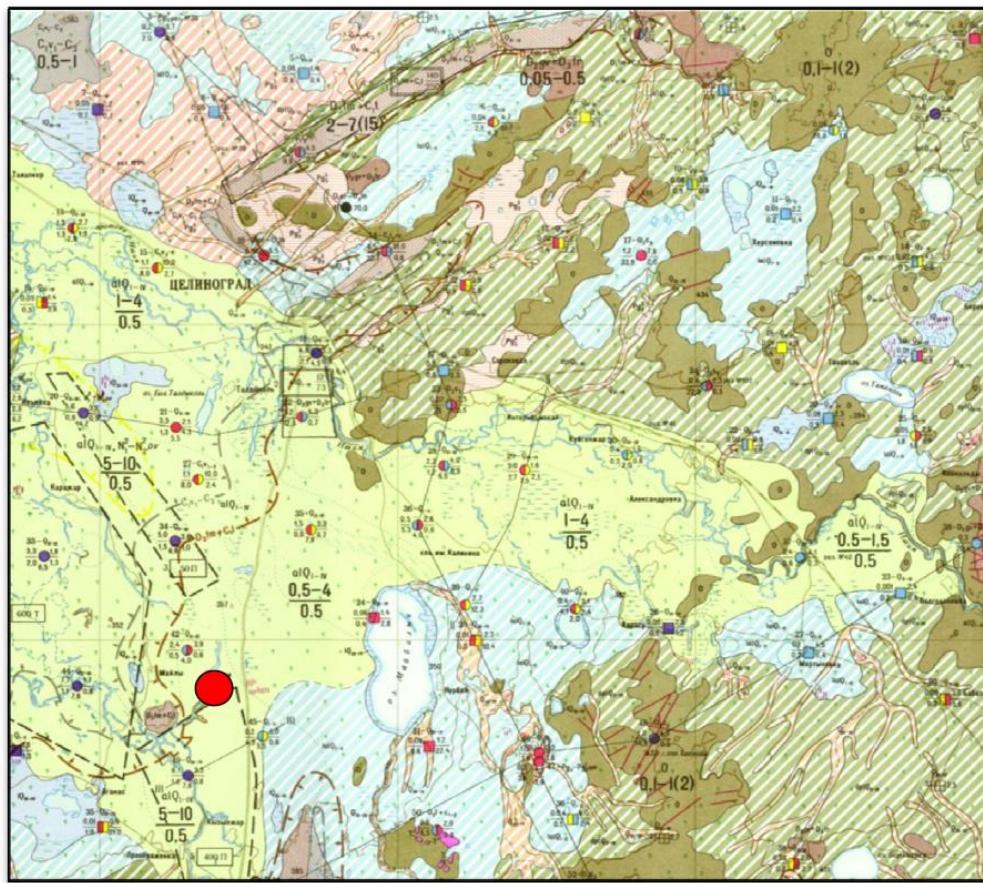

Авторы: Степанищев Л.И., Богор А.М., Васильева В.А. 1962 г

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ЧЕТВЕРТИЧНАЯ СИСТЕМА		К.М.	Н.И.
Kz	Кайнозойские отложения нерасчлененные (только на разрезе)		
Q _{III-IV}	Верхнечетвертичные – современные отложения. Аллювиальные отложения: гравийники, пески, суглинки. Озерные и алювиально-пропиляльно-демозиновые отложения: глины, суглинки, пески	C ₁ g ₃	Верхнетурнейский подъярус. Русаковский горизонт. Пестроцветные известняки, мергели, алевролиты, кремнистые породы
Q _{II-VI}	Средне-верхнечетвертичные отложения. Аллювиальные и демозиново-пропиляльные отложения глинистые пески, глины грубозернистых песков, песчано-глинистые, щебисто-глинистые, красавино-глинистые материалы	C ₁ t ₁	Нижнитурнейский подъярус. Серые известняки
Q _{I-II}	Нижне-среднечетвертичные отложения. Озерно-аллювиальные отложения: пески, гравийники, суглинки, супеси, глины	D ₂ fm	Верхний отдел. Фаменский ярус. Серые известняки
H ₂ -Q _{II}	Неогеновая система, верхний плиоцен – четвертичная система, среднечетвертичные отложения. Суглинки, глины, глинистые пески	D ₂ gv-D ₁ fr	Средний отдел, живетский ярус – верхний отдел, франкий ярус нерасчлененные. Красноватые песчаники, конгломераты, алевролиты, аргиллиты, прослои известняков и эфузивных образований
N ₂ -N ₂ ppf	Средний миоцен – средний плиоцен. Павловская свита. Красноцветные глины	S ₂ ld	Верхний отдел. Лудовский ярус. Пестроцветные песчаники и конгломераты
N ₁ -2 ar	Нижний – средний миоцен Аразьская свита. Зеленые глины с прослоями песчано-глинистых глин, песков, гравелитов (только на разрезе)	O ₃ ?	Аштапольский ярус (?). Пестроцветные песчаники, конгломераты, алевролиты, прослои порфиритов
Pg ₃	Верхний плиоцен. Пестроцветные глины, пески, гравелиты, сливные исчайки, перетекоменные бокситы	O ₃ c ₃	Верхнекарадакский ярус. Зеленоцветные конгломераты, песчаники, алевролиты, известняки, прослои порфиритов
Pg ₃ -Pg ₃ om	Палеоцен – нижний зонен. Амангельдинская свита. Бокситогеновые глины, бокситы, пески, гравелиты, углистые глины	O ₂ l+c ₁₋₂	Средний отдел. Лланейльский, нижнекарадакский и среднекарадакский ярусы. Серые, зеленые, желтые алевролиты, песчаники, гравелиты, конгломераты, линзы известняков
C ₂ -3vf	Средний – верхний отдел. Владимирская свита. Пестроцветные песчаники, алевролиты и аргиллиты, прослои осадочных брекчий, конгломератов, известняков (только на разрезе)	O ₂ gr-O ₁ ln	Нижний отдел, аренгийский ярус – средний отдел, лланэйринский ярус нерасчлененные. Зеленые, бурые, красновато-бурые алевролиты, алевролиты, кремнистые алевролиты, песчаники и гравелиты
C ₁ m-C ₂ kr	Нижний отдел, иммерская ярус – средний отдел. Кирская свита. Пестроцветные песчаники, алевролиты, аргиллиты, прослои известняков и осадочных брекчий (только на разрезе)	УпD-1-2	Нижне-среднедевонский интрузивный комплекс. Малые интрузии карбовых плагиопорфиров, тракторит-порфиров, гранит-порфиров, аплитогнеймы гранитов
C ₁ v ₃ -P	Верхнекардакский подъярус – иммерский ярус. Алевролиты, песчаники, аргиллиты, прослои углей и известняков (только на разрезе)	УпD-1-2	Верхнеордовикский интрузивный комплекс. Плагиогнейты, гранодиориты
C ₁ v ₁₊₂	Нижнекардакский и среднекардакский подъярусы. Серые песчаники, алевролиты, аргиллиты, известняки		
C ₁ v ₂	Среднекардакский подъярус. Серые песчаники, алевролиты, аргиллиты, известняки, прослои углей (только на разрезе)		
C ₁ v ₁	Нижнекардакский подъярус. Аргиллиты, алевролиты, песчаники, прослои известняков и углей		
C ₁ t	Турнейский ярус. Известняки, мергели, алевролиты, песчаники (только на разрезе)		

Рисунок 2.5-1 – Гидрогеологическая карта

Возможное повышение уровня грунтовых вод в течении года на **1,00 - 1,50 м**. Так же возможно проявление временной верховодки по кровле суглинков являющихся естественным водоупором в период сезонных весенних паводков и обильных атмосферных осадков.

По данным лабораторных определений (**по химическому составу**) грунтовые воды преимущественно от гидрокарбонатно-сульфатно-хлоридных до сульфатно-гидрокарбонатно-хлоридных, от пресных до слабоминерализованных. Вода от нейтральной до слабощелочной. По степени жесткости грунтовые воды от умеренно жестких до очень жестких.

3. ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

3.1. Современное состояние русла реки Нура

Участок проектирования находится в 17 км северо-западнее от г. Астаны в границах контрактной территории карьера гравийно-песчаной смеси (ГПС), площадью 80га, принадлежащего ТОО «Жибек-ТД», расположенного на участке «Южное Косшы» г. Косшы. Проектируемый участок расположен в границах водоохраных зон и полос.

В целом русло реки имеет естественно – природный вид и загрязнение береговых зон в результате хозяйственной деятельности не наблюдается. Нарушенных земельных участков нет. Левый берег в основном пологий с невысокими обрывами. Правый берег местами обрывистый. Пойма реки может достигать шириной до 2,5 км. Местами имеются старицы и рукава, отделенные от основного русла.

В реке половодье в среднем начинается в конце марта в начале апреля. В зависимости климатических условий года продолжается меньше или больше месяца. Обычно половодье проходит одной волной, однако, при выпадении обильных дождей в период интенсивного снеготаяния на графике основной волны могут наблюдаться дополнительные пики дождевого происхождения. После прохождения половодья наступает низкая летняя, осенняя, а затем и глубокая зимняя межень.

Из-за отсутствия устойчивого русла происходит меандрирование реки. Также по этой причине наблюдается скопление наносов и уменьшения сечения русла. На месте наносов образовались заросли кустарников и деревьев. Это может вызвать переполнение и разлив реки за берега с подтоплением близлежащих территорий во время паводковых явлений.

На нижеследующих фотографических материалах отображены результаты визуального обследования объекта.



Рисунок 3.1-1 – Русло реки Нура



Рисунок 3.1-2 – Правый обрывистый берег в пойме реки



Рисунок 3.1-3 – Вид на пойму реки



Рисунок 3.1-4 – Заросшая пойма и русло реки



Рисунок 3.1-5 – Заросшая пойма и растительность на берегу

3.2. Гидротехнические решения

Протяженность русла реки Нура в пределах проектной зоны составляет – 530 м

Для предотвращения дальнейшего размыва правого берега, засорения и зарастания поймы реки Нура, поддержания водных объектов в состоянии, соответствующим санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям проектом санации предусматриваются следующие мероприятия:

- подготовительные работы:
 - планировка берегов трассы с устройством полок под проход экскаватора;
 - обеспечение гидрологического режима путем спрямления русла и выравнивания дна реки для предотвращения меандрирования русла реки;
 - выпрямление и углубление русла реки;
 - очистка от кустарника русла реки и будущего основания дамбы
 - устройство насыпи струенаправляющих дамб с послойным уплотнением длиной 1346 метров при высоте в 5 метров;
 - планировка откосов дамб вручную;
 - планировка гребня дамб;
 - засыпка старого русла избытками грунта выемки с последующим разравниванием растительным слоем грунта.

4. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Рабочий проект разработан с учетом мероприятий по охране окружающей среды. Санация реки Нура положительно отразится на общей экологической обстановке, улучшится гидрологический режим реки.

При производстве работ вовлечение земельных ресурсов в процессе ремонтных работ не предусматривается. Для наращивания гребня дамб будет производится в зарегистрированных карьерах нерудных материалов. Негативного воздействия на почву оказано не будет, так как доставка грунтов, а также технологического оборудования предусмотрено производить автомобильным транспортом по шоссейным дорогам с твердым покрытием 2-ой категории и по уже существующим грунтовым дорогам.

На период строительства с целью снижения вредного воздействия на окружающую среду рекомендуется:

- очистка трассы реки от бытового мусора и отходов должна производиться в соответствии с правилами производства работ, с последующим вывозом их на свалку;
- эксплуатация строительных машин и транспортных средств должна быть только с исправными двигателями, отрегулированными на оптимальный выброс выхлопных газов, прошедшиими технический осмотр и отвечающих экологическим требованиям для спецтехники;
- не допускать засорение территории строительными отходами и бытовым мусором;
- не допускать необоснованной вырубки зеленых насаждений;
- при организации строительного производства необходимо осуществлять мероприятия и работы по охране окружающей природной среды, которые должны включать рекультивацию земель, предотвращение потерь природных ресурсов, предотвращение вредных выбросов в почву, водоемы и атмосферу;
- временные автомобильные дороги и другие подъездные пути должны устраиваться с учетом требований по предотвращению повреждений сельскохозяйственных угодий и древесно-кустарниковой растительности;
- предусматриваются меры, исключающие отрицательные воздействия проектируемых мероприятий на окружающую среду;
- предусмотрен вывоз строительного мусора за пределы массива для захоронения.

При производстве работ какое – либо воздействие будет оказываться только на атмосферный воздух. Повышение приземной концентрации загрязняющих веществ может иметь место при работе автотранспортной техники и строительных механизмов (бульдозеры, катки) при отсыпке и планированию гребня и откосов дамб.

При проведении производства работ на атмосферный воздух будет оказано минимальное воздействие, так как район производства работ находится на открытом и продуваемом пространстве.

В период осуществления работ, какое – либо влияние на водные ресурсы также не будет оказываться. Вода из реки при производстве работ не используется. Зaborа воды и сброса сточных вод в технологическом процессе работ нет. Загрязнение воды дизельным топливом, маслами, твердыми бытовыми отходами и другими загрязняющими веществами при производстве работ исключается.

В зоне производства работ представители млекопитающих отсутствуют. Среди животных, обитающих на данной территории, занесенных в Красную Книгу, нет. Также производство работ негативного влияния на растительность тоже не окажет.

В целом проведение работы по санации реки Нура положительно отразится на качестве воды и общей экологической обстановке, что закономерно будет способствовать улучшению здоровья, проживающего в том регионе населения.

Раздел «Охрана окружающей среды» в проекте представлен отдельной книгой (Книга 2).

5. ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

5.1. Общие сведения

Проект организации строительства (ПОС) по санации русла реки Нура разработан на основании Задания на проектирование, проектно-сметной документации, нормативно-конструктивных материалов и в соответствии с требованиями:

- СНиП РК 1.03 – 06 – 2002* «Строительное производство. Организация строительства предприятий зданий и сооружений»;
 - СНиП РК 1.0403 – 2008 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий и сооружений»;
 - СНиП РК 1.03 – 05 – 2001 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».
- Также при разработке ПОС использована следующая нормативная литература:
- Расчетные нормативы для составления проектов организаций строительства, часть I – IX;
 - пособие к СНиП РК 1.03 – 06 – 2002* «Пособие по разработке проектов организаций строительства и проектов производства работ для реконструкции действующих предприятий, зданий и сооружений».

Проект организации строительства является исходным материалом для разработки проекта производства работ и является составной частью проекта санации.

Осуществление строительства без проектов производства работ запрещается.

5.2. Характеристика земельного участка

Река Нура, имеющая границы, объем, водный режим, как и все реки, моря, приравненные к ним каналы, озера и т.д. относится к водным объектам, составляющий водный фонд Республики Казахстан. В соответствии с п.1 статьи 8 Водного Кодекса Республики Казахстан водный фонд находится в исключительной государственной собственности.

5.3. Подготовка строительного производства

До начала производства работ следует тщательно ознакомиться с проектно-сметной документацией по данному объекту, а также с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями.

Перед производством основных строительно-монтажных работ должны быть выполнены работы подготовительного периода:

- создание геодезической разбивочной основы;
- разбивка и закрепление основных осей;
- устройство временных ограждений, выставление указательных и сигнальных знаков «Осторожно! Работает кран», «Проезд закрыт», «Проход запрещен» и т.п;
- создание складского хозяйства и площадок для укрупненной сборки конструкций и оборудования;
- монтаж, подключение и опробование инвентарных зданий, механизированных установок и временных сооружений для нужд строительства;
- обеспечение строительного участка противопожарными средствами, водоснабжением, средствами связи и сигнализации.

Подготовительные работы должны технологически увязываться с общим потоком основных строительно - монтажных работ и обеспечивать необходимый фронт работ строительным подразделениям организации. Завершение подготовительного периода работ фиксируется в общем журнале работ. Производство основных строительно-монтажных работ разрешается только после завершения подготовительного периода.

5.4. Производство работ

Протяженность русла реки Нура в пределах проектной зоны составляет – 530 м

Для предотвращения дальнейшего размыва правого берега, засорения и зарастания поймы реки Нура, поддержания водных объектов в состоянии, соответствующим санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям проектом санации предусматриваются следующие мероприятия:

- подготовительные работы:
- планировка берегов трассы с устройством полок под проход экскаватора;
- обеспечение гидрологического режима путем спрямления русла и выравнивания дна реки для предотвращения меандрирования русла реки;
- выпрямление и углубление русла реки;
- очистка от кустарника русла реки и будущего основания дамбы;
- устройство насыпи струенаправляющих дамб с послойным уплотнением длиной 1346 метров;
- планировка откосов дамб;
- планировка гребня дамб;

Очистка от кустарников. Очистка трассы от кустарников производится кусторезами корчевателями с перемещением в валы с дальнейшим вывозом на полигоны твердых отходов.

Срезка и выемка грунта с береговой линии (создание контура русла). Срезка грунта на откосах русла реки производится экскаваторами в отвал и под береговые дамбы бульдозерами с перемещением отвалов в кавальеры.


Очистка дна и углубление русла. Проектом предусмотрена экскаватором драглайн или земснарядом очистка дна и заглубление русла реки.

Устройство насыпи струенаправляющих дамб с послойным уплотнением. Проектом предусмотрено использование объема выемки при очистке дна русла для устройства насыпи высотой 5 метров и длиной 1346 метров. Недостающий объем грунта для устройства насыпи подвозится автосамосвалами КАМАЗ-15-20тн из карьера, определенного заказчиком.

Планировка откосов и берм. Планировка откосов реки выполняется бульдозерами. Планировка верха берм реки выполняется грейдерами.

Расчет объемов при организации насыпи струенаправляющих дамб с послойным уплотнением длиной ориентировочно 1346 м для исключения подтопления прилегающих территорий.

Высота вала принята 5 м, ширина по верху – 3,0 м, ширина основания – 36,6 м.

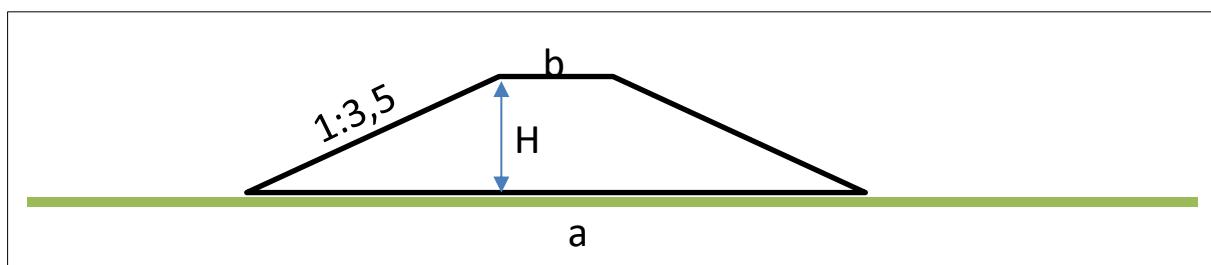

где а – ширина основания дамбы, м;

б – ширина дамбы по верху, м;

Н – высота дамбы, м.

Рисунок 5.4-1 – Параметры дамбы

При сооружении дамбы объем земляных работ на единицу длины (V , $\text{м}^3/\text{м}$) определяется по формуле:

$$V = \frac{a \times b}{2} \times H$$

$$V = \frac{36,6 + 3}{2} \times 5 = 99 \frac{\text{м}^3}{\text{м}} \times 1346 \text{ м} = 133254 \text{ м}^3$$

1. Расчет площади поверхности дамбы определяется по формуле:

$$\begin{aligned} S &= a_1 \times 1346 + a_2 \times 1346 + a_1 \times 1346 \\ &= 17,5 \times 1346 + 3,0 \times 1346 + 17,5 \times 1346 = 51148 \text{ м}^2 \\ &= 5,1148 \text{ га} \end{aligned}$$

Месторасположение дамбы представлено на рисунке ниже.



Рисунок 5.4-2 – Месторасположение струенаправляющей дамбы

5.4.1. Последовательность работ

Таблица 5.4.1-1 Очистка от кустарников

N п/п	Показатели	Единица измерения	Количество единиц
1	2	3	4
1	Обследуемая территория	га.	5.1148
2	Пустые участки	га.	4.6148
3	Площадь, занимаемая кустарниками (ориентировочная)	га.	0.5
4	Срезка кустарников, мелких деревьев, зарослей кусторезами на тракторе мощностью 79 кВт (108 л/с).	га.	0.5
5	Планировка грунта бульдозером мощностью 121 кВт.	га.	0.5
6	Расчистка участка от случайного мусора, порубочных остатков валкователями с трактором 59 кВт (80 л/с) – 70 % механизированным способом	га.	0.5
7	Погрузка кустарников, мусора и порубочных остатков, в том числе вручную.	тонн	11.25
8	Перевозка кустарников, мусора и порубочных остатков на расстояние 18 км автомобилями – самосвалами на полигон ТБО г. Астаны	тонн	11.25

Таблица 5.4.1-2 Срезка и выемка грунта с береговой линии (создание контура русла)

N п/п	Показатели	Единица измерения	Количество единиц
1	2	3	4
1	Обследуемая территория	га.	0.1094
2	Площадь земель, подлежащая срезке	га.	0.1094
3	Разработка грунта экскаватором с ёмкостью ковша 1 м ³ с погрузкой в автотранспорт	м ³	1094
4	Разработка грунта I кат. бульдозером мощностью 121 кВт. С перемещением на 10 метров (ППС)	м ³	1094
5	Уплотнение грунта самоходным вибрационным катком 2,2 тонны на глубину 0,25 м.	га	0.1094
		м ³	273.5

Таблица 5.4.1-3 Очистка дна и углубление русла

N п/п	Показатели	Единица измерения	Количество единиц
1	2	3	4
1	Обследуемая территория	га.	0.3282
2	Площадь земель, подлежащая очистке	га.	0.3282
3	Разработка грунта экскаватором с ёмкостью ковша 1 м ³ с погрузкой в автотранспорт	м ³	132160
4	Разработка грунта I кат. бульдозером мощностью 121 кВт. С перемещением на 10 метров	м ³	132160
5	Перевозка грунта автотранспортом - автосамосвалами грузоподъёмностью 10 тонн	тонн	185024.00

Таблица 5.4.1-4 Устройство насыпи струенаправляющих дамб с послойным уплотнением

N п/п	Показатели	Единица измерения	Количество единиц
1	2	3	4
1	Обследуемая территория	га.	5.1148
2	Площадь земель, подлежащая устройству дамы	га.	5.1148
5	Разгрузка грунта с автосамосвала (образованного при очистке дна реки и срезке с берега)	тонн	186555.60
6	Разработка грунта II кат. Бульдозером Т-170 мощностью 121 кВт. с перемещением на 10 метров	м ³	133254.00
7	Планировка грунта бульдозером Т-170 мощностью 121 кВт.	га.	5.1148
8	Уплотнение грунта самоходным вибрационным катком 2,2 тонны на глубину 0,25 м.	га м ³	5.1148 12787

5.5. Берегоукрепительные сооружения

В соответствии со статьей 5 Водного Кодекса Республики Казахстан к водным объектам относится сосредоточение вод в рельефах поверхности суши и недрах земли, имеющие границы, объем и водный режим. Ими являются моря, реки, приравненные к ним каналы, озера, ледники и другие поверхностные водные объекты, части недр, содержащие подземные воды. Река Нура является естественным водным объектом, имеющий границы, объем и водный режим, поэтому согласно «Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28.02.2015 года № 165, по отношению к ней не устанавливается уровень ответственности. Также согласно СП РК 3.04 – 101 – 2013 «Гидротехнические сооружения» река Нура не относится к гидротехническим сооружениям, соответственно не устанавливается класс сооружения. По руслу реки на участке проектирования отсутствуют как постоянные, так и временные гидротехнические сооружения, в проекте не предусматривается строительство ГТС. Следовательно, обеспечение требования о гарантированном пропуске воды в русле реки различной обеспеченности в проекте по санации не применимо, и гарантированная пропускная способность русла реки не определяется.

При проектировании гидротехнических сооружений класс сооружения устанавливается исходя от конкретных условий, максимальные расходы принимаются исходя из ежегодной вероятности превышения (обеспеченности), устанавливаемой в зависимости от класса сооружений для двух расчетных случаев основного и поверочного.

Так для класса I сооружений основным расчетным случаем является 0,1 % обеспеченности, поверочным случаем является – 0,01 %, для II класса сооружений основной – 1,0 %, поверочный – 0,1 %, для III класса основной – 3,0 %, поверочный – 0,5 %, для IV класса основной – 5,0 %, поверочный – 1,0 %.

В проекте предусмотрено строительство струенаправляющих дамб и берегоукрепление.

Согласно СН РК 3.04-01-2023 берегоукрепительные сооружения относятся к III классу сооружений.

Пойма реки широкая, и имеет несколько разветвленное русло. Чтобы не нарушать всю экосистему реки, принято решение по очистке основного русла.

Регулирование русла реки Нура осуществляется путем спрямления, расширения и углубления, как на отдельных участках, так и по новой трассе с одновременным формированием поперечного сечения и уклонов, близких к трапецидальному сечению. Спрямленное русло рассчитано на пропуск меженного расхода 95% обеспеченности для обеспечения основного гидрологического режима реки.

5.6. Потребности строительства

В существующих населенных пунктах района строительства имеются источники электролинии и водопроводная сеть. Обеспечение объекта на период строительства электроэнергией и хозпитьевой воде предусматривается от существующих источников.

Потребителями электроэнергии на период строительства является только бытовые нужды – освещение жилых вагонов рабочих. На объекте бетонные и сварочные работы отсутствуют, проводятся только земляные работы, которые выполняются экскаваторами и бульдозерами и ручные работы по укладке габионов. Будет производится очистка русла реки от растительного мусора и расширения сечения русла реки.

Обеспечение хозяйственной водой на период строительства производится из существующих населенных пунктов автоворовозами КАМАЗ-15тн. На месте дислокации подрядчика надо поставить емкости для хранения хоз. питьевой воды. Устроить навес или присыпать емкости землей от замерзания и нагрева воды.

5.7. Охрана труда и техника безопасности в строительстве

При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдать требования действующих норм СНиП РК 1.03.05-2001 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве», ГОСТ 12.1.013-78 «Система безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования», «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», утвержденных Госгортехнадзором Республики Казахстан, «Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных и огневых работ» ППБС-01-94, утвержденных ГУПО МВД РК.

Перед началом выполнения строительно-монтажных работ на территории существующего производства Заказчик, Генеральный подрядчик с участием субподрядчиков и представитель организации, эксплуатирующий этот объект, обязаны оформить акт-допуск по форме приложение 2 СНиП РК 1.03.05-2001 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве». Все мероприятия по безопасному выполнению работ должны быть согласованы со всеми участниками строительства, службами безопасности и инспекцией Госгортехнадзора.

Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ. Все территориально обособленные участки должны быть обеспечены телефонной связью или радиосвязью.

Во время производства работ на строительной площадке исключается присутствие посторонних лиц. Строительная площадка оборудуется необходимыми знаками безопасности и наглядной агитацией.

Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски.

Рабочие и ИТР без защитных касок и других средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются.

Опасные зоны. Опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности и надписями "опасные зоны для людей", в пределах которых постоянно действуют или потенциально возможны опасные производственные факторы:

- вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок;
- вблизи от неогражденных перепадов по высоте на 1,3 м и более (откосов);

- в местах перемещения машин и оборудования или их частей, в местах, над которыми происходит перемещение грузов грузоподъемными кранами, и др.

Границы опасных зон вблизи движущихся частей машины установлены в 5 м от них.

Освещение. Строительные площадки, участки работ, проезды и подходы к ним должны быть освещены в соответствии с Инструкцией по проектированию электрического освещения строительных площадок и согласно СНиП 23-05 (нормирование освещенности).

Требования к строительным материалам и конструкциям. Используемые типы строительных материалов (песок, гравий, цемент, бетон, лакокрасочные материалы и др.) и строительные конструкции должны иметь санитарно - эпидемиологическое заключение.

Не допускается использование полимерных материалов и изделий с токсичными свойствами без положительного санитарно-эпидемиологического заключения, оформленного в установленном порядке.

Складирование. Складирование материалов и конструкций должно выполняться в соответствии с указаниями стандартов, технических условий на материалы и конструкции.

Материалы и конструкции складируются на ровных площадках с принятием мер против их смещения или раскатывания.

Подкладки и прокладки в штабелях располагаются в одной вертикальной плоскости.

Их толщина должна быть более высоты выступающих монтажных петель не менее чем на 20 см. До начала строительства на площадке в безопасной зоне возводят санитарно-бытовые помещения.

Организация рабочих мест. Рабочие места при выполнении строительных работ должны соответствовать санитарно - гигиеническим требованиям.

Концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также уровни шума и вибрации на рабочих местах не должны превышать установленных санитарных норм и гигиенических нормативов.

При эксплуатации машин, а также при организации рабочих мест для устранения вредного воздействия на работающих повышенного уровня шума следует применять:

- технические средства (уменьшение шума машин в источнике его образования, применение технологических процессов, при которых уровни звука на рабочих местах не превышают допустимые и т.д.);

- дистанционное управление;

- средства индивидуальной защиты;

- организационные мероприятия (выбор рационального режима труда и отдыха, сокращение времени воздействия шумовых факторов в рабочей зоне, лечебно-профилактические и другие мероприятия).

Зоны с уровнем звука выше 80 dB обозначаются знаками опасности. Работа в этих зонах без использования средств индивидуальной защиты слуха не допускается.

Строительная площадка. Строительная площадка должна быть обеспечена аптечками с медикаментами и средствами для оказания первой помощи.

Питьевые установки должны быть расположены на расстоянии не более 75 м от рабочего места.

Инструктаж. Перед началом производства строительных работ работодатель ознакомляет работников с проектом и проводит инструктаж:

- о принятых методах работ;

- установленной последовательности их выполнения;

- необходимых средствах индивидуальной защиты;

- о мероприятиях по предупреждению неблагоприятного воздействия факторов производственной среды и трудового процесса.

Руководство строительно-монтажных организаций обязано обеспечить проверку знаний по технике безопасности рабочих на стройплощадке.

Вновь поступающие на строительство рабочие могут быть допущены к работе только после прохождения ими вводного общего инструктажа по технике безопасности

непосредственно на рабочем месте, который должен проводиться также при каждом переходе на другую работу или при изменении условий работы.

При работе бульдозера

При совместной работе экскаватора и бульдозера последний не должен находиться в радиусе действия стрелы экскаватора. Машинист бульдозера может приступать к работе вблизи экскаватора после того, как ковш экскаватора будет опущен на землю.

Находиться под поднятым отвалом, удерживаемым только стальным канатом или гидравлическим приводом, запрещается. В случае необходимости осмотра и выполнения ремонтных работ под поднятым отвалом, в поднятом положении отвал поддерживают специальными упорами или устанавливают его на клети из брусьев.

При производстве любых работ уклоны на подъемах и спусках, а также крены в поперечном направлении не могут превышать предельных значений, указанных заводом изготовителем в инструкции по эксплуатации.

При сбросе грунта под откос поперечными ходами нельзя выдвигать отвал за края насыпи, так как в этом случае машина может сползти вниз. При движении бульдозера вдоль откоса и насыпи его ходовая часть не должна выходить за их края. Такие же требования соблюдаются при засыпке траншей поперечными, косыми и продольными ходами бульдозера.

Нарушение этих правил может вызвать обрушение стенок траншеи и сползание в нее всей машины.

Высота перемычек между траншеями при производстве любых работ траншейным способом не должна превышать высоту отвала, так как в противном случае возможно случайное обрушение грунта.

Сбрасывать грунт под откос методом работы через вал следует без заезда ходовой частью на разрыхленный грунт, находящийся за краем откоса, иначе вместе с рыхлым грунтом машина может сползть вниз по откосу.

При работе экскаватора

Экскаватор необходимо устанавливать на ровной спланированной площадке. Работа на уклонах не разрешается.

Запрещается нахождение людей и производство каких-либо других работ в зоне действия экскаватора. Передвижение экскаватора в пределах строительной площадки должно быть заранее спланировано. При перемещении по слабым грунтам необходимо использовать

для усиления основания инвентарные щиты.

Производство земляных работ в зоне расположения подземных коммуникаций (газопроводов и электрических кабелей) допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих коммуникаций. К разрешению должен быть приложен план с указанием расположения и глубины заложения коммуникаций.

Разработка грунта в непосредственной близости от действующих подземных коммуникаций допускается только вручную. Использовать ломы, кирки и пневмомашины запрещается.

Погрузка грунта в самосвалы экскаватором должна производиться со стороны заднего или бокового бока самосвала. Нахождение людей во время погрузки между экскаватором и транспортным средством запрещается.

Во время перерывов в работе ковш экскаватора должен быть опущен на землю. После окончания работы машинист экскаватора обязан прочно установить ковш.

В пределах призмы обрушения запрещаются складирование материалов, движение и установка строительных машин и транспорта, а также установка столбов линий связи.

Производство работ в траншеях и котлованах, подвергающихся увлажнению после их полного или частичного открытия, допускается в том случае, если будут приняты меры предосторожности против обрушения грунта. Для этого ответственному исполнителю необходимо тщательно осмотреть состояние откосов перед началом работы.

Необходимо обрушить грунт в местах обнаружения нависаний и трещин у бровок и на откосах. При сильном увлажнении грунта необходимо временно прекратить работы до высыхания грунта или уложить откос, если производство работ является неотложным.

Работы по уплотнению грунта

При уплотнении грунтов машинами необходимо, чтобы:

- машины имели габаритные световые сигналы и фары для освещения пути движения при работе в ночное время;
- в пространство между прицепной машиной и тягачом во время работы не заходил кто-либо в том числе и из обслуживающего персонала;
- тягач к прицепным машинам для сцепки подъезжал осторожно для обеспечения безопасности прицепщика в сохранности машины.

При уплотнении грунта катками запрещается:

- загружать балласт во время движения катков;
- оставлять прицепные катки на уклоне без подложенных упоров под вальцы;
- поднимать домкратами загруженный балластом пневмокаток;
- отцеплять пневмокаток от тягача при убранных домкратах;
- включать вибратор при нахождении виброкатка на твердом грунте или на твердом основании (бетонном, каменном).

При работе трамбующими средствами и виброплитами необходимо выполнить следующее:

- пуск машины производить в защитных очках;
- проявлять осторожность при работе с дизель-пневмо- и электротрамбовками и виброплитами;
- перед началом работы убедиться в исправности машины и оборудования.

Запрещается работать с электротрамбовками, не прошедшие проверку на отсутствие замыкания на корпусе и на исправное состояние изоляции.

Во время грозы и дождя работать электротрамбовками запрещается, а их питающие кабели необходимо отключить и убрать. Исправность электротрамбовок и пневмотрамбовок должна быть заранее проверена перед выдачей рабочему.

Передвижной компрессор, обслуживающий пневматические трамбовки, должен размещаться на ровном месте и не ближе чем в 6 м от бровки котлована, траншеи или забоя при глубине выемки 5м.

Колеса компрессора следует затормозить и под них подложить колодки. Компрессор на рабочем месте должен быть заземлен.

При групповой работе трамбовок расстояние между ними должно быть не менее 2м.

Работа с грузоподъемными механизмами

Работа с грузоподъемными механизмами на объекте должна быть организована лицом из числа ИТР, ответственным за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами, после проверки знаний и получения соответствующего удостоверения.

Приказ о назначении лиц, ответственных за безопасное перемещение грузов кранами и стропальщиками должен находиться на объекте.

ИТР, в распоряжение которых прибывают машинисты кранов, обязаны до начала работ проинструктировать их по безопасному выполнению предстоящей работы на месте ее производства с записью в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.

Ответственный за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами обязан сделать запись в вахтенном журнале: «Установку крана на указанном мною месте проверил, работы разрешаю», а также проверить наличие удостоверений, оранжевых жилетов и защитных касок у стропальщиков.

Перед началом перемещения груза необходимо подавать звуковые сигналы.

При перемещении грузов кранами лица, не связанные с этим процессом, должны находиться за пределами «опасной зоны».

Стропальщики должны выйти из опасной зоны до подачи сигнала машинисту крана о подъеме и перемещения груза.

Стропальщик может находиться возле груза во время его подъема или опускания, если груз находится на высоте не более 1 м от уровня площадки, на которой находится стропальщик.

В течение всего периода работы кранов следует вести наблюдение за состоянием стоянок по краны и проездов грузового транспорта, особенно в период оттаивания грунтов.

Работа с ручными машинами

Эксплуатация ручных машин осуществляется при выполнении следующих требований:

- соответствие выбросиловых характеристик действующим гигиеническим нормативам;
- проверка комплектности и надежности крепления деталей, исправности защитного кожуха осуществляется при каждой выдаче машины в работу;
- ручные машины, масса которых, приходящаяся на руки работающего, превышает 10 кг, применяются с приспособлениями для подвешивания;
- проведение своевременного ремонта и послеремонтного контроля параметров вибрационных характеристик.

Новое оборудование без наличия положительного санитарно-эпидемиологического заключения на соответствие требованиям санитарных правил использоваться при производстве строительно-монтажных работ не допускается.

Гигиенические требования при выполнении монтажных работ

При совместной работе монтажников и машинистов подъемных механизмов следует использовать радиотелефонную связь.

Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи следует производить до их подъема.

Окраску и антакоррозийную защиту конструкций и оборудования в случаях, когда они выполняются на строительной площадке, следует производить до их подъема. После подъема производить окраску или антакоррозийную защиту следует только в местах стыков или соединения конструкций.

Укрупнительную сборку и доизготовление подлежащих монтажу конструкций и оборудования следует выполнять на специально предназначенных для этого местах.

Электросварочные и газопламенные работы выполнять в соответствии с требованиями санитарных правил при сварке, наплавке и резке металлов.

5.8. Предложения по обеспечению контроля качества строительных работ

К мероприятиям по обеспечению прочности и устойчивости возводимых сооружений относятся:

- указания в рабочих чертежах проекта о методах контроля основных параметров возводимых конструкций, их прочности и надежности;
- производственный контроль качества строительно-монтажных работ на всех стадиях создания строительной продукции;

Производственный контроль качества строительства выполняется исполнителем работ и включает в себя:

- входной контроль применяемых материалов и изделий;
- наличие сертификатов качества на материалы и испытание образцов изделий в период строительства;
- геодезический контроль производственных процессов на стройплощадке;
- операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций;
- оценку выполнения скрытых работ;

- технический и авторский надзор за ходом строительства, который выполняется службами заказчика и проектной организацией (по отдельному договору).

Служба контроля качества строительства должна включать следующее:

1. Геодезические работы на стройплощадке выполняются геодезическими службами Заказчика и подрядных организаций.

2. Геодезический (инструментальный) контроль осуществляется в соответствии со СНиП РК 3.01.26-2004 «Геодезические работы в строительстве».

3. Все геодезические работы на строительстве должны выполняться в соответствии с проектами производства геодезических работ (ППГР).

4. В основные обязанности строительной лаборатории входят:

- контроль за правильностью приемки и хранения, проверка соответствия поступающих на строительную площадку материалов, конструкций, контроль физико-технических свойств материалов;

- контроль качества выполненных строительных конструкций объекта;

- определение физико-химических характеристик местных строительных материалов;

- подбор состава бетонов, растворов, мастик, антикоррозийных и других строительных составов и выдача разрешений на их применение, контроль за дозировкой и приготовлением бетонов, растворов, мастик;

- контроля за соблюдением правил транспортировки, разгрузки и хранения строительных материалов, конструкций и изделий;

- отбора проб грунта, бетонных и растворных смесей, изготовление образцов и их испытание, контроль и испытание сварных соединений, определение прочности бетона в конструкциях и изделиях неразрушающими методами, контроль за состоянием грунта в основаниях (промерзание, оттаивание).

5. Выполнение работ по контролю качества производится аттестованными специалистами лаборатории строительного управления (треста) или привлеченными аккредитованными лабораториями, оснащенными соответствующим оборудованием, штатами и имеющими необходимые допуски.

6. Все работы сопровождаются геодезическим контролем над осадками сооружений во время строительства и 3 месяца после окончания работ. Работы по контролю должны осуществляться специализированными организациями.

5.9. Противопожарные мероприятия при строительстве

Обеспечение пожарной безопасности на строительной площадке осуществляется в соответствии с требованиями «Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных и огневых работ» ППБС-01-94. Мероприятия пожарной профилактики разрабатываются одновременно с проектом производства работ. Эти работы должны быть направлены на предупреждение возникновения пожара, ограничение его распространения, обеспечение условий для успешной локализации и тушения пожара.

В районах производства строительно-монтажных работ в колодцах существующей постоянной и временной сети противопожарного водопровода установить пожарные гидранты.

Для предупреждения возникновения пожаров на строительной площадке необходимо чтобы все дороги, подъезды, пожарные гидранты должны быть в исправном состоянии и свободны для проезда и подъезда к ним.

5.10. Мероприятия по охране окружающей среды в период строительства

При организации строительной площадки и выполнении строительных работ необходимо выполнение следующих мероприятий по охране окружающей природной среды:

1) Хранение пылящих строительных материалов осуществляется в упаковках, ящиках и контейнерах;

2) Мытье, ремонт и техническое обслуживание строительных машин и техники осуществлять на производственных базах подрядчика и субподрядных организаций;

3) Все стационарные механизмы, работающие на двигателях внутреннего сгорания, устанавливаются на металлические поддоны для сбора масла, конденсата и дизельного топлива.

Поддоны периодически очищаются в специальных емкостях, и их содержимое вывозится на полигон твердых отходов;

4) На всех видах работ применяются технически исправные машины и механизмы с отрегулированной топливной аппаратурой, исключающей потери ГСМ и их попадание в грунт;

5) Хранение горюче - смазочных материалов непосредственно на строительной площадке не допускается;

6) Отходы производства собираются в специальные контейнеры и по мере их накопления вывозятся на свалки в установленном порядке;

7) Размещение биотуалетов на территории строительной площадки;

8) Проезд строительной техники может быть осуществлен только по существующим автодорогам;

9) Заправка строительной техники осуществляется из автозаправщиков, оборудованных исправными заправочными пистолетами;

10) По окончании работ весь строительный и бытовой мусор вывозится в места, специально отведенные для этих целей местной администрацией.

Сбор, хранение и утилизация отходов на период строительства

Строительные материалы, завезённые, но, по какой-либо причине, не используемые на объекте собираются и отвозятся на склад или другой объект.

При проведении строительных работ следует предусматривать максимальное применение малоотходной и безотходной технологии.

Не допускается сжигание на строительной площадке строительных отходов.

Емкости для хранения и места складирования, разлива, раздачи горюче-смазочных материалов и битума оборудуются специальными приспособлениями, и выполняются мероприятия для защиты почвы от загрязнения.

Бытовой мусор следует регулярно удалять с территории строительной площадки в установленном порядке и в соответствии с требованиями действующих санитарных норм.

Кроме того, при проведении строительных работ образуются отходы материалов, используемых в строительстве. Отходы должны быть своевременно удалены с площадок проведения работ. За это несет ответственность подрядная организация, выполняющая работы по строительству. Вывоз отходов осуществляется по договорам с соответствующей организацией.

6. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

По разработанным чертежам составлена сметная документация.

Состав сметной документации:

- пояснительная записка;
- сводный сметный расчет;
- сметный расчет;
- локальная смета;
- ресурсная смета.

Ко всем расчетам прикладываются исходные данные. Сметный расчет представлен в приложении 1 проекта.

Сметная стоимость строительства:

Сводный сметный расчет в сумме 143459,571 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 15370,668 тыс.тенге

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 декабря 2016 года № 517 «О внесении изменений в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам»;
2. Закон РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»;
3. СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство»;
4. СН РК 2.03-02-2012 «Инженерная защита в зонах затопления и подтопления»;
5. СП РК 2.03-102-2012 «Инженерная защита в зонах затопления и подтопления»;
6. СН РК 3.04-01-2018 «Гидротехнические сооружения»;
7. СП РК 3.04-101-2013 «Гидротехнические сооружения»;
8. СП РК 3.04-105-2014 «Плотины из грунтовых материалов»;
9. СП РК 3.04-107-2014 «Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов)»;

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 – Сметный расчет

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2024.6)

- 1 -

50

Форма 8

Сводный сметный расчет в сумме	143459,571 тыс.тенге
в том числе:	
налог на добавленную стоимость (НДС)	15370,668 тыс.тенге

С В О Д Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т
С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А
АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.КОСШЫ.

САНАЦИЯ УЧАСТКА РУСЛА РЕКИ НУРА С ПОСЛЕДУЮЩИМ УКРЕПЛЕНИЕМ БЕРЕГА НА ГРАНИЦАХ КОНТРАКТНОЙ
 ТЕРРИТОРИИ КАРЬЕРА ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ (ГПС), ПЛОЩАДЬЮ 80 га, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ТОО «ЖИБЕК-ТД»,
 РАСПОЛОЖЕННОГО НА УЧАСТКЕ «ЮЖНОЕ КОСШЫ» г.КОСШЫ.

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах 2024 г.

N п/п:	N смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге			Всего
			Строительно-оборудования:	монтажных работ:	мебели и инверторя:	
1 :	2 :	3	4	5	6	7
1.	Сметный расчет стоимости строительства	-Сметная стоимость строительства	125577,356	-	2511,547	128088,903
		Итого:	125577,356	-	2511,547	128088,903
2.	Решения Правительства	Налог на добавленную стоимость, 12%	-	-	15370,668	15370,668
		Всего по сводному сметному расчету	125577,356	-	17882,215	143459,571

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2024.6)

- 1 -

591

ФОРМА 1

Заказчик:

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме
в том числе:
налог на добавленную стоимость

143459,571 тыс.тенге
15370,668 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

20 г.

С М Е Т Н Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А
АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.КОСШЫ.

САНАЦИЯ УЧАСТКА РУСЛА РЕКИ НУРА С ПОСЛЕДУЮЩИМ УКРЕПЛЕНИЕМ БЕРЕГА НА ГРАНИЦАХ КОНТРАКТНОЙ
ТЕРРИТОРИИ КАРЬЕРА ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ (ГПС), ПЛОЩАДЬЮ 80 га, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ТОО «ЖИБЕК-ТД»,
РАСПОЛОЖЕННОГО НА УЧАСТКЕ «ЮЖНОЕ КОСШЫ» г.КОСШЫ.

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах 2024 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге			Всего, строительно-инженерного: монтажных : оборудования: прочих работ : поставки : затрат : подрядчика :			
			1	2	3		4	5	6
Глава 2. Основные объекты строительства									
1. ЛС-2-1-1	- САНАЦИЯ УЧАСТКА РУСЛА РЕКИ НУРА С ПОСЛЕДУЮЩИМ УКРЕПЛЕНИЕМ БЕРЕГА		125577,356		-	-	125577,356		
	Всего по главе		125577,356		-	-	125577,356		
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2024 Г.		125577,356		-	-	125577,356		
2. СН РК 8.02-02-2002	-в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, K=1		125577,356		-	-	125577,356		
3. ГН ОССС	-Непредвиденные работы и затраты-2%		-	-	2511,547	2511,547			
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		125577,356		-	2511,547	128088,903		
4. Решения Правительства	-НДС (12%)		-	-	15370,668	15370,668			
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА		125577,356		-	17882,215	143459,571		

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.КОСШЫ.

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- САНАЦИЯ УЧАСТКА РУСЛА РЕКИ НУРА С ПОСЛЕДУЮЩИМ
УКРЕПЛЕНИЕМ БЕРЕГА НА ГРАНИЦАХ КОНТРАКТНОЙ
ТЕРРИТОРИИ КАРЬЕРА ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ (ГПС),
ПЛОЩАДЬЮ 80 га, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ТОО «ЖИВЕК-ТД»,
РАСПОЛОЖЕННОГО НА УЧАСТКЕ «ЮЖНОЕ КОСШЫ» г.КОСШЫ.

ОБЪЕКТ НОМЕР РП

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)НА САНАЦИЯ УЧАСТКА РУСЛА РЕКИ НУРА С ПОСЛЕДУЮЩИМ УКРЕПЛЕНИЕМ
БЕРЕГА.

ОСНОВАНИЕ: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ.

Сметная стоимость	125577,356	тыс.тенге
Сметная заработка плата	18208,295	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	4,28	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2024 г.

:			:			Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге		
Нº : Шифр : Наименование работ			Единица измерения			Количества			Всего			Всего		
п/п: норм, код ресурса			и затрат			чественно			экспл. машин			материалы		
1 :	2 :	3	4 :	5	6 :	7 :	8 :	9 :	10 :	11 :	12	13 :	14 :	15

РАЗДЕЛ 1. ОЧИСТКА ОТ КУСТАРНИКОВ.

=====														
1.	E11-01020	-Срезка кустарников, га		0,5	58305	58305	29152	29153	--	--	--	--	--	29152
	7-1301	мелких деревьев,			--	15199	--	7600	--	--	--	--	--	
	1101-0207	зарослей кусторезами на												
	-1301	тракторе мощностью 79												
	РСНБ РК	кВт (108 л/с)												
	2022													
	Кзтр и													
	Кэм=1,12													
2.	E11-01010	-Планировка грунта	m2	5000	4	4	20000	20000	--	--	--	--	--	20000
	4-0703	бульдозером мощностью			--	1	--	5000	--	--	--	--	--	
	1101-0104	121 кВт (165 л.с.)												
	-0703	поверхно												
	РСНБ РК	сти за												
	2022	проход												
	Кзтр и	бульдозе												
	Кэм=1,12	ра												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	E11-01020 7-2302 1101-0207 -2302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	-Расчистка участка от случайного мусора, порубочных остатков валкователями с трактором 59 кВт (80 л.с.) - 70 % механизированным способом	га	0,5	84829 --	84829 23551	42414 --	42415 11776	--	--	42414
4.	C3414-104 -0601 414-104-0 601 РСНБ РК 2022	-Погрузка кустарников, мусора и порубочных остатков, в том числе вручную	т	11,25	1353 --	--	15221 --	--	--	--	15221
5.	C3412-102 -0216 412-102-0 216 РСНБ РК 2022	-Перевозка кустарников, мусора и порубочных остатков на расстояние 18 км автомобилями-самосвалам и на полигон ТБО г.Астаны	т · км	202,5	31 --	--	6278 --	--	--	--	6278
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		1	Тенге Тенге	--	--	113065 --	91568 24376	--	--	--	113065
Стоимость общестроительных работ				Тенге			113065				
Всего заработка плата				Тенге				24376			
Транспортные расходы				Тенге			21499				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге			113065				
Нормативная трудоемкость				чел.-ч							6
Сметная заработка плата				Тенге				24376			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1	Тенге		113065				
Нормативная трудоемкость				чел.-ч							6
Сметная заработка плата				Тенге			24376				
РАЗДЕЛ 2. СРЕЗКА И ВЫЕМКА ГРУНТА С БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ (СОЗДАНИЕ КОНТУРА РУСЛА).											
6.	E11-01010 2-0320 1101-0102 -0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	-Разработка грунта экскаватором с ёмкостью ковша 1 м3 с погрузкой в автотранспорт	м3	1094 25	338 68	312 27350	369772 74392	341328 --	1094 --	--	369772

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<hr/>											
Иzm. и доп. вып. 37											
7.	E11-01010	-Разработка грунта I	м3	1094	87	87	95178	95178	--	--	95178
	4-0205	кат. бульдозером	грунта		--	17	--	18598	--	--	
	1101-0104	мощностью 121 кВт (165									
	-0205	л.с.) с перемещением на									
	РСНБ РК	10 метров (ППС)									
	2022										
	Кзтр и										
	Кэм=1,12										
8.	E11-01020	-Уплотнение грунта	м3	273,5	233	233	63726	63725	--	--	63726
	1-0301	самоходным вибрационным	уплотнен		--	62	--	16957	--	--	
	1101-0201	катком 2,2 тонны на	ного								
	-0301	глубину 0,25 м	грунта								
	РСНБ РК										
	2022										
	Кзтр и										
	Кэм=1,12										
<hr/>											
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		2	Тенге		--	--	528676	500231	1094	--	528676
			Тенге		--	--	27350	109947	--	--	
<hr/>											
Стоимость общестроительных работ				Тенге			528676				
Материалы				Тенге			1094				
Всего заработка плата				Тенге				137297			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге			528676				
Нормативная трудоемкость				чел.-ч							32
Сметная заработка плата				Тенге				137297			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				2	Тенге		528676				
Нормативная трудоемкость				чел.-ч							32
Сметная заработка плата				Тенге			137297				
<hr/>											
РАЗДЕЛ 3. ОЧИСТКА ДНА И УГЛУБЛЕНИЕ РУСЛА.											
9.	E11-01010	-Разработка грунта	м3	132160	338	312	44670080	41233920	132160	--	44670080
	2-0320	экскаватором с ёмкостью	грунта		25	68	3304000	8986880	--	--	
	1101-0102	ковша 1 м3 с погрузкой									
	-0320	в автотранспорт									
	РСНБ РК										
	2022										
	Кзтр и										
	Кэм=1,12										
	Иzm. и										
	доп. вып.										
	37										
10.	E11-01010	-Разработка грунта I	м3	132160	87	87	11497920	11497920	--	--	11497920

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4-0205 1101-0104 -0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	кат. бульдозером мощностью 121 кВт (165 л.с.) с перемещением на 10 метров	грунта	--	17	--	2246720	--	--	--	--	--
11. C3412-102 -0201 412-102-0 201 РСНБ РК 2022	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалам и грузоподъёмностью свыше 10 тонн	т · км	185024	281	--	51991744	--	--	--	--	51991744
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	3	Тенге Тенге	--	--	108159744	52731840	132160	--	108159744		
Стоимость общестроительных работ Материалы Всего заработка плата Транспортные расходы ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ Нормативная трудоемкость Сметная заработка плата ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Нормативная трудоемкость Сметная заработка плата		Тенге Тенге Тенге Тенге Тенге чел.-ч Тенге Тенге чел.-ч Тенге	--	--	3304000	11233600	--	--			
РАЗДЕЛ 4. УСТРОЙСТВО НАСЫПИ СТРУЕНАПРАВЛЯЮЩИХ ДАМБ С ПОСЛОЙНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ.											
12. E11-01010 4-0206 1101-0104 -0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	-Разработка грунта II кат. бульдозером мощностью 121 кВт (165 л.с.) с перемещением на 10 метров (грунта, образованного при очистке дна реки и резке с берега)	м3 грунта	133254	102	102	13591908	13591908	--	--	13591908	
13. E11-01010 4-0703 1101-0104 -0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	-Планировка грунта бульдозером мощностью 121 кВт (165 л.с.)	м2	51148	4	4	204592	204592	--	--	204592	

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете 2-1-1

Составлена в текущих ценах 2024 г.

КОД РЕСУРСА		ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНС- ПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, стоимость (ВСЕГО), на ед. тенге	
ПП	ПРИЗНАК:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты труда по специальностям									
1	20011T	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	746,2224	4368	-	2104	3259499
						-	-	1570051,9	
								3	
Всего затраты труда по специальностям (по смете)									
				тенге				1570052	3331350
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	746,2224				
Трудовые ресурсы									
2	3	ABC 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	3533,2945	4210,5	-	-	(14876944
						-	-	-)
Всего трудовые ресурсы (по смете)									
				тенге				--	3331350
Строительные машины и механизмы									
							Эксплуатация машин	Зарплата машинис- тов	
Строительные машины и механизмы (затрат 47,6533% при пороге 80%)									
3	3103C	311-401-0106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,65 до 1 м ³ , масса свыше 13 до 20 т	маш.-ч	1602,88571	20865	-	4290	33444210
					52				
						-	-	6876379,7	
								2	
Строительные машины и механизмы (затрат 36,2414% при пороге 15%)									
4	3094C	311-101-0201	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, среднего класса мощностью свыше 96 до 140 кВт, массой свыше 14,0 до 18,5 т	маш.-ч	1144,94862	22215	-	4290	25435034
					72				
						-	-	4911829,6	
								1	
Строительные машины и механизмы (затрат 16,1053% при пороге 5%)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	3093C	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	665,203358 4	16471 -	-	4290 2853722,4 1	10956565
6	619C	321-101-0501	Катки дорожные самоходные вибрационные массой 2,2 т	маш.-ч	29,25552	9399	-	3004 87883,58	274973
7	1827C	334-101-0101	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	3,92	10232	-	3004 87883,58	40109
8	857C	326-102-0601	Кусторезы навесные на тракторе с гидравлическим управлением, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,1168	13772	-	3590 11775,68	29153
9	363C	326-102-1501	Валкователи древесных остатков (без трактора)	маш.-ч	3,92	588	-	7599,31	2305
Всего строительные машины и механизмы (по смете)					тенге			14876945	70099510

Строительные материалы и конструкции

Строительные материалы и конструкции (затрат 100,0% при пороге 80%)

10	100081C	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) ММ	м3	15,99048	5077	-	-	81184
Всего строительные материалы и конструкции (по смете)									

Транспортные расходы


11	412-102-0201РСНБ	РК 2022	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами грузоподъёмностью свыше 10 тонн	т·км	185024	281	-	281 51991744	51991744
12	414-104-0601РСНБ	РК 2022	Погрузка кустарников, мусора и порубочных остатков, в том числе вручную	т	11,25	1353	-	1353 15221,25	15221
13	412-102-0216РСНБ	РК 2022	Перевозка кустарников, мусора и порубочных остатков на расстояние 18 км автомобилями-самосвалами на полигон ТБО г.Астаны	т·км	202,5	31	-	31 6277,5	6278
Всего транспортные расходы (по смете)									

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

- 1 Э2420'К9Ж5Б1'Ц8Н2ХМШ2В1-С''1******
- 2 Ю''АКМОЛИНСКАЯ ОВЛАСТЬ, г.КОСШЫ.'2-05-2021'РП'САНАЦИЯ УЧАСТКА РУСЛА РЕКИ НУРА С ПОСЛЕДУЮЩИМ УКРЕПЛЕНИЕМ БЕРЕГА НА ГРАНИЦАХ КОНТРАКТНОЙ ТЕРРИТОРИИ КАРЬЕРА ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННОЙ СМЕСИ (ГПС), ПЛОЩАДЬЮ 80 га, ПРИ НАДЛЕЖАЩЕГО ТОО «ЖИВЕК-ТД», РАСПОЛОЖЕННОГО НА УЧАСТКЕ «ЮЖНОЕ КОСШЫ» г.КОСШЫ.'РЧ'2'2-1-1'САНАЦИЯ УЧАСТКА РУСЛА РЕКИ НУРА С ПОСЛЕДУЮЩИМ УКРЕПЛЕНИЕМ БЕРЕГА.'ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ.''в текущих ценах 2024 г.*
- 3 L*
- 4 РОЧИСТКА ОТ КУСТАРНИКОВ.*
- 5 Е11-010207-1301'0,5''Срезка кустарников, мелких деревьев, зарослей кусторезами на тракторе мощностью 79 кВт (108 л/с) 'га*
- 6 Е11-010104-0703'0,5.10000''Планировка грунта бульдозером мощностью 121 кВт (165 л.с.) 'м² спланированной поверхности за проход бульдозера*
- 7 Е11-010207-2302'0,5''Расчистка участка от случайного мусора, порубочных остатков валкователями с трактором 59 кВт (80 л.с.) - 70 % механизированным способом 'га*
- 8 С3414-104-0601'11,25''Погрузка кустарников, мусора и порубочных остатков, в том числе вручную'*
- 9 С3412-102-0216'11,25.18''Перевозка кустарников, мусора и порубочных остатков на расстояние 18 км автомобилиями-самосвалами на полигон ТБО г.Астаны'т·км*
- 10 РСРЕЗКА И ВЫЕМКА ГРУНТА С БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ (СОЗДАНИЕ КОНТУРА РУСЛА).*
- 11 Е11-010102-0320'1094''Разработка грунта экскаватором с ёмкостью ковша 1 м³ с погрузкой в автотранспорт 'м³ грунта*
- 12 Е11-010104-0205'1094''Разработка грунта I кат. бульдозером мощностью 121 кВт (165 л.с.) с перемещением на 10 метров (ППС) 'м³ грунта*
- 13 Е11-010201-0301'273,5''Уплотнение грунта самоходным вибрационным катком 2,2 тонны на глубину 0,25 м 'м³ уплотненного грунта*
- 14 РОЧИСТКА ДНА И УГЛУБЛЕНИЕ РУСЛА.*
- 15 Е11-010102-0320'132160''Разработка грунта экскаватором с ёмкостью ковша 1 м³ с погрузкой в автотранспорт 'м³ грунта*
- 16 Е11-010104-0205'132160''Разработка грунта I кат. бульдозером мощностью 121 кВт (165 л.с.) с перемещением на 10 метров 'м³ грунта*
- 17 С3412-102-0201'185024.1''Перевозка грунта автомобилями-самосвалами грузоподъёмностью выше 10 тонн 'т·км*
- 18 РУСТРОЙСТВО НАСЫПИ СТРУЕНАПРАВЛЯЮЩИХ ДАМБ С ПОСЛОЙНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ.*
- 19 Е11-010104-0206'133254''Разработка грунта II кат. бульдозером мощностью 121 кВт (165 л.с.) с перемещением на 10 метров (грунта, образованного при очистке дна реки и срезке с берега) 'м³ грунта*
- 20 Е11-010104-0703'5,1148.10000''Планировка грунта бульдо
- зером мощностью 121 кВт (165 л.с.) 'м² спланированной поверхности за проход бульдозера*
- 21 Е11-010201-0301'12787''Уплотнение грунта самоходным вибрационным катком 2,2 тонны на глубину 0,25 м 'м³ уплотненного грунта*
- 22 К**

Приложение 2 –План устройства насыпи и берегоукрепительных работ

План устройства насыпи струенаправляющих дамб протяженностью 1346 м

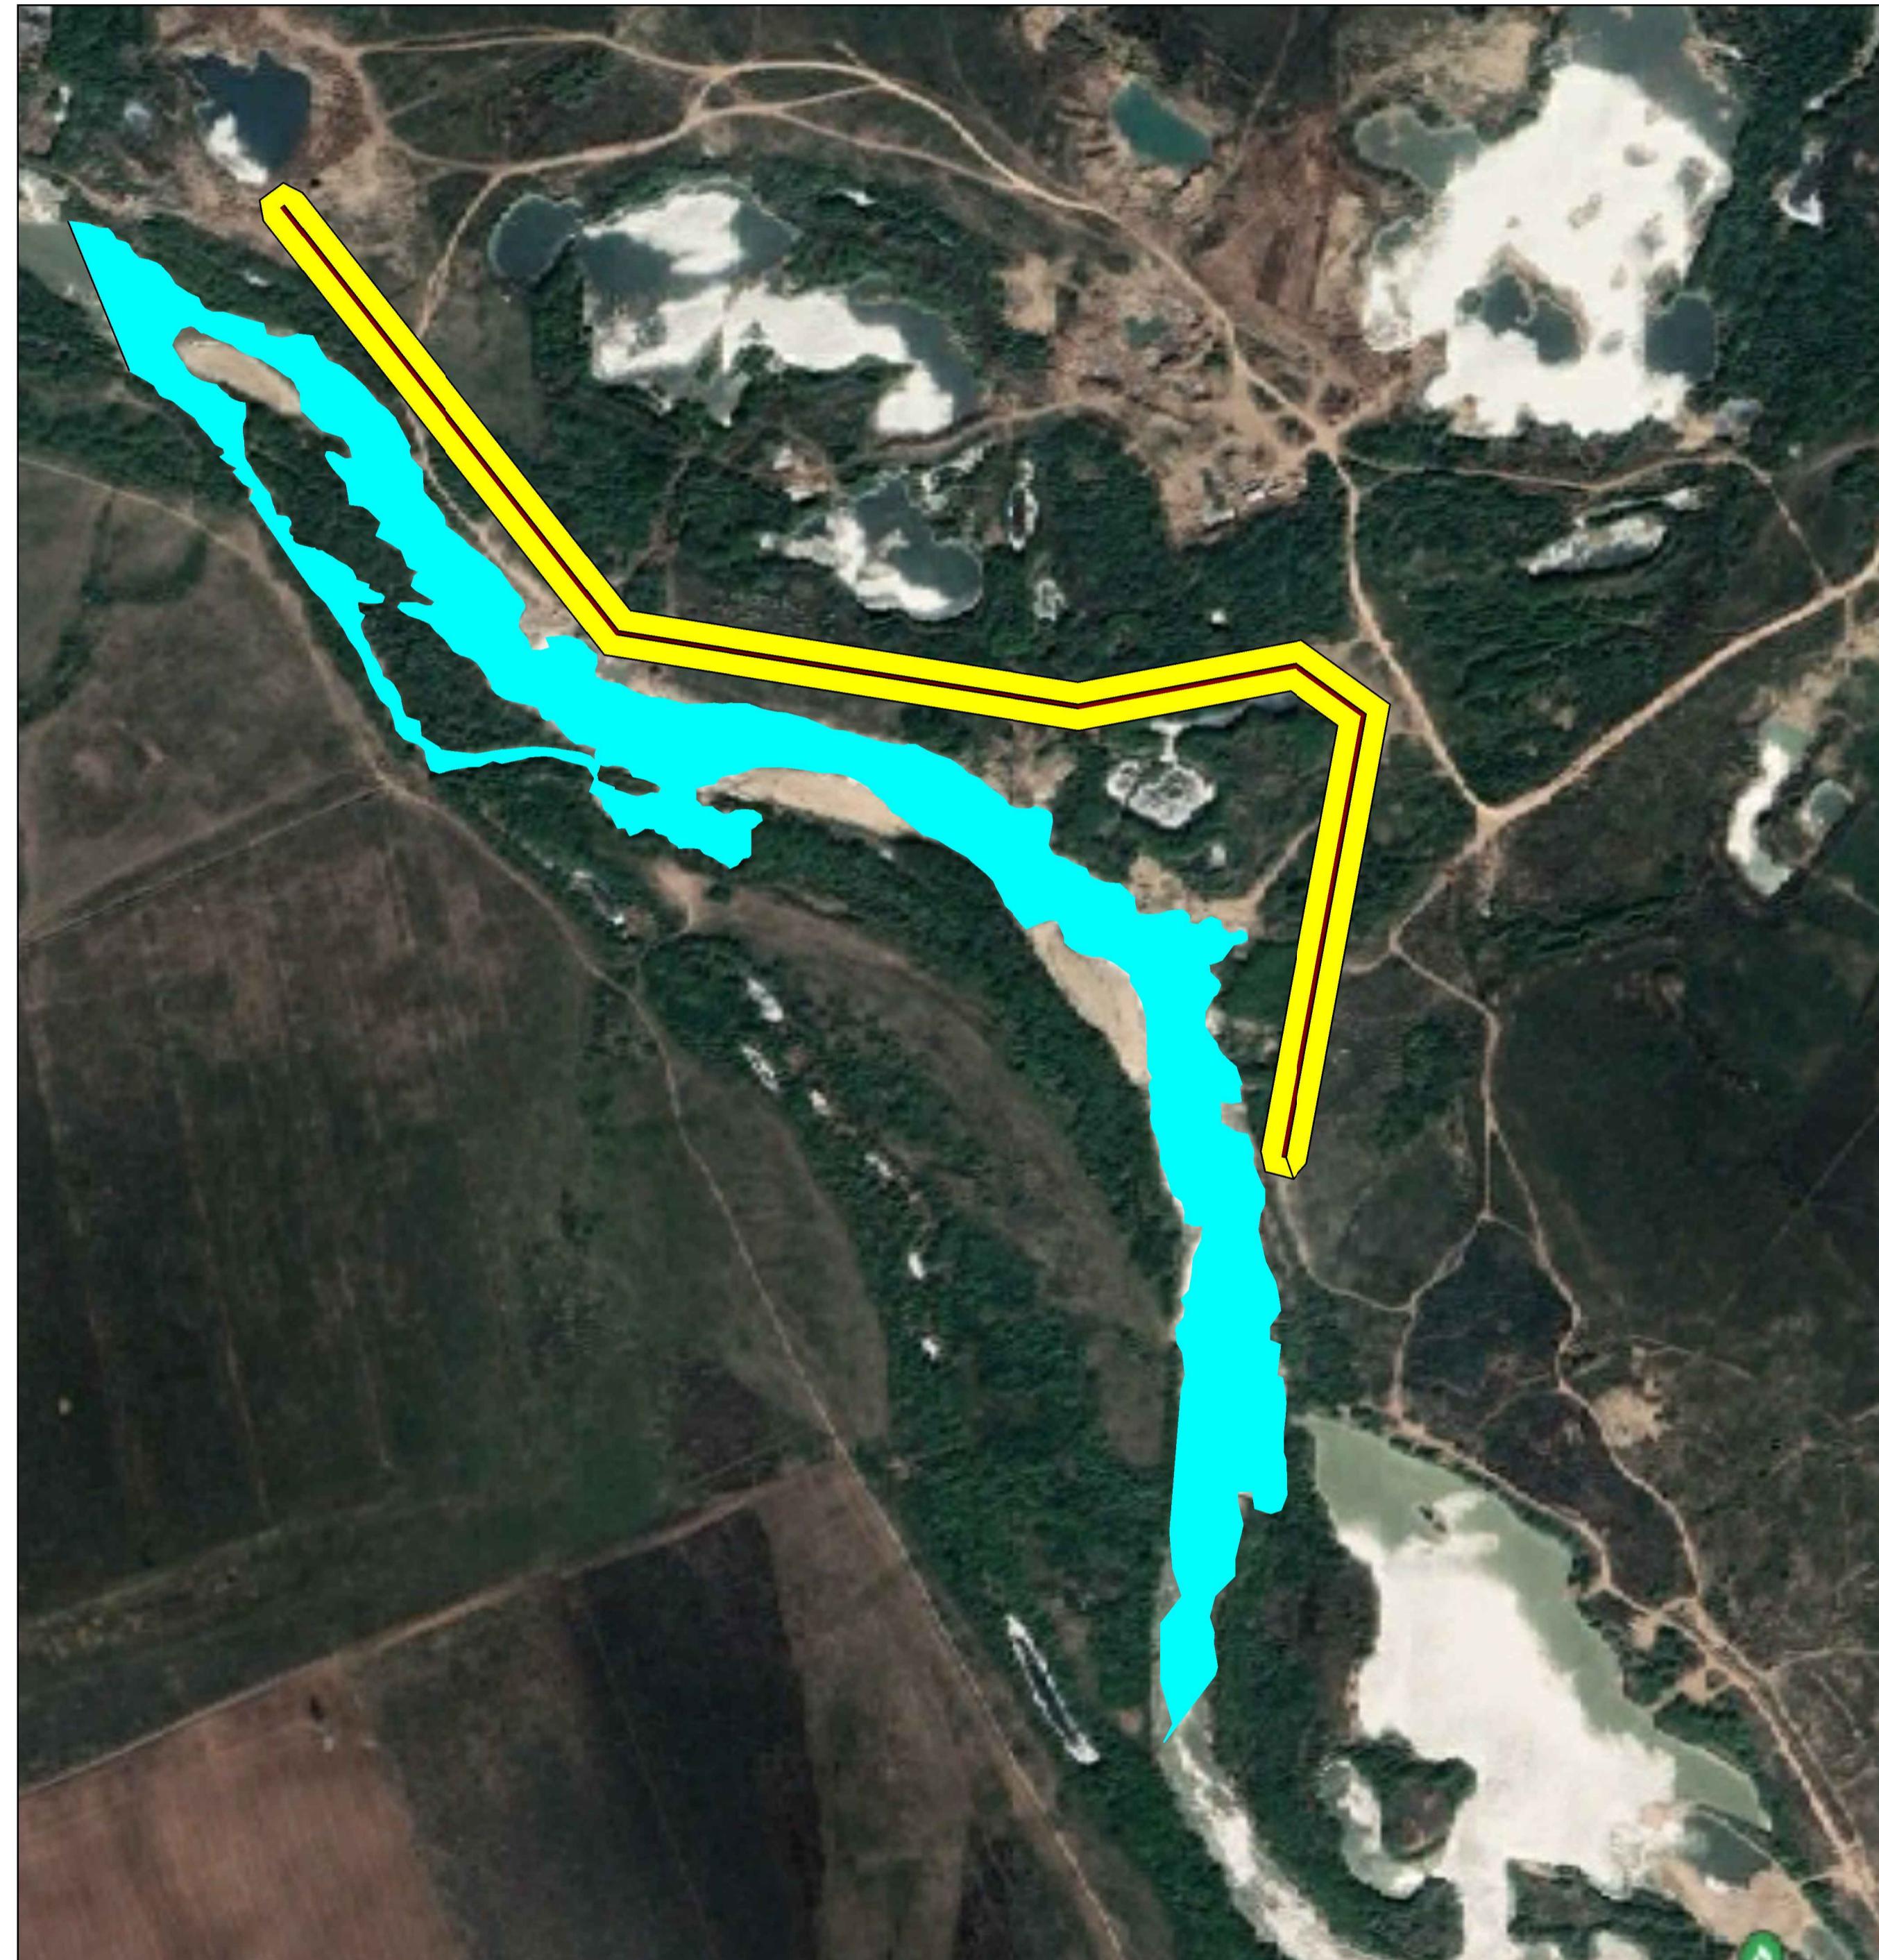

Условные обозначения

- Насыпь струенаправляющих дамб
- Река Нур

Последовательность работ:

Очистка от кустарников

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Количество единиц
1	Обследуемая территория	га.	5.1148
2	Пустые участки	га.	4.6148
3	Площадь, занимаемая кустарниками (ориентировочная)	га.	0.5
4	Срезка кустарников, мелких деревьев, зарослей кустарниками на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.)	га.	0.5
5	Планировка грунта бульдозером мощностью 121 кВт	га.	0.5
6	Расчистка участка от случайного мусора, порубочных остатков, включая вывозку сажистами с трактором 59 кВт (80 л.с.) – 70 % механизированым способом	га.	0.5
7	Изработка кустарников, мусора и порубочных остатков, в том числе пропучку	тонн	11.25
8	Перевозка кустарников, мусора и порубочных остатков на расстояние 18 км автомобилиями – самосвалами на полигон ТБО г. Астана	тонн	11.25

Очистка от кустарников

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Количество единиц
1	Обследуемая территория	га.	0.1094
2	Площадь земель, подлежащая срезке	га.	0.1094
3	Разработка грунта экскаватором с ёмкостью ковша 1 м³ с погрузкой в автотранспорт	м³	1094
4	Разработка грунта I кат. бульдозером с ёмкостью ковша 121 кВт. С перемещением на 10 метров (НПС)	м³	1094
5	Уплотнение грунта самоходным вибрационным катком 2,2 тонны на глубину 0,25 м.	га	0.1094
		м³	273.5


Очистка от кустарников

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Количество единиц
1	Обследуемая территория	га.	0.3282
2	Площадь земель, подлежащая очистке	га.	0.3282
3	Разработка грунта экскаватором с ёмкостью ковша 1 м³ с погрузкой в автотранспорт	м³	132160
4	Разработка грунта I кат. бульдозером с ёмкостью ковша 121 кВт. С перемещением на 10 метров	м³	132160
5	Перевозка грунта автотранспортом - автосамосвалами грузоподъемностью 10 тонн	тонн	185024.00

Очистка от кустарников

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Количество единиц
1	Обследуемая территория	га.	5.1148
2	Площадь земель, подлежащая устройству дамбы	га.	5.1148
5	Разработка грунта с автосамосвалами (образованного при очистке дна реки и срезке с берега)	тонн	186555.60
6	Разработка грунта II кат. Бульдозером T-170 мощностью 121 кВт. с перемещением на 10 метров	м³	133254.00
7	Планировка грунта бульдозером T-170 мощностью 121 кВт.	га.	5.1148
8	Уплотнение грунта самоходным вибрационным катком 2,2 тонны на глубину 0,25 м.	га	5.1148
		м³	12787

План устройства насыпи

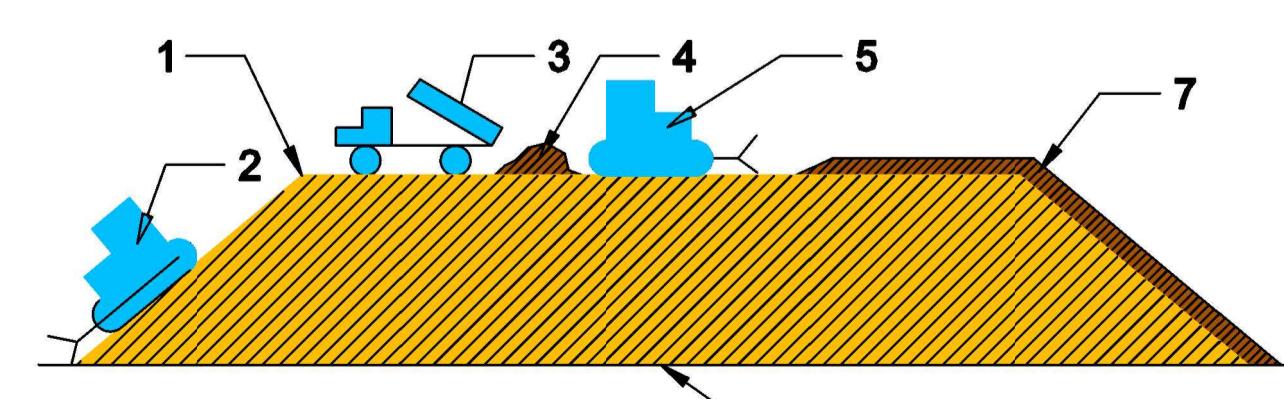

- 1 - выложенный откос;
- 2 и 5 - бульдозер;
- 3 - автомобильный транспорт;
- 4 - насыпной грунт;
- 6 - дамба;
- 7 - уплотненный слой;

Технические решения:

Протяженность русла реки Нура в пределах проектной зоны составляет - 1094 м

Для предотвращения дальнейшего размыва правого берега, засорения и зарастания поймы реки Нура, поддержания водных объектов в состоянии, соответствующим санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям проектом санации предусматриваются следующие мероприятия:

- подготовительные работы: планировка береговой трассы с устройством полок под проход экскаватора;

- обеспечение гидрологического режима путем спрямления русла и выравнивания дна реки для предотвращения меандрирования русла реки.

- выпрямление и углубление русла реки;

- очистка от кустарника русла реки и будущего основания дамбы

- устройство насыпи струенаправляющих дамб с послойным уплотнением длиной 1346 метров при высоте в 5 метров;

- планировка откосов дамб вручную;

- планировка гребня дамб;

- засыпка старого русла избытками грунта выемки с последующим разравниванием растительным слоем грунта.

Очистка от кустарников. Очистка трассы от кустарников производится кусторезами корчевателями с перемещением в валы с дальнейшим вывозом на полигоны твердых отходов.

Срезка и выемка грунта с береговой линии (создание контура русла). Срезка грунта на откосах русла реки производится экскаваторами в отвал и под береговые дамбы бульдозерами с перемещением отвалов в кавальеры.

Очистка дна и углубление русла. Проектом предусмотрена экскаватором драглайн или земснарядом очистка дна и заглубление русла реки.

Устройство насыпи струенаправляющих дамб с послойным уплотнением. Проектом предусмотрено использование объема выемки при очистке дна русла для устройства насыпи высотой 5 метров и длиной 1346 метров. Недостающий объем грунта для устройства насыпи подвозится автосамосвалами КАМАЗ-15-20тн из карьера, определенного заказчиком.

Планировка откосов и берега. Планировка откосов реки выполняется бульдозерами. Планировка верха берега реки выполняется грейдерами.

Ситуационная схема



СУРРН.0001.11.06.2024

Изм/Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Стадия	Лист	Листов
Разр.б.				План устройства насыпи струенаправляющих дамб протяженностью 1346 м	РП	1
Проектил.						
Н.контр.				Схема работ, технические решения и объем работ	ТОО "NES"	2024 год
ГИП						
