

**Филиал Компании с ограниченной ответственностью  
«STECOLCORPORATION» в РК  
ТОО «Жетісу-Жерқойнауы»**

**«УТВЕРЖДАЮ»  
Руководитель проекта  
Филиала Компании с**

**ограниченной ответственностью  
«STECOLCORPORATION» в РК**

**Янг Хонвэй**

**2026 г.**



**Рабочий проект**

**рекультивации земель, нарушенных при  
добычеобобщераспространенных полезных ископаемых на 5 участках  
«км 224», «км 238», «км 330 Б», «км 252» и «км 264», расположенных в  
Ұлытауском районе области Ұлытау, используемых для  
реконструкции автомобильной дороги республиканского значения  
«Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ», участок «Кызылорда-  
Жезказган», лот 7,8км 216-424, км 216-243 и км 243-266**

**Директор**

**ТОО «Жетісу-Жерқойнауы»**



**Рахметов А.Т.**

**г. Каскелен 2026 г.**

### Усредненные технико-экономические показатели проекта

| №№<br>п/п                                        | Показатели                                                               | Един, измер.         | Кол-во     |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| <b>Этап проведения добычи (нарушения земель)</b> |                                                                          |                      |            |
| 1                                                | Площадь нарушенных земель                                                | га                   | 73,46      |
| 2                                                | Мощность вскрыши                                                         | м                    | 0,2        |
| 3                                                | Направление рекультивации                                                | сельскохозяйственное |            |
| 4                                                | Объем вскрышных пород (временный отвал) в т.ч.:                          | тыс.м <sup>3</sup>   | 203,62     |
|                                                  | внутренний                                                               | тыс.м <sup>3</sup>   | 203,62     |
|                                                  | внешний                                                                  | тыс.м <sup>3</sup>   | 0          |
| <b>Технический этап рекультивации</b>            |                                                                          |                      |            |
| 1                                                | Ширина снятия дополнительной вскрыши при выполаживании бортов карьеров   | м                    | 4,88-10,18 |
| 2                                                | Площадь дополнительной вскрыши при выполаживании бортов карьеров         | га                   | 0,77-1,89  |
| 3                                                | Снятие дополнительной вскрыши при выполаживании бортов карьеров          | тыс.м <sup>3</sup>   | 12,23      |
| 4                                                | Общий объем пород вскрыши                                                | тыс.м <sup>3</sup>   | 215,85     |
| 5                                                | Объем срезки грунта при выполаживании бортов карьеров до 10°.            | тыс.м <sup>3</sup>   | 55,77      |
| 6                                                | Нанесения пород вскрышных образований с планировкой                      | тыс.м <sup>3</sup>   | 215,85     |
| 7                                                | Планировка, уплотнение и прикатывание поверхности дна и откосов карьеров | га                   | 79,57      |
| <b>Биологический этап рекультивации</b>          |                                                                          |                      |            |
| 1                                                | Посев многолетних трав и уход за ними                                    | га                   | 79,57      |
| <b>Сметная стоимость работ по рекультивации</b>  |                                                                          |                      |            |
| 1                                                | Технический этап                                                         | тыс.тенге            | 17480,1    |
| 2                                                | Биологический этап                                                       | тыс.тенге            | 6887,01    |
| 3                                                | Всего                                                                    | тыс.тенге            | 24367,11   |
| <b>Сметная стоимость 1 га рекультивации</b>      |                                                                          |                      |            |
| 1                                                | Технического этапа                                                       | тыс.тенге            | 237,95     |
| 2                                                | Биологического этапа                                                     | тыс.тенге            | 93,752     |
| 3                                                | Всего                                                                    | тыс.тенге            | 331,706    |

Работы по этапу добычи (нарушения земель) не относятся к проекту рекультивации.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

| № главы | Наименование                                                                                                                                                     | Стр. |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1       | 2                                                                                                                                                                | 3    |
|         | Усредненные технико-экономические показатели проекта                                                                                                             | 2    |
|         | ВВЕДЕНИЕ                                                                                                                                                         | 6    |
| 1       | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ                                                                                                                         | 9    |
| 1.1     | Краткое описание объекта проектирования                                                                                                                          | 9    |
| 1.2     | Природные условия                                                                                                                                                | 11   |
| 1.2.1   | Климат                                                                                                                                                           | 11   |
| 1.2.2   | Геоморфология и рельеф                                                                                                                                           | 12   |
| 1.2.3   | Инженерно-геологическая характеристика                                                                                                                           | 12   |
| 1.2.4   | Гидрографическая сеть и гидрогеологическая характеристика                                                                                                        | 17   |
| 1.2.5   | Растительный и животный мир                                                                                                                                      | 17   |
| 1.2.6   | Почвенный покров                                                                                                                                                 | 17   |
| 1.2.7   | Характеристика почво-грунтов по группам пригодности для снятия и последующего использования потенциально-плодородного слоя почвы для биологической рекультивации | 18   |
| 2       | ХАРАКТЕРИСТИКА НАРУШЕНИЙ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ                                                                                                                      | 19   |
| 3       | ЗАКЛЮЧЕНИЯ О НАПРАВЛЕНИИ РЕКУЛЬТИВАЦИИ                                                                                                                           | 20   |
| 4       | ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ                                                                                                                                                | 21   |
| 5       | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАП РЕКУЛЬТИВАЦИИ                                                                                                                                   | 23   |
| 6       | СРОКИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. ПОТРЕБНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ И МЕХАНИЗМАХ                                                                                        | 25   |
| 7       | ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТЗЕМЛЕРОЙНЫМИ МАШИНАМИ                                                                                | 33   |
| 8       | БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЭТАП РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ                                                                                                                          | 38   |
| 9       | КОНТРОЛЬ НАД ПРОЦЕССОМ РЕКУЛЬТИВАЦИИ. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ РЕКУЛЬТИВИРОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬ                                                                         | 47   |
| 10      | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ                                                                                                                                          | 48   |
|         | СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ                                                                                                                                 | 50   |

## СПИСОК ИЛЮСТРАЦИЙ И ТАБЛИЦ

| №<br>п/п | №   | Наименование                                                                                   | Стр. |
|----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1        | 2   | 3                                                                                              | 4    |
|          |     | <b>ИЛЛЮСТРАЦИИ</b>                                                                             |      |
| 1        | 1.1 | Обзорная карта расположения участков «км 224», «км 238», «км 252», «км 264». Масштаб 1:200 000 | 9    |
| 2        | 1.2 | Обзорная карта расположения участка «км 330Б». Масштаб 1:200 000                               | 10   |
| 3        | 4.1 | Схема рекультивации карьеров грунта                                                            | 22   |
| 4        | 6.1 | Техническая характеристика бульдозера Т-130                                                    | 28   |
| 5        | 6.2 | Техническая характеристика катка дорожного вибрационного CLG-616                               | 30   |
|          |     | <b>ТАБЛИЦЫ</b>                                                                                 |      |
| 1        | 1.1 | Географические координаты угловых точек участков                                               | 11   |
| 2        | 5.1 | Сводная таблица вычисления объемов работ связанных с рекультивацией участков                   | 24   |
| 3        | 6.1 | Значения расчетных величин                                                                     | 26   |
| 4        | 6.2 | Таблица сметной стоимости технического этапа рекультивации по видам оборудования               | 27   |
| 5        | 6.3 | Объемы технического этапа рекультивации                                                        | 28   |
| 6        | 6.4 | Таблица сметной стоимости технического этапа рекультивации                                     | 28   |
| 7        | 6.5 | Калькуляция стоимости маш/часа работы бульдозера Т-130                                         | 31   |
| 8        | 6.6 | Калькуляция стоимости 1 маш/часа работы каткаCLG616, 16 тн                                     | 32   |
| 9        | 8.1 | Технико-экономические показатели биологического этапа рекультивации                            | 38   |
| 10       | 8.2 | Перечень и объемы работ по созданию травостоя                                                  | 39   |
| 11       | 8.3 | Расчет потребности семян и удобрений                                                           | 40   |
| 12       | 8.4 | Сводная таблица сметной стоимости работ                                                        | 41   |
| 13       | 8.5 | Технико-экономические показатели рекультивации участка «км 224»                                | 42   |
| 14       | 8.6 | Технико-экономические показатели рекультивации участка «км 238»                                | 43   |
| 15       | 8.7 | Технико-экономические показатели рекультивации участка «км 330Б»                               | 44   |
| 16       | 8.8 | Технико-экономические показатели рекультивации участка «км 252»                                | 45   |
| 17       | 8.9 | Технико-экономические показатели рекультивации участка «км 264»                                | 46   |

## СПИСОК ТЕКСТОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

| №<br>п/п | №<br>прил. | Наименование                                                                        | Стр. |
|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1        | 1          | Задание на разработку проекта рекультивации нарушенных земель                       | 52   |
| 2        | 2          | Лицензии ТОО «Жетісу-Жерқойнауы» №0004297 от 18.08.2011г, №13014203 от 04.09.2013г. | 54   |
| 3        | 3          | Акт обследования нарушенных (подлежащих нарушению) земель, подлежащих рекультивации | 58   |

## ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

| №<br>прило-<br>жения | Наименование приложения                                                                                                                                                                                                                         | Степень<br>секретнос<br>ти | Коли-<br>чество<br>листов |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                                                                                                                                               | 3                          | 4                         |
| 1                    | Топографическая карта, совмещенная с планом подсчета запасов участка «км 224». Масштаб 1:2000<br>План карьера на конец отработки участка «км 224». План карьера на конец рекультивации участка «км 224». Схема рекультивации. Масштаб 1:2000    | н/с                        | 3                         |
| 2                    | Топографическая карта, совмещенная с планом подсчета запасов участка «км 238». Масштаб 1:2000<br>План карьера на конец отработки участка «км 238». План карьера на конец рекультивации участка «км 238». Схема рекультивации. Масштаб 1:2000    | н/с                        | 3                         |
| 3                    | Топографическая карта, совмещенная с планом подсчета запасов участка «км 330Б». Масштаб 1:2000<br>План карьера на конец отработки участка «км 330Б». План карьера на конец рекультивации участка «км 330Б». Схема рекультивации. Масштаб 1:2000 | н/с                        | 3                         |
| 4                    | Топографическая карта, совмещенная с планом подсчета запасов участка «км 252». Масштаб 1:2000<br>План карьера на конец отработки участка «км 252». План карьера на конец рекультивации участка «км 252». Схема рекультивации. Масштаб 1:2000    | н/с                        | 3                         |
| 5                    | Топографическая карта, совмещенная с планом подсчета запасов участка «км 264». Масштаб 1:2000<br>План карьера на конец отработки участка «км 264». План карьера на конец рекультивации участка «км 264». Схема рекультивации. Масштаб 1:2000    | н/с                        | 3                         |

## ВВЕДЕНИЕ

Целью данного проекта является определение способа рекультивации по добыче общераспространенных полезных ископаемых на 5 участках «км 224», «км 238», «км 330 Б», «км 252» и «км 264», расположенном в Улытауском районе области Улытау, используемых для реконструкции автомобильной дороги республиканского значения «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ», участок «Кызылорда-Жезказган», лот 7,8 км 216-424, км 216-243 и км 243-266.

На проектируемый объект рекультивации имеется разрешение на добычу общераспространенных полезных ископаемых, используемых при строительстве (реконструкции) и ремонте автомобильных дорог общего пользования, железных дорог и гидросооружений.

Проект составлен ТОО «Жетісу-Жеркойнауы» (государственные Лицензии №0004297 от 18.08.11г, №1314203 от 04.09.13г.) – приложение 2.

Исходными данными для разработки проекта являются:

- Задание на разработку проекта рекультивации нарушенных земель (приложение 1);

- План горных работ по добыче ОПИ на 3 участках «км 224», «км 238» и «км 330 Б», расположенных в Улытауском районе области Улытау, используемые для реконструкции автомобильной дороги республиканского значения «Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр. РФ» участок «Кызылорда-Жезказган», лот 7,8 км 216-424, км 216-243 и км 243-266.

- План горных работ по добыче ОПИ на 2 участках «км 252», «км 264», расположенных в Улытауском районе области Улытау, используемые для реконструкции автомобильной дороги республиканского значения «Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр. РФ» участок «Кызылорда- Жезказган», лот 7,8 км 216-424, км 216-243 и км 243-266.

Составление настоящего проекта основывалось на положениях по охране окружающей среды и природопользовании закрепленных в законодательной базе Республики Казахстан, а именно:

- **Конституции Республики Казахстан**, принятой 30 августа 1995 года с внесенными изменениями и дополнениями, которая предоставляет гражданам право на благоприятную для жизни и здоровья окружающую природную среду. Конституцией Республики Казахстан определено, что земля, ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы находятся исключительно в государственной собственности и подлежат охране;

- **Земельный кодекс Республики Казахстан.**

Принят 20 июня 2003г. с внесением изменений и дополнений.

Земельный Кодекс определяет компетенцию государственных органов в области земельных отношений, а также устанавливает состав земель, принципы и порядок пользования землей, изъятие земель для государственных и общественных нужд, использование земельных участков для изыскательских работ. Кодексом определены права, обязанности, защита

прав землевладельцев и землепользователей, положения и задачи охраны земель, сформулированы принципы ведения земельного кадастра и землеустройства. Установлены ответственность за нарушение земельного законодательства и порядок разрешения земельных споров.

В нем раскрыты правовые требования к выделению, предоставлению и использованию земель сельскохозяйственного назначения, земель населенных пунктов, земель промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения, земель особо охраняемых природных территорий оздоровительного, рекреационного назначения, земель лесного, водного фонда и земель запаса. Предусмотрен законодательный порядок возмещения убытков землевладельцам и землепользователям, возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства, государственный контроль за использованием и охраной земель, в том числе за рекультивацией нарушенных земель, снятием, сохранением и использованием плодородного слоя почвы при проведении работ, связанных с нарушением земель;

#### **-Экологический кодекс Республики Казахстан.**

Принят 9 января 2007г. с внесением изменений и дополнений.

Экологический Кодекс Республики Казахстан является основным правовым документом, регламентирующим вопросы охраны и использования природных ресурсов в Республике Казахстан. Призван обеспечить защиту конституционных прав граждан Казахстана на благоприятную для их жизни и здоровья окружающую природную среду, определяет правовые, экономические и социальные основы ее охраны в интересах настоящего и будущих поколений.

Экологический кодекс направлен на предотвращение вредного воздействия человеческой деятельности на окружающую природную среду, сохранение природного равновесия и организацию рационального природопользования, обеспечение устойчивого государственного развития республики.

Экологическим кодексом определены права и обязанности граждан по охране окружающей среды, определена компетенция центрального государственного исполнительного органа, а также местных представительных и исполнительных органов и органов местного самоуправления в области охраны окружающей природной среды.

Экологический кодекс регулирует также вопросы нормирования качества окружающей природной среды, включая виды нормативов, порядок их утверждения. В нем сформулированы экологические требования к хозяйственной и иной деятельности и принципы экологической экспертизы. Выявлены общие подходы к выделению зон чрезвычайной экологической ситуации и экологического бедствия, а также особо охраняемых объектов природы;

**- Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и система здравоохранения».**

*Принят 18 сентября 2009г. с внесением изменений и дополнений.*

Кодекс определяет Государственное регулирование и управление в области здравоохранения, устанавливает компетенцию государственных, уполномоченных, центральных исполнительных и органов местного самоуправления.

Особое внимание в кодексе уделяется вопросам государственного контроля и надзора в области здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия окружающей среды. Установлены положения по охране здоровья граждан, определены права и обязанности всех категорий граждан и юридических лиц в области здравоохранения и гарантий их обеспечения.

В кодексе закреплены санитарно-эпидемиологические требования к хозяйственной деятельности:

- к хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования;
- атмосферному воздуху;
- содержанию территорий, сбору и утилизации производственных и бытовых отходов;
- радиационной опасности.



# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

## 1.1 Краткое описание объекта проектирования

Участки ОПИ находятся в южной части Ылытауского района Ылытауской области, располагаясь от 148 км до 182 км южнее центра города Жезказган, на территории листа L-42-XIV (рис.1.1-1.2).


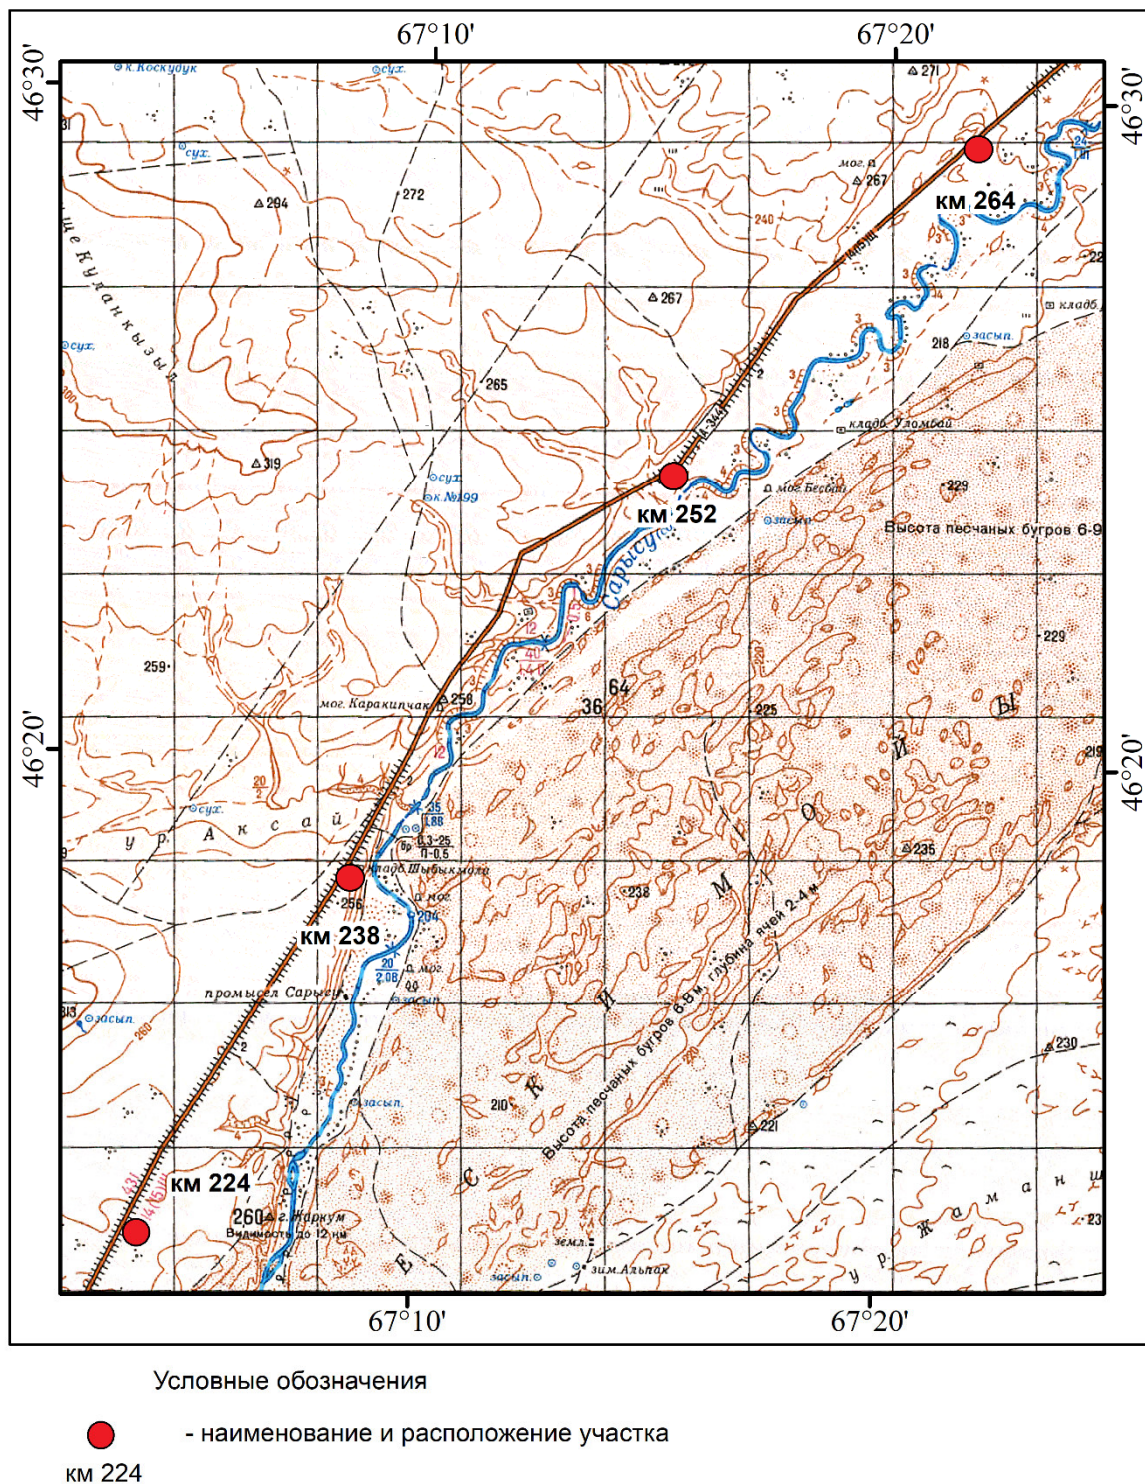


Рис.1.1 Обзорная карта расположения участков «км 224», «км 238», «км 252», «км 264». Масштаб 1:200 000

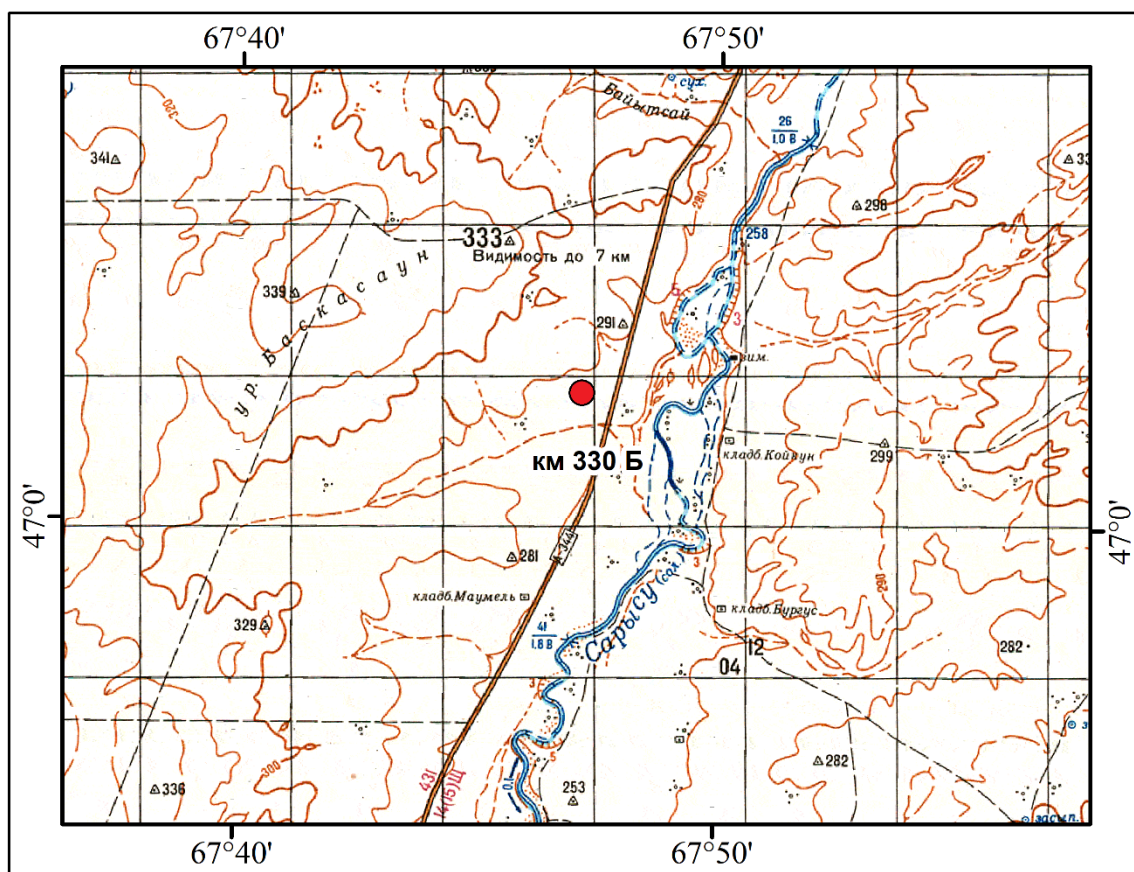

Условные обозначения

● - наименование и расположение участка  
км 330 Б

Рис.1.2 Обзорная карта расположения участка «км 330Б».  
Масштаб 1:200 000

Улытауский район занимает западную часть Улытауской области, на его территории находятся города Жезказган и Сатпаев. Административным центром Улытауского района является село Улытау. Территория района составляет 121,9 тыс. км<sup>2</sup>. Улытауский район является самым большим по территории районом Казахстана, превосходя по площади 6 областей страны.

В региональном плане район работ располагается на юго-западной окраине Центрального Казахстана, в пределах северо-западной части Жезказганской впадины.

Ближайшим населенным пунктом является село Талап (в 45 км на СВ). Более крупным близ расположенным населенным пунктом является административный центр Улытауской области - город Жезказган, находящийся в 60 км на север от участка. Основой экономики района является хорошо развитая горнорудная промышленность. Меньшее значение имеет сельское хозяйство, в котором ведущим является животноводство.

На территории района имеются месторождения марганца (Жездинское), железа (Карсакпайское), кварца (Актас), нефти (Кумколь).

По дорожно-климатической классификации участок расположен в V зоне. Климатический район IIIA.

Сейсмическая опасность в баллах по шкале MSK-64 (К), в соответствии с СП РК 2.03-30-2017 территории проведения работ равна 5 (пяти) баллам.

Географические координаты угловых точек участков представлены ниже, в таблице 1.

Таблица 1.1

Географические координаты угловых точек участка

| № участка,<br>наименование<br>участка | №<br>угловых<br>точек | Координаты угловых точек    |                             | Площадь,<br>га |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
|                                       |                       | Северная широта             | Восточная долгота           |                |
|                                       |                       | градусы,<br>минуты, секунды | градусы, минуты,<br>секунды |                |
| 1                                     | 2                     | 3                           | 4                           | 5              |
| км 224                                | 1                     | 46° 12' 54,82"              | 67° 04' 03,00"              | 15,75          |
|                                       | 2                     | 46° 12' 49,92"              | 67° 04' 17,72"              |                |
|                                       | 3                     | 46° 12' 36,78"              | 67° 04' 08,65"              |                |
|                                       | 4                     | 46° 12' 41,67"              | 67° 03' 53,93"              |                |
| км 238                                | 1                     | 46° 18' 15,15"              | 67° 08' 25,22"              | 12,5           |
|                                       | 2                     | 46° 18' 00,74"              | 67° 08' 14,57"              |                |
|                                       | 3                     | 46° 17' 57,05"              | 67° 08' 24,96"              |                |
|                                       | 4                     | 46° 18' 11,46"              | 67° 08' 35,62"              |                |
| км 330 Б                              | 1                     | 47° 01' 58,00"              | 67° 47' 08,85"              | 16,8           |
|                                       | 2                     | 47° 01' 54,36"              | 67° 47' 26,14"              |                |
|                                       | 3                     | 47° 01' 45,21"              | 67° 47' 22,76"              |                |
|                                       | 4                     | 47° 01' 50,98"              | 67° 46' 49,53"              |                |
| км 252                                | 1                     | 46° 24' 24,36"              | 67° 15' 15,87"              | 6,75           |
|                                       | 2                     | 46° 24' 36,93"              | 67° 15' 37,30"              |                |
|                                       | 3                     | 46° 24' 26,94"              | 67° 15' 31,12"              |                |
|                                       | 4                     | 46° 24' 20,66"              | 67° 15' 20,41"              |                |
| км 264                                | 1                     | 46° 29' 13,77"              | 67° 21' 30,61"              | 21,66          |
|                                       | 2                     | 46° 29' 35,56"              | 67° 22' 02,06"              |                |
|                                       | 3                     | 46° 29' 30,37"              | 67° 22' 09,65"              |                |
|                                       | 4                     | 46° 29' 08,57"              | 67° 21' 38,22"              |                |
| <b>Итого: 5 участков</b>              |                       |                             |                             | <b>73,46</b>   |

## 1.2 Природные условия

### 1.2.1. Климат

Климат района резко континентальный, крайне засушливый, с большой контрастностью температур зимы и лета, дня и ночи и малым количеством осадков. Территория подвержена воздействию пыльных бурь.



Наиболее низкая среднемесячная температура ( $-15,3^{\circ}\text{C}$ ) бывает в январе, наиболее высокая ( $+28,4^{\circ}\text{C}$ ) в июле. Среднегодовое количество осадков составляет всего 200 мм. Распределение их в течение года неравномерное: минимум осадков приходится на ноябрь - март месяцы, максимум на апрель - октябрь. В отдельные летние месяцы количество осадков не превышает 5 мм.

Зима морозная, малоснежная, с частыми буранами и выюгами. Минимальная температура, отмеченная в январе, достигает  $-41^{\circ}\text{C}$ . Мощность снегового покрова не превышает 12-20 см.

Лето жаркое, с постоянными ветрами; максимальная температура  $+48^{\circ}\text{C}$ .

Согласно СНиП РК 2.04.01-2010 номер района по средней скорости ветра за зимний период – 5, номер района по давлению ветра – III.

Нормативная глубина промерзания грунта по СНиП РК 2.04.01-2010 - 158 мм (для глинистых грунтов), 193 мм (для песков мелких и пылеватых), 207 мм (для песков средних, крупных и гравелистых), 234 мм (для крупнообломочных грунтов).

### *1.2.2 Геоморфология и рельеф*

В региональном плане район работ располагается на юго-западной окраине Центрального Казахстана, в пределах северо-западной части Джезказганской впадины.

Рельеф района большей частью холмисто-равнинный. Абсолютные отметки территории изменяются от 365-371 м в северной ее части и до 240 м на юге. Поверхность территории, наряду с общим наклоном на юг, испытывает незначительное понижение к востоку.

### *1.2.3 Инженерно-геологическая характеристика*

В региональном плане район работ южной группы участков на территории листа L-42-XIV располагается в области на северо-западной окраине пустыни Бетпак-Дала, представляя собой ярусную равнину, характеризующуюся наличием зон пустынного и пустынно-степного ландшафта. Территория листа L-42-VIII, где находится участок «км 330 Б» располагается в зоне пластовых и цокольных равнин, примыкающих с юга к Центрально-Казахстанскому нагорью.

В геоморфологическом плане участки расположены в зоне обширной аккумулятивных и денудационных равнин Чу-Сарысульской впадины.

В геологическом строении территории, восточной части листа L-42-VIII и западной часть листа L-42-XIV, принимают участие палеозойские и кайнозойские образования, приведенные ниже.

**Пермская система.** *Нижний-верхний отделы.* Отложения пермской системы широко распространены на территории, располагаясь на севере и центральной части в виде отложений верхней подсвиты *кенгирской свиты* ( $P_{1-2}kn_2$ ). Отложения кенгирской свиты слагают обширную, полого погружающуюся в южном направлении депрессию, составляющую центральную часть Джезказганского синклинория. В составе толщи основную

роль играют мергели и известняки, среди которых довольно часто встречаются прослой песчаников и аргиллитов.

**Меловая система.** В пределах описываемой территории образования меловой системы представлены серией континентальных и, отчасти, лагунно-континентальных осадков, подразделенных на две толщи, которые датируются по спорово-пыльцевым комплексам сеноман-туроном и сеноном.

*Верхний отдел.*

*Сеноман-туронский ярусы нерасчлененные. ( $Cr_2cm-t$ ).* Отложения данного возраста на дневную поверхность не выходят, но они повсеместно вскрывались под сенонскими образованиями. Сложены глинами пестроцветными, часто аргиллитоподобными, иногда углистыми сероцветными с прослоями и линзами разномерных песков, глинистых и кварцитовидных песчаников, гравия, галечников.

*Сеноманский-сантонский ярусы ( $Cr_2cm-st$ ).* Отложения верхнего мела представлены чередованием серых и зеленых комковатых глин, серых и голубоватых алевроитов, пестроцветных каолинистых глин, разномерных песков, галечников и гравелитов. Местами прослеживаются прослой алевролитов и песчаников. В глинах, алевролитах, а иногда в песках встречаются плохо сохранившиеся растительные остатки и обломки окремненной древесины.

*Сенонский надъярус ( $Cr_2cn$ ).* Комплекс осадков сенонского надъяруса представлены континентальными образованиями пестрого вещественного состава. Пользуясь на территории листа L-42-XIV почти повсеместным распространением, они на значительной части ее выходят непосредственно на дневную поверхность. По правобережью р. Сарысу эти отложения обнажены в высоких береговых обрывах. Сложена толща преимущественно песками, содержащими линзы глин, как правило, пестроцветных, жирных и марких, иногда углистых, алевроитов, гравия, галечников, горизонты железистых и кварцитовидных песчаников.

**Палеогеновая система.** Палеогеновая система в пределах описываемого района представлена отложениями эоцена и олигоцена. В генетическом отношении среди них выделяются морские и континентальные осадки.

*Средний-верхний эоцен.*

*Тасаранская свита ( $Pg_2^2ts$ ).* Отложения данного возраста значительно широко распространены в пределах территории южной группы участков, на территории листа L-42-XIV. Залегают осадки на размытой поверхности пород сенонского надъяруса, а перекрываются с несогласием отложениями чеганской свиты и четвертичными образованиями. Сложена песками разномерными (преобладают средне- и мелкозернистые), кремнисто-кварцевыми глинами салатно-серыми и зеленовато-сизыми, пластинчатыми и плитчатыми. Часто глины содержат очень тонкие прослой алевроитов.

*Верхний эоцен – нижний олигоцен.*

*Чеганская свита ( $Pg_2^3 - Pg_3^1cg$ ).* Отложения чеганской свиты на изученной территории имеют ограниченное распространение. Малые по

площади локальные участки их распространения обусловлены интенсивными процессами денудации и ни в какой степени не зависят от первоначального положения морского бассейна. Залегают осадки чеганской свиты со слабовыраженным стратиграфическим несогласием на породах тасаранской свиты, а перекрываются с незначительным и неповсеместным размывом отложениями бетпакдалинской свиты. Представлена свита глинами зеленовато-серыми, в верхней части оливково зелеными, плотными, тонкоотмученными, часто гипсоносными и пиритовыми. В толще глин встречаются тонкие прослои и линзы алевроита, ярозита, гипса и желвакообразные мергелистые, известковистые конкреции.

*Бетпакдалинская свита ( $Pg_3^{2bt}$ ).* Отложения данной свиты представлены лишь на северо-западной части, а на территории листа L-42-VIII имеют довольно широкое и равномерное распространение. Сложены отложения красно-бурыми и бурыми, однообразными известковыми и загипсованными песчанистыми глинами с мергелистыми и марганцевыми стяжениями. Местами в толще глин содержатся тонкие прослои и линзы гравийных кварцевых песков и гнезда зеленой глины.

*Верхний олигоцен.*

*Асказансорская свита ( $Pg_3^{3as}$ ).* Верхнеолигоценовые образования пользуются очень незначительным развитием преимущественно на территории листа L-42-XIV. Сложена свита песками, гравием, галечниками, алевроитами. Включающими линзы глин и горизонты сливных песчаников. В песчано-гравийных отложениях часто содержатся обломки костей позвоночных животных.

*Чаграйская свита ( $Pg_3^{3chr}$ ).* Отложения чаграйской свиты широко распространены на территории L-42-VIII. Осадки представлены песками кварцевыми, светло-серыми, желтыми, разнозернистыми, гравелистыми, косослоистыми, с маломощными прослоями загипсованных глин, песчаников и галечников, местами сцементированных известково-глинистым цементом и конгломерат.

**Четвертичная система.**

*Нижний отдел ( $Q_1$ ).*

К нижнечетвертичным отложениям относятся аллювиальные образования третьей и четвертой террас в долине реки Сарысу, аллювиальные и аллювиально-делювиальные разности, выполняющие древние долины, и покровные элювиально-делювиальные суглинки с участием эолового материала на поверхности водораздела.

Представлены отложения песками, глинами и гравийно-галечниковыми осадками.

*Среднечетвертичный отдел ( $Q_2$ ).*

Аллювиальные отложения среднечетвертичного возраста слагают вторые надпойменные террасы рек и занимают незначительные площади в районе. Наибольшее развитие они получили в долине р. Сарысу. Представлены эти отложения песками, гравием и галечниками.

*Верхнечетвертичный - современный отделы нерасчлененные ( $Q_{3-4}$ ).*

Эти отложения слагают первые надпойменные террасы и прослеживаются в виде узких полос вдоль всех рек района. Представлены довольно однообразными, преимущественно суглинистыми осадками с незначительной примесью песчаного материала.

Участки строительных грунтов, имеют разные площади и конфигурацию. Ниже приводится краткая характеристика геологического строения участков:

- **Участок «км 224»**, находится в 0,4 км юго-восточнее по отношению к автодороге А17 «Жезказган-Караганда».

Конфигурация участка – четырехугольная, со сторонами 450X350м, площадью 15,75 га.

В геоморфологическом отношении участок располагается на равнинной, слабонаклонной на юго-восток поверхности. Относительные превышения до 2 метров (абсолютные отметки – 228-230 м).

Продуктивная толща участка сложена верхнечетвертичными аллювиальными ( $alQ_{III}$ ) суглинками, мощностью 0,5-1,4м, супесью твердой, мощностью 0,8-1,4м, и песками, мощностью 1,1-2,5м.

Перекрываются продуктивные образования почвенно-растительным слоем, мощностью 0,2 м.

Подстилающие породы не вскрыты. Грунтовые воды не вскрыты.

- **Участок «км 238»** находится в непосредственной близости к автодороге А17 «Жезказган-Караганда», в 90м юго-восточнее.

Конфигурация участка – четырёхугольная, со сторонами 250X500 м, площадью 12,5 га.

В геоморфологическом отношении участок располагается на равнинной слабонаклонной на северо-восток поверхности. Относительные превышения до 2 метров (абсолютные отметки – 247-249м).

Продуктивная толща участка сложена верхнечетвертичными аллювиальными ( $alQ_{III}$ ) отложениями в виде супеси, мощностью 1,1-3,8м и песка, мощностью 0,9-2,5м.

Перекрываются продуктивные образования почвенно-растительным слоем, мощностью 0,2м.

Подстилающие образования не вскрыты.

Грунтовые воды вскрыты на глубине 3,3-4,0м, ниже границы подсчёта ресурсов и запасов.

- **Участок «км 330Б»** находится на расстоянии 0,44 км восточнее автодороги А17 «Жезказган-Караганда», в 38км в восточном направлении от участка расположен пос. Мыйбулак.

Конфигурация участка – четырёхугольник, трапециевидной формы со сторонами 462-291X382-724м, площадью 16,8 га.

В геоморфологическом отношении участок располагается на слабонаклонной на юго-восток поверхности. Относительные превышения до 4 метров (абсолютные отметки – 265-269 м).

Сложен участок аллювиальными среднечетвертичными ( $alQ_{II}$ ) слабо окатанными песчано-гравийными отложениями (далее ПГС), вскрытой мощностью от 1,2 до 3,7 м (средняя – 3,18 м). Перекрываются ПГС суглинками, мощностью 1,3-4,8 м и супесью, мощностью 0,9-1,1 м, того же возраста что и ПГС.

Перекрываются продуктивные образования почвенно-растительным слоем, мощностью 0,2 м.

Подстилающие образования не вскрыты.

Грунтовые воды не встречены.

- **Участок «км 252»** находится в непосредственной близости к автодороге А17 «Жезказган-Караганда», в 50 м юго-восточнее.

Конфигурация участка – четырёхугольник неправильной формы, вытянутый углом в северо-восточном направлении, со сторонами 150-335Х600-300 м, площадью 6,75 га.

В геоморфологическом отношении участок располагается на всхолмлённой, слабонаклонной на северо-восток поверхности. Относительные превышения до 3 метров (абсолютные отметки – 204-207 м).

Продуктивная толща участка сложена верхнечетвертичными аллювиальными отложениями ( $alQ_{III}$ ): суглинком, мощностью 1,2-2,8 м; супесью, мощностью 1,6 м; песками, мощностью 0,3-1,5 м; продуктом выветривания коренных пород – дресвяным грунтом, мощностью 0,5 м.

Перекрываются продуктивные образования почвенно-растительным слоем, мощностью 0,2 м. Вмещающими породами представлены глины, вскрытые скважинами-1,4,5, мощностью 1,0-2,2 м.

Подстилающие образования не вскрыты.

Грунтовые воды вскрыты ниже контура подсчёта ресурсов и запасов на глубине 3,4-3,9 м.

- **Участок «км 264»** находится в непосредственной близости от автодороги А17 «Жезказган-Караганда», на расстоянии 150 м севернее.

Конфигурация участка – четырёхугольник, прямоугольной формы вытянутой в северо-восточном направлении, со сторонами 228Х950 м, площадью 21,66 га.

В геоморфологическом отношении участок располагается на равнинной поверхности. Относительные превышения до 2 метров (абсолютные отметки – 208-210 м).

Продуктивная толща участка сложена верхнечетвертичными аллювиальными ( $alQ_{III}$ ) отложениями в виде суглинка, мощностью 1,0-2,5 м, супеси, мощностью 1,1-1,5 м и песка, мощностью 0,4-1,4 м.

Перекрываются продуктивные образования почвенно-растительным слоем, мощностью 0,2 м.

Подстилающие образования не вскрыты.

Грунтовые воды вскрыты на глубине 2,5-3,3 м.



#### *1.2.4 Гидрографическая сеть и гидрогеологическая характеристика*

Гидросеть района представлена р. Сарысу, р. Кумола. Река Сарысу, на протяжении всего года сохраняет постоянный водоток; р. Кумола пересыхает уже в начале лета и в ее русле сохраняется лишь цепочка засоленных плесов. Боковыми притоками являются Кара Кенгир, Жезды и др., представляющие собой небольшие овраги, сухие большую часть года.

Воды реки Сарысу могут использоваться для технических нужд.

#### *1.2.5 Растительность и животный мир*

Особенности климата обусловили характерный для территории района облик полупустыни со сравнительно бедным растительным и животным миром.

Среди животных полупустынь особенно многочисленны зайцы, грызуны (суслики, тушканчики, песчанки, полевки, хомячки) и пресмыкающиеся. Из копытных встречаются мелкие антилопы, из хищных животных – волк.

Растительность отличается обедненным видовым составом, разреженностью и меньшей высотой травостоя. Преобладают засухоустойчивые многолетники (типчак, полынь, ковыль, изень, тарскен, кокпек и др.). В поймах рек растительность более богата и представлена вейником, чаевыми зарослями, камышом; из кустарников встречаются тальник, шиповник, жимолость.

#### *1.2.6 Почвенный покров*

Территория Ылытауского района входит в пустынно-полупустынную ландшафтную зону. Она характеризуется засушливым климатом, очень низким уровнем осадков и обеспеченностью водными ресурсами, большой величиной испаряемости, значительными суточными и годовыми колебаниями температуры воздуха и почвы, отсутствием постоянных поверхностных водотоков, накоплением в верхних горизонтах почвы солей, разреженным растительным покровом.

Почвенный покров представлен следующими видами:

- Бурые и серобурые почвы характеризуются небольшой мощностью профиля и значительным ее варьированием, грубо-скелетностью и щебнистостью, солонцеватостью и солончаковатостью.

- В наиболее пониженных местах распространены солончаки корковопухлыс и мокрые. На более повышенных местах, ближе к периферии долин, распространены солонцы и солончаковые солонцы.

- Значительные плоские понижения заняты такырами, которые представляют собой солонцы-солончаки пустынного образования. Растительность на них отсутствует, но встречаются и зарастающие их виды с изреженным травостоем биюргуна.

- Поймы пустынных рек характеризуются комплексами лугово-солончаковых почв с солонцами и солончаками. Растительный покров их состоит из злаков, различных солончаковых видов и солянок.

Почвообразующими породами являются главным образом суглинки, супеси и пески пролювиального, делювиального и аллювиального генезиса мощностью 0,15-0,30 м.

Глубина промерзания почво-грунтов – 1,70-2,0м, нормативная расчетная по СНиП РК 5.01-01-2002 глубина промерзания для суглинков и глин - 1,92м, обломочных песчано-дресвянисто-щебенистых грунтов – 2,38м, скальных грунтов - 2,54м.

#### *1.2.7 Характеристика почво-грунтов по группам пригодности для снятия и последующего использования потенциально-плодородного слоя почвы для биологической рекультивации*

Пригодность почво-грунтов для биологической рекультивации устанавливается на основании изучения их физико-химических и агрохимических свойств. Основанием для отнесения почв и почвообразующих пород к той или иной группе пригодности для произрастания растений служит комплекс физико-химических свойств, который определён ГОСТом 17.5.1.03.86 «Классификация вскрышных и вмещающих пород для биологической рекультивации земель».

При определении мощности снятия плодородного слоя почвы и потенциально плодородных пород необходимо руководствоваться ГОСТом 17.5.3.06-85 «Требования к определению нормы снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ», а также «Техническими указаниями по проведению почвенно-мелиоративных изысканий при проектировании, рекультивации земель, снятия, сохранения и использования плодородного слоя почв», Алма-Ата, 1993г.

На площади 5 участков была проведена агрохимическая оценка по основным показателям плодородия почв на основе следующих показателей: валовые формы азота, фосфора и калия, общее содержание гумуса, кислотность почвы pH и механическому составу.

Почвы не засолены, не солонцеваты, что отражено в отчетах по результатам геологоразведочных работ.

Содержание массовой доли гумуса в почвенном покрове составляет 1,65%, что по ГОСТ 17.5.3.06 для лесной и пустынной зоны определяет их как потенциально плодородный слой. Гумус является основным накопителем питательных веществ в почве. В нем содержится 95-99% всех запасов азота почвы, 60% фосфора, до 80% серы, значительная часть микроэлементов. Питательные вещества в гумусе находятся в недоступной для растений форме. Только после его разложения микроорганизмами питательные вещества переходят в доступную форму. От содержания гумуса зависит важнейшее свойство почвы - её поглотительная способность. Чем она выше, тем почва плодороднее и лучше удерживает питательные вещества.

Значения pH=7,29 что позволяет отнести почвы к щелочным.

Содержание общего азота составляет 0,154%. Азот - важнейший элемент минерального питания растений, обеспеченность которым во многом

определяют эффективность и устойчивость функционирования агроэкосистем. Потребность растений в азоте осуществляется в основном за счет почвенных запасов. Наиболее важными показателями, характеризующими азотный режим почвы, являются содержание общего азота, минеральных его форм, способность органических соединений азота к аммонификации и нитрификации.

По содержанию валовых форм фосфора и калия наблюдается аналогичная картина. По степени необходимости калий стоит в одном ряду с азотом и фосфором. Содержание валового фосфора ( $P_2O_5$ ) 0,104%.  $K_2O$  присутствует в значениях 2,892%.

Мех состав в допустимых пределах (содержание частиц менее 0,01 мм) – 30,383%.

Согласно проведенных анализов почвы участков, они соответствуют «Требованиям к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ», сероземам, с мощностью снятия плодородного слоя почвы (ПСП) 20-40 см.

- по результатам лабораторных исследований образцов почвенно-растительного слоя рекомендуется технический и биологический этапы рекультивации участков отработанных карьеров грунтовых резервов.

- Биологический этап рекультивации рассмотрен и приведен в главе 8.

## 2. ХАРАКТЕРИСТИКА НАРУШЕНИЙ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Вскрытие и разработка 5 участков общераспространенных полезных ископаемых будет производиться открытыми карьерами. Выделенный подсчетный блок совпадает с границами участков и разнится по качеству и количеству продуктивного слоя.

В геоморфологическом отношении участки располагаются на слабовсхолмленной поверхности, с относительными превышениями до 4 метров.

Продуктивная толща 4 участков сложена верхнечетвертичными аллювиальными ( $alQ_{III}$ ) суглинками, мощностью 0,5-1,4м, супесью твердой, мощностью 0,8-1,4м, и песками, мощностью 1,1-2,5м.

Участок «№330Б» сложен аллювиальными среднечетвертичными ( $aQ_{II}$ ) слабо окатанными песчано-гравийными отложениями (далее ПГС), вскрытой мощностью от 1,2 до 3,7м (средняя – 3,18 м). Перекрываются ПГС суглинками, мощностью 1,3-4,8м и супесью, мощность 0,9-1,1м, того же возраста что и ПГС.

По классификации пород по трудности экскавации грунтовые продуктивные образования относятся к I (суглинки, супеси, пески) - II (дресвяный, щебенистый грунты) категориям – без предварительного рыхления.

Породы вскрыши в пределах участка представлены слабо гумусированным супесчаным материалом с корнями травянистой растительности мощностью 0,2 м. Прослои и линзы пород внутренней вскрыши отсутствуют.

Предусматривается использование продуктивных образований при реконструкции автомобильной дороги республиканского значения «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ», участок «Кызылорда-Жезказган», лот 7,8 км 216-424, км 216-243 и км 243-266.

К горно-техническим особенностям отрицательного характера можно отнести маловероятное затопление карьеров в период выпадения атмосферных осадков и зимне-весенний период таяния, но это явление носит кратковременный характер и особого влияния не окажет на производительность карьеров.

В последующем они (породы вскрыши) будут использованы для рекультивации отработанных карьеров.

Полезное ископаемое не подвержено самовозгоранию и не пневмокониозоопасно.

Специального строительства производственных объектов при разработке месторождений не предусматривается.

Работы по производству вскрышных работ и добыче грунта на сосредоточенных грунтовых резервах не относятся к настоящему проекту, они приведены в соответствующих разделах планов горных работ, согласованных в установленном порядке. Добыча будет проведена в период 2025-2026 гг.

### **3. ЗАКЛЮЧЕНИЯ О НАПРАВЛЕНИИ РЕКУЛЬТИВАЦИИ**

Выбор направления рекультивации земель осуществляется с учетом следующих факторов:

- природных условий района (климат, почвы, геологические, гидрогеологические и гидрологические условия, растительность, рельеф), определяющих геосистемы или ландшафтные комплексы;
- агрохимических и агрофизических свойств пород и их смесей в отвалах;
- хозяйственных, социально-экономических и санитарно-гигиенических условий в районе размещения нарушенных земель;
- срока существования рекультивационных земель и возможности их повторных нарушений;
- технологии производства комплекса горных и рекультивационных работ;
- требований по охране окружающей среды;
- планов перспективного развития территории района горных выработок.

Анализ факторов, влияющих на выбор направления рекультивации земель, показывает применение сельскохозяйственного направления рекультивации, полностью отвечающее природным и социальным условиям, а также

целенаправленности рекультивации. В соответствии с «Инструкцией о разработке проектов рекультивации нарушенных земель» (приказ Министра сельского хозяйства РК №289 от 02.08.2023г), с актом обследования нарушенных земель и заданием на проектирование, утвержденным заказчиком, с учетом качественной характеристики нарушенных земель по техногенному рельефу, географических и социальных факторов настоящим проектом предусматривается технический и биологический этапы рекультивации. Направление рекультивации принято сельскохозяйственное – создание на нарушенных землях сельскохозяйственных угодий (пастбищ). После отработки участков и проведения рекультивационных мероприятий, рекультивируемая поверхность должна в течении мелиоративного периода зарости местной сое и жароустойчивой растительностью.

Анализ результатов лабораторных исследований образцов почвенно-растительного слоя, проведенных ТОО «Казахстанский научно-исследовательский институт почвоведения и агрохимии им. У.У.Успанова», позволяет сделать вывод о проведении технического и биологического этапов рекультивацииотработанных карьеров.

#### **4. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ**


Снятие пород вскрыши, их складирование во временный отвал на отработанной площади карьеров, будет произведено в процессе добычных работ.

Настоящим проектом предусматривается проведение технического и биологического этапов рекультивации нарушенной территории 5 участков в зависимости от горно-техническихусловий отработки (рис.4.1).

Дополнительное снятие почвенно-растительного слоя на площади, вовлекаемой при выполаживании бортов карьеров до 10°, срезки грунта при выполаживании бортов карьера до 10°, с целью дальнейшего их использования (как и снятого ранее в процессе добычи) для рекультивации; равномерное перемещение по площади карьеров пород вскрыши, их планировка и прикатывание для предотвращения эрозионных процессов, а также рекомендуемое внесение удобрений в нарушенную почву и посев многолетних трав.


Рекомендуемый посев многолетних трав подразумевает: вспашку, рыхление, посев и прикатывание посевов. Современные сельскохозяйственные агрегаты позволяют произвести все вышеприведенные работы качественно и в короткие сроки.

1. Снятие вскрыши с площади выполаживания

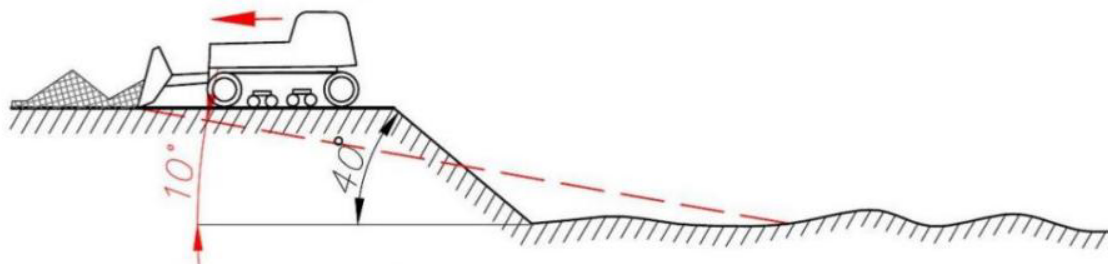


Перемещение пород вскрыши, бульдозером в бурты, с площади выполаживания бортов отработанного карьера.

2. Выполаживание




Выполаживание бульдозером бортов карьера до угла не более  $10^\circ$

3. Нанесение пород вскрыши




Перемещение пород вскрыши из временного породного отвала на дно и откосы отработанного карьера

4. Планировка поверхности



Планировка бульдозером пород вскрыши

5. Уплотнение и Прикатывание



Уплотнение и прикатывание грунта, катком дорожным вибрационным, поверхности откосов и дна карьера

Рис.4.1 Схема рекультивации карьеров грунта(до  $10^\circ$ )

## 5. ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАП РЕКУЛЬТИВАЦИИ

Общая площадь технической рекультивации земель, нарушаемых при промышленной разработке 5участков ОПИ составляет 73,46 га.

Объемы работ по техническому этапу рекультивации участков рыхлых образований (пески, супеси, суглинки, щебенистый грунт) напрямую зависят от: 1) объема вскрышных работ сформированных в процессе добычи (формирование отвалов вскрышных работ не входят в настоящий проект); 2) мощности вскрыши; 3) мощности продуктивных образований (глубины отработки); 4) периметра карьеров; 5) ширины полосы выполаживания бортов карьера до угла 10°.

Вычисление параметров участков произведено графическим способом.

При вычислении планируемых объемов использовались производные от формул площади треугольника в зависимости от мощности грунтов при выполаживании бортов карьера с 35° до 10° и основные параметры карьеров, а именно:

$$B = H \frac{\operatorname{tg}(B) - \operatorname{tg}(B)}{2\operatorname{tg}(B) \times \operatorname{tg}(B)}$$

$$B = 2,12H;$$

$$S_B = P \times B;$$

$$V_B = P \times B \times h;$$

$$S_{TB} = H^2 \frac{\operatorname{tg}(B) - \operatorname{tg}(B)}{8\operatorname{tg}(B) \times \operatorname{tg}(B)}$$

$$S_{TB} = 0,53H^2;$$

$$V_{Gr} = 0,53P \times H^2;$$

$$S = S_0 + S_B;$$

$$V = V_0 + V_B, \text{ где:}$$

P – периметр карьера;

B – ширина полосы выполаживания;

h – средняя мощность вскрыши;

H – средняя мощность грунта;

S<sub>0</sub> – площадь карьера;

S<sub>B</sub> – площадь полосы выполаживания;

S – общая площадь рекультивации;

V<sub>0</sub> – объем вскрышных пород, сформированный на этапе добычи;

V<sub>B</sub> – объем вскрышных пород, сформированный с полосы выполаживания;

V – общий объем вскрышных пород, участвующий в рекультивации;

V<sub>Gr</sub> – объем грунта, полученный при выполаживании бортов карьера до угла 10°.

Результаты вычислений приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1

Сводная таблица вычисления объемов работ связанных с рекультивацией участков

| п/п                     | Номер участка | Площадь участка<br>$S_0$ , тыс.м <sup>2</sup> | ППСП<br>по участку |                                               | Периметр участка,<br>$P$ , м | М-ть грунта,<br>$H$ , м | Ширина вылож.<br>$B=2,24 \cdot H$ , м | Площадь доп.<br>вскрыши<br>$S_B=P \cdot B$ , тыс.м <sup>2</sup> | Объем доп.<br>вскрыши<br>$V_B=P \cdot B \cdot H$ , т.м <sup>3</sup> | Площадь тр-ка<br>вылож.<br>$S_{TB}=0,56 \cdot H^2$ , м <sup>2</sup> | Объем всего                                                     |                                           |                                           |
|-------------------------|---------------|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                         |               |                                               | М-сть<br>$h$ , м   | Объем<br>$V_0=S_0 \cdot h$ , т.м <sup>3</sup> |                              |                         |                                       |                                                                 |                                                                     |                                                                     | Срезки<br>грунта<br>$V_{гр}=0,56P \cdot H^2$ , т.м <sup>3</sup> | Вскрыши<br>$V=V_0+V_B$ , т.м <sup>3</sup> | Площадь<br>$S_0+S_B$ , тыс.м <sup>2</sup> |
| 1                       | 2             | 3                                             | 4                  | 5                                             | 6                            | 7                       | 8                                     | 9                                                               | 10                                                                  | 11                                                                  | 12                                                              | 13                                        | 14                                        |
| <b>Улытауский район</b> |               |                                               |                    |                                               |                              |                         |                                       |                                                                 |                                                                     |                                                                     |                                                                 |                                           |                                           |
| 1                       | «км 224»      | 157,5                                         | 0,2                | 31,50                                         | 1600                         | 3,80                    | 8,06                                  | 12,899                                                          | 2,58                                                                | 7,66                                                                | 12,25                                                           | 34,08                                     | 170,399                                   |
| 2                       | «км 238»      | 125,0                                         | 0,2                | 25,00                                         | 1500                         | 3,40                    | 6,7                                   | 10,045                                                          | 2,01                                                                | 5,69                                                                | 8,54                                                            | 27,01                                     | 135,045                                   |
| 3                       | «км 330Б»     | 168,0                                         | 0,2                | 33,60                                         | 1859                         | 4,80                    | 10,18                                 | 18,931                                                          | 3,79                                                                | 12,22                                                               | 22,72                                                           | 37,39                                     | 186,931                                   |
| 4                       | «км 252»      | 67,5                                          | 0,2                | 70,2*                                         | 1386                         | 2,64                    | 5,6                                   | 7,763                                                           | 1,55                                                                | 3,7                                                                 | 5,12                                                            | 71,75                                     | 75,263                                    |
| 5                       | «км 264»      | 216,6                                         | 0,2                | 43,32                                         | 2356                         | 2,48                    | 4,88                                  | 11,508                                                          | 2,30                                                                | 3,03                                                                | 7,14                                                            | 45,62                                     | 228,108                                   |
| <b>Итого</b>            |               | <b>73,46</b>                                  |                    | <b>203,62</b>                                 |                              |                         |                                       | <b>61,146</b>                                                   | <b>12,23</b>                                                        |                                                                     | <b>55,77</b>                                                    | <b>215,85</b>                             | <b>795,746</b>                            |

Примечание:

\*в том числе некондиционные глины (ТМО) - 56,7тыс.м<sup>3</sup>



## 6. СРОКИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. ПОТРЕБНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ И МЕХАНИЗМАХ

Технологические схемы производства работ выбирались с учетом факторов, влияющих на производительность конкретного комплекса машин и механизмов, обеспечивающие высокую интенсивность и оптимальные сроки рекультивационных работ. Сменная производительность бульдозера при планировочных работах принята по технической характеристике механизма.

В связи с небольшими объемами работ по перемещению грунта и планировке, и учитывая, точно технический этап рекультивации планируется провести в теплый период года, календарный план рекультивационных мероприятий не составлялся.

Для выполнения предусмотренных выше объёмов, рекомендуется горно-транспортное оборудование, *соответствующее требованиям безопасности согласно Закону РК «О безопасности машин и оборудования», подтвержденных сертификатами или декларацией соответствия Таможенного союза и имеющее разрешение к применению на территории Казахстана.*

При производстве работ по техническому этапу рекультивации будут использоваться: бульдозер Т-130 и каток дорожный вибрационный CLG-616.

Рекомендуемая техника (рис.6.1-6.2), имеется в распоряжении Филиала Компании с ограниченной ответственностью «STECOLCORPORATION» в РК - организации ведущей реконструкцию автомобильной дороги, являющаяся Недропользователем объектов настоящего проекта.

Сменная производительность бульдозера в плотном теле при разработке грунта с перемещением определяется согласно «Нормам технологического проектирования предприятий промышленности нерудных строительных материалов» Приложение V «Методика расчета производительности бульдозеров»:

$$P_{Б.СМ} = \frac{60 \cdot T_{СМ} \cdot V \cdot K_{У} \cdot K_{О} \cdot K_{П} \cdot K_{В}}{K_{Р} \cdot T_{Ц}}, \text{ м}^3/\text{см}$$

Где V – объем грунта в разрыхленном состоянии, перемещаемый отвалами бульдозера, м<sup>3</sup>;

$$V = \frac{l \cdot h \cdot a}{2}, \text{ м}^3$$

l – длина отвала бульдозера, м;

h – высота отвала бульдозера, м;

a – ширина призмы перемещаемого грунта, м;

$$a = \frac{h}{\text{tg} \delta}, \text{ м}$$

δ – угол естественного откоса грунта (30 – 40°);

$$\dot{a} = \frac{1,14}{0,83} = 1,37$$

$$V = \frac{4,1 \cdot 1,14 \cdot 1,37}{2} = 3,2 \text{ м}^3$$

$K_y$  – коэффициент, учитывающий уклон на участке работы бульдозера, 0,95;

$K_o$  – коэффициент, учитывающий увеличение производительности при работе бульдозера с откылками, 1,15;

$K_{\Pi}$  – коэффициент, учитывающий потери породы в процессе ее перемещения, 0,9;

$K_B$  – коэффициент использования бульдозера во времени, 0,8;

$K_P$  – коэффициент разрыхления грунта, 1,25;

$T_{\Pi}$  – продолжительность одного цикла, с;

$$T_{\Pi} = \frac{l_1}{v_1} + \frac{l_2}{v_2} + \frac{(l_1 + l_2)}{v_3} + t_{\Pi} + 2t_P, \text{ с}$$

$l_1$  – длина пути резания грунта, м;

$v_1$  – скорость перемещения бульдозера при резании грунта, м/с;

$l_2$  – расстояние транспортирования грунта, м;

$v_2$  – скорость движения бульдозера с грунтом, м/с;

$v_3$  – скорость холостого (обратного) хода, м/с;

$t_{\Pi}$  – время переключения скоростей, с;

$t_P$  – время одного разворота трактора, с.

Значения необходимых величин для расчета продолжительности цикла бульдозера сведены в таблицу 6.1.

Таблица 6.1

Значения расчетных величин

| Наименование грунта | Мощность бульдозера, кВт(л.с.) | Элементы $T_{\Pi}$ |       |       |       |           |       |
|---------------------|--------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-----------|-------|
|                     |                                | $l_1$              | $v_1$ | $v_2$ | $v_3$ | $t_{\Pi}$ | $t_P$ |
| ППС                 | 120(160)                       | 7                  | 0,67  | 1,0   | 1,5   | 9         | 10    |

$$T_{\Pi} = \frac{7}{0,67} + \frac{16}{1} + \frac{(7+16)}{1,5} + 9 + 2 \cdot 10 = 70,8 \text{ с}$$

$$P_{Б.см} = \frac{60 \cdot 480 \cdot 3,2 \cdot 0,95 \cdot 1,15 \cdot 0,9 \cdot 0,8}{1,25 \cdot 70,8} = 820 \text{ м}^3 / \text{смену}$$

Таким образом сменная производительность бульдозера в плотном теле при производстве дополнительной вскрыши (12,23тыс.м<sup>3</sup>), при выполаживании бортов карьера до 10° (55,77тыс.м<sup>3</sup>) и нанесении пород вскрыши с планировкой поверхности (215,85тыс.м<sup>3</sup>) будет составлять  $P_{Б.см} = 820 \text{ м}^3 / \text{см}$ . Затраты маш/см бульдозера на перемещение 283850м<sup>3</sup> породы составят 346,15маш/см. Следовательно, минимальное количество

бульдозеров для перемещения породы в течение 3 месяца, при односменной работе составит 6 единицы.

Производительность катка определяется по формуле:

$$Пк = \frac{Lв * V * (Tс - Tпз)}{Кпр},$$

где:  $Lв$  – ширина вальца колебания – 2,1 м.;

$V$  – скорость катка – 3,0 км/ч;

$Tс$  - продолжительность смены – 8 часов;

$T пз.$  – время на подготовительно-заключительные операции – 1 час;

$Кпр$  – количество проходов в одной заходке – 2.

$$Пк = \frac{2,1 * 3000 * (8 - 1)}{2} = 22050 \text{ м}^2/\text{см}.$$

$$\text{Количество маш/смен} = \frac{S \text{ прикатывания}}{Пк} = \frac{795746,46}{22050} = 36,09 \text{ маш/см}.$$

Принимая во внимание срок проведения технического этапа рекультивации 3 месяц (66 рабочих дней), необходимое количество: бульдозеров составит 6 единицы, при односменной работе, а катков – 1 единица. При изменении сроков производства работ, количество единиц техники соответственно изменится.

Исходя из стоимости машино-смены используемой техники, учитывающей заработную плату машиниста (6 разряд), стоимость ГСМ и расходных материалов, амортизацию оборудования и др., затраты составляют на: бульдозер (Т-130)– 5,847тыс.тенгемаш/час; каток дорожный вибрационный (CLG-616) – 4,460 тыс.тенге маш/час (таблицы 6.6-6.7).

В таблице 6.2 - сметная стоимость технического этапа рекультивации по видам оборудования, в таблице 6.3 - приводятся объемы технического этапа рекультивации, в таблице 6.4 - сметная стоимость технического этапа рекультивации.

Таблица 6.2

Таблица сметной стоимости технического этапа рекультивации по видам оборудования

| Наименование транспорта | Потребное число маш/см | Стоимость маш/часа, тыс. тенге | Стоимость маш/смены, тыс. тенге | Затраты, тыс. тенге |
|-------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| 1                       | 2                      | 3                              | 4                               | 5                   |
| бульдозер               | 346,15                 | 5,847                          | 46,78                           | 16192,43            |
| каток                   | 36,09                  | 4,460                          | 35,68                           | 1287,67             |
| <b>ИТОГО</b>            |                        |                                |                                 | 17480,1             |

Таблица 6.3

## Объемы технического этапа рекультивации

| №<br>п/п | Название,<br>участка | Снятие<br>вскрыши         |       | Выпол-<br>живание<br>бортов до 10° |       | Нанесение<br>пород<br>вскрыши с<br>планировкой |        | Уплотнение и<br>прикатывание |       | Всего, маш/см |       |
|----------|----------------------|---------------------------|-------|------------------------------------|-------|------------------------------------------------|--------|------------------------------|-------|---------------|-------|
|          |                      | объем<br>т.м <sup>3</sup> | м/см  | объем<br>т.м <sup>3</sup>          | м/см  | объем<br>т.м <sup>3</sup>                      | м/см   | объем<br>т.м <sup>2</sup>    | м/см  | бульдозер     | каток |
| 1        | 2                    | 3                         | 4     | 5                                  | 6     | 7                                              | 8      | 9                            | 10    | 11            | 12    |
| 1        | км 224               | 2,58                      | 3,15  | 12,25                              | 14,94 | 34,08                                          | 41,56  | 170399                       | 7,73  | 59,65         | 7,73  |
| 2        | км 238               | 2,01                      | 2,45  | 8,54                               | 10,41 | 27,01                                          | 32,94  | 135045                       | 6,12  | 45,80         | 6,12  |
| 3        | км330Б               | 3,79                      | 4,62  | 22,72                              | 27,70 | 37,39                                          | 45,59  | 186931                       | 8,48  | 77,91         | 8,48  |
| 4        | км 252               | 1,55                      | 1,89  | 5,12                               | 6,25  | 71,75                                          | 87,50  | 75263                        | 3,41  | 95,64         | 3,41  |
| 5        | км 264               | 2,30                      | 2,81  | 7,14                               | 8,70  | 45,62                                          | 55,64  | 228108                       | 10,35 | 67,14         | 10,35 |
| Итого    |                      | 12,23                     | 14,91 | 55,77                              | 68,01 | 215,85                                         | 263,23 | 795746,46                    | 36,09 | 346,15        | 36,09 |

Таблица 6.4

## Таблица сметной стоимости технического этапа рекультивации

| №<br>п/п | Наимено-<br>вание<br>участка | Пло-<br>щадь,<br>га | Количество<br>машино/смен |       | Затраты, тыс. тенге |         |         |         |
|----------|------------------------------|---------------------|---------------------------|-------|---------------------|---------|---------|---------|
|          |                              |                     | Буль-<br>дозер            | Каток | Буль-<br>дозер      | Каток   | Итого   | На 1 га |
| 1        | 2                            | 3                   | 4                         | 5     | 6                   | 7       | 8       | 9       |
| 1        | км 224                       | 15,75               | 59,65                     | 7,73  | 2790,43             | 275,8   | 3066,23 | 194,68  |
| 2        | км 238                       | 12,5                | 45,80                     | 6,12  | 2142,52             | 218,36  | 2360,88 | 188,87  |
| 3        | км 330Б                      | 16,8                | 77,91                     | 8,48  | 3644,63             | 302,56  | 3947,19 | 234,95  |
| 4        | км 252                       | 6,75                | 95,64                     | 3,41  | 4474,04             | 121,66  | 4595,7  | 680,84  |
| 5        | км 264                       | 21,66               | 67,14                     | 10,35 | 3140,81             | 369,29  | 3510,1  | 162,05  |
| Итого    |                              | 73,46               | 346,15                    | 36,09 | 16192,43            | 1287,67 | 17480,1 | 237,95  |

## Бульдозер Т-130



### Технические характеристики

|                                                                                             |                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Марка двигателя                                                                             | Д160                                                            |
| Тип двигателя                                                                               | Четырехтактный<br>дизельный, с<br>турбонаддувом                 |
| мощность, кВт (л.с.)                                                                        | 117,7 (160)                                                     |
| Масса тракторов т-130, кг                                                                   | 14320                                                           |
| Номинальная эксплуатационная мощность<br>двигателя, кВт (л.с.)                              | 117,7 (160)                                                     |
| Удельный расход топлива при номинальной<br>эксплуатационной мощности, г/кВт*ч (г/э. л.с.-ч) | 244,3 (180)                                                     |
| Применяемое топливо для:                                                                    |                                                                 |
| ..основного двигателя                                                                       | дизельное                                                       |
| ..пускового двигателя                                                                       | смесь бензина А-72<br>или А-76 с моторным<br>маслом дизеля 20:1 |
| Вместимость топливного бака, л                                                              | 290                                                             |
| Колея, мм                                                                                   | 1880                                                            |
| Продольная база, мм                                                                         | 2478                                                            |
| Дорожный просвет, мм                                                                        | 415                                                             |
| Ширина башмаков, мм                                                                         | 500                                                             |
| Удельное давление на почву с задним<br>механизмом навески, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )       | 0,05 (0,5)                                                      |
| Габаритные размеры, мм                                                                      | 5193 X 2475 X 3085                                              |
| Масса конструктивная, кг                                                                    | 14320                                                           |

Рис.6.1 Техническая характеристика бульдозера Т-130

## Каток дорожный вибрационный CLG-616



### Технические характеристики

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Рабочий вес, кг                     | 16000               |
| Нагрузка на валец, кг               | 8300                |
| Статическая линейная нагрузка, Н/см | 7700                |
| Нагрузка на заднюю ось, кг          | 375                 |
| Скорость передвижения, км/ч         | 2,6-5,2-11          |
| Диаметр вальца, мм                  | 1535                |
| Ширина вальца, мм                   | 2130                |
| Частота, Гц                         | 30                  |
| Амплитуда, мм                       | 1,9/1,0             |
| Модель двигателя                    | Yuchai YC6B150Z-T11 |
| Мощность, кВт/об.мин.               | 112                 |
| Тип охлаждения двигателя            | водяное             |
| Емкость топливного бака, л          | 285                 |

Рис. 6.2 Техническая характеристика катка дорожного вибрационного CLG-616

## Калькуляция стоимости 1 маш/часа работы

| №<br>п/п | Наименование затрат                                     | Бульдозер Т-130      |                            |
|----------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
|          |                                                         |                      | сумма<br>затрат<br>(тенге) |
| <b>1</b> | <b>Амортизационные отчисления</b>                       |                      |                            |
|          | <i>первоначальная стоимость -</i>                       | <i>10,250,100,00</i> |                            |
|          | <i>процент амортизационных отчислений -</i>             | <i>10%</i>           |                            |
|          | <i>директивная норма выработки -</i>                    | <i>2,805</i>         |                            |
|          |                                                         |                      | <b>645</b>                 |
| <b>2</b> | <b>Заработная плата</b>                                 |                      |                            |
|          | <i>коэффициент перехода в текущие цены (2405 : 775)</i> |                      |                            |
|          | <i>1,06 x 225 x 3,103</i>                               |                      | <b>740</b>                 |
| <b>3</b> | <b>Затраты на топливо</b>                               |                      |                            |
|          | <i>норма расхода дизтоплива -</i>                       | <i>16</i>            |                            |
|          | <i>стоимость 1 л.</i>                                   | <i>192</i>           |                            |
|          |                                                         |                      | <b>3,072</b>               |
| <b>4</b> | <b>Затраты на смазочные материалы</b>                   |                      |                            |
|          | <i>моторное масло</i>                                   | <i>2,8</i>           |                            |
|          | <i>стоимость 1 л.</i>                                   | <i>337,5</i>         |                            |
|          | <i>трансмиссионное масло</i>                            | <i>0,4</i>           |                            |
|          | <i>стоимость 1 л.</i>                                   | <i>598,21</i>        |                            |
|          | <i>спецмасло</i>                                        | <i>0,15</i>          |                            |
|          | <i>стоимость 1 л.</i>                                   | <i>321,43</i>        |                            |
|          | <i>пласт.смазка</i>                                     | <i>0,35</i>          |                            |
|          | <i>стоимость 1 кг.</i>                                  | <i>535,71</i>        |                            |
|          |                                                         |                      | <b>213</b>                 |
| <b>5</b> | <b>Затраты на гидравлическую жидкость</b>               |                      |                            |
|          | <i>расход гидравлической жидкости</i>                   | <i>0,05</i>          |                            |
|          | <i>стоимость 1 л</i>                                    | <i>348,21</i>        | <b>17</b>                  |
| <b>6</b> | <b>Затраты на замену быстроизнашивающихся частей</b>    |                      |                            |
|          | <i>процент на замену б/и частей -</i>                   | <i>3%</i>            |                            |
|          | <i>3% x 7 918 627,39 : 1 850</i>                        |                      | <b>128</b>                 |
| <b>7</b> | <b>Затраты на ремонт и ТО</b>                           |                      |                            |
|          | <i>процент затрат на ремонт -</i>                       | <i>8%</i>            |                            |
|          | <i>8% x 7 918 627,39 : 1 850</i>                        |                      | <b>292</b>                 |
| <b>8</b> | <b>Накладные расходы</b>                                |                      |                            |
|          | <i>100% заработной платы</i>                            |                      | <b>740</b>                 |
|          | <b>Итого:</b>                                           |                      | <b>5,847</b>               |

Таблица 6.6

## Калькуляция стоимости 1 маш/часа работы

| №<br>п/п | Наименование затрат                                     | Каток CLG616,<br>16 тн |                            |
|----------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
|          |                                                         |                        | сумма<br>затрат<br>(тенге) |
| <b>1</b> | <b>Амортизационные отчисления</b>                       |                        |                            |
|          | <i>первоначальная стоимость -</i>                       | 6,516,750,00           |                            |
|          | <i>процент амортизационных отчислений -</i>             | 10%                    |                            |
|          | <i>директивная норма выработки -</i>                    | 1,785                  |                            |
|          |                                                         |                        | <b>410</b>                 |
| <b>2</b> | <b>Заработная плата</b>                                 |                        |                            |
|          | <i>коэффициент перехода в текущие цены (2405 : 775)</i> |                        |                            |
|          | <i>1,06 x 225 x 3,103</i>                               |                        | <b>740</b>                 |
| <b>3</b> | <b>Затраты на топливо</b>                               |                        |                            |
|          | <i>норма расхода дизтоплива -</i>                       | 10                     |                            |
|          | <i>стоимость 1 л.</i>                                   | 192                    |                            |
|          |                                                         |                        | <b>1,920</b>               |
| <b>4</b> | <b>Затраты на смазочные материалы</b>                   |                        |                            |
|          | <i>моторное масло</i>                                   | 2,8                    |                            |
|          | <i>стоимость 1 л.</i>                                   | 337,5                  |                            |
|          | <i>трансмиссионное масло</i>                            | 0,4                    |                            |
|          | <i>стоимость 1 л.</i>                                   | 598,21                 |                            |
|          | <i>спец масло</i>                                       | 0,15                   |                            |
|          | <i>стоимость 1 л.</i>                                   | 321,43                 |                            |
|          | <i>пласт.смазка</i>                                     | 0,35                   |                            |
|          | <i>стоимость 1 кг.</i>                                  | 535,71                 |                            |
|          |                                                         |                        | <b>213</b>                 |
| <b>5</b> | <b>Затраты на гидравлическую жидкость</b>               |                        |                            |
|          | <i>расход гидравлической жидкости</i>                   | 0,05                   |                            |
|          | <i>стоимость 1 л</i>                                    | 348,21                 | <b>17</b>                  |
| <b>6</b> | <b>Затраты на замену быстроизнашивающихся частей</b>    |                        |                            |
|          | <i>процент на замену б/и частей -</i>                   | 3%                     |                            |
|          | <i>3% x 7 918 627,39 : 1 850</i>                        |                        | <b>128</b>                 |
| <b>7</b> | <b>Затраты на ремонт и ТО</b>                           |                        |                            |
|          | <i>процент затрат на ремонт -</i>                       | 8%                     |                            |
|          | <i>8% x 7 918 627,39 : 1 850</i>                        |                        | <b>292</b>                 |
| <b>8</b> | <b>Накладные расходы</b>                                |                        |                            |
|          | <i>100% заработной платы</i>                            |                        | <b>740</b>                 |
|          | <b>Итого:</b>                                           |                        | <b>4,460</b>               |



## **7. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТЗЕМЛЕРОЙНЫМИ МАШИНАМИ**

Производство земляных работ требует строго соблюдения правил техники безопасности. Несчастные случаи при производстве земляных работ обычно относятся к разряду тяжелых. По законам Республики Казахстан администрация несет уголовную ответственность за несоблюдение этих правил.

Ниже приводятся важнейшие общие правила техники безопасности при производстве горных работ на объекте.

Вся самоходная техника (бульдозеры, погрузчики и др.) должна иметь технические паспорта, содержащие их основные технические и эксплуатационные характеристики, укомплектована средствами пожаротушения, знаками аварийной остановки, медицинскими аптечками, упорами (башмаками) для подкладывания под колеса (для колесной техники), звуковым прерывистым сигналом при движении задним ходом, проблесковыми маячками желтого цвета, установленными на кабине, двумя зеркалами заднего вида, ремонтным инструментом, предусмотренным заводом-изготовителем.

На линию транспортные средства могут выпускаться только при условии, если все их агрегаты и узлы, обеспечивающие безопасность движения, а также безопасность других работ, предусмотренных технологией применения, находятся в технически исправном состоянии.

Во всех случаях при движении транспортного средства задним ходом должен подаваться звуковой сигнал.

Не допускается движение самоходной техники (бульдозеров, погрузчиков и др.) по призме возможного обрушения уступа.

Формирование предохранительного вала на перегрузочном пункте производится в соответствии с паспортом перегрузочного пункта, при этом движение бульдозера должно производиться только ножом вперед.

Не разрешается оставлять самоходную технику с работающим двигателем и поднятым ножом или ковшом, а при работе - направлять трос, становиться на подвесную раму, нож или ковш, а также работа техники поперек крутых склонов при углах, не предусмотренных инструкцией завода-изготовителя.

Не допускается эксплуатация бульдозера при отсутствии или неисправности блокировки, исключающей запуск двигателя при включенной коробке передач, или устройства для запуска двигателя из кабины.

Для ремонта, смазки и регулировки техники, они должны быть установлены на горизонтальной площадке, двигатель выключен, а нож или ковш опущен на землю или специально предназначенную опору.

В случае аварийной остановки самоходной техники на наклонной плоскости должны быть приняты меры, исключающие ее самопроизвольное движение под уклон.

Не допускается находиться под поднятым ножом или ковшем самоходной техники.

Для осмотра ножа или ковша снизу его необходимо опустить на надежные подкладки, а двигатель выключить.

Максимальные углы откоса забоя при работе бульдозера не должны превышать пределов, установленных заводской инструкцией по эксплуатации.

Расстояние от края гусеницы бульдозера или передней оси погрузчика (колесного бульдозера) до бровки откоса определяется с учетом горно-геологических условий и должно быть занесено в паспорт ведения работ в забое (отвале) или перегрузочном пункте.

План и профиль автомобильных дорог должны соответствовать действующим строительным нормам и правилам.

Земляное полотно для дорог должно быть возведено из прочных грунтов. Не допускается применение для насыпей дёрна и растительных остатков.

Ширина проезжей части внутрикарьерных дорог и продольные уклоны устанавливаются проектом с учетом требований действующих строительных норм и правил, исходя из размеров автомобилей.

Временные въезды в траншеи должны устраиваться так, чтобы вдоль них при движении транспорта оставался свободный проход шириной не менее 1,5м с обеих сторон.

Радиусы кривых в плане и поперечные уклоны автодорог предусматриваются с учетом действующих строительных норм и правил.

В особо стесненных условиях на внутрикарьерных и отвальных дорогах величину радиусов кривых в плане допускается принимать в размере не менее двух конструктивных радиусов разворотов транспортных средств по переднему наружному колесу - при расчете на одиночный автомобиль и не менее трех конструктивных радиусов разворота - при расчете на тягачи с полуприцепами.

Проезжая часть автомобильной дороги внутри контура карьера (кроме забойных дорог) должна соответствовать действующим строительным нормам и правилам и быть ограждена от призмы возможного обрушения породным валом или защитной стенкой. Высота породного вала принимается не менее половины диаметра колеса наибольшего по грузоподъемности эксплуатируемого на карьере автомобиля. Вертикальная ось, проведенная через вершину породного вала, должна располагаться вне призмы обрушения.

Расстояние от внутренней бровки породного вала (защитной стенки) до проезжей части должно быть не менее 0,5 диаметра колеса автомобиля максимальной грузоподъемности, эксплуатируемого в карьере.

В зимнее время автодороги должны систематически очищаться от снега и льда и посыпаться песком, шлаком, мелким щебнем или обрабатываться специальным составом.

Находящиеся в эксплуатации карьерные автомобили должны быть укомплектованы:

- средствами пожаротушения;
- знаками аварийной остановки;
- медицинскими аптечками;
- упорами (башмаками) для подкладывания под колеса;
- звуковым прерывистым сигналом при движении задним ходом;
- двумя зеркалами заднего вида;
- средствами связи.

На линию автомобили могут выпускаться только при условии, если все их агрегаты и узлы, обеспечивающие безопасность движения, а также безопасность других работ, предусмотренных технологией применения автотранспорта, находятся в технически исправном состоянии. Они должны также иметь необходимый запас горючего и комплект инструмента, предусмотренный заводом-изготовителем.

Не разрешается использование открытого огня (паяльных ламп, факелов и др.) для разогревания масел и воды.

Объекты открытых горных работ для этих целей должны быть обеспечены стационарными пунктами пароподогрева в местах стоянки машин.

Водители должны иметь при себе документ на право управления автомобилем.

Скорость и порядок движения автомобилей, автомобильных и тракторных поездов на дорогах карьера устанавливаются техническим руководителем организации с учетом местных условий.

Допускается кратковременное оставление автосамосвала на проезжей части дороги в случае его аварийного выхода из строя при ограждении автомобиля с двух сторон предупредительными знаками в соответствии с действующими правилами дорожного движения.

Движение на технологических дорогах должно регулироваться дорожными знаками, предусмотренными действующими правилами дорожного движения и дополнительными знаками в соответствии со стандартом организации.

Инструктирование по мерам безопасности водителей транспортных средств, работающих на объекте открытых горных работ, производится администрацией организации и автохозяйства. При приеме на работу и после практического ознакомления с маршрутами движения водителям должны выдаваться удостоверения на право работы на объекте открытых горных работ.

Разовый въезд в пределы горного отвода автомобилей, тракторов, тягачей, погрузочных, грузоподъемных машин и т.д., принадлежащих другим организациям, допускается только с разрешения администрации организации, эксплуатирующей объект, после обязательного инструктажа водителя (машиниста) с записью в специальном журнале.

Контроль за техническим состоянием автосамосвалов, соблюдением правил дорожного движения должен обеспечиваться должностными лицами автохозяйства организации, а при эксплуатации автотранспорта подрядной организации, работающей на основании договора, - должностными лицами подрядной организации.

При выпуске на линию и возврате в гараж должен обеспечиваться предрейсовый и послерейсовый контроль водителями и должностными лицами технического состояния автотранспортных средств в порядке и в объемах, утвержденных техническим руководителем организации.

При погрузке горной массы в автомобили экскаваторами должны выполняться следующие условия:

- ожидающий погрузки автомобиль должен находиться за пределами радиуса действия ковша экскаватора и становиться под погрузку только после разрешающего сигнала машиниста экскаватора;

- находящийся под погрузкой автомобиль должен быть в пределах видимости машиниста экскаватора;

- находящийся под погрузкой автомобиль должен быть заторможен;

- погрузка в кузов автомобиля должна производиться только сзади или сбоку, перенос экскаваторного ковша над кабиной автомобиля или трактора не разрешается;

- высота падения груза должна быть минимально возможной и во всех случаях не превышать 3м;

- нагруженный автомобиль может следовать к пункту разгрузки только после разрешающего сигнала машиниста экскаватора.

Не допускается односторонняя или сверхгабаритная загрузка, а также превышающая установленную грузоподъемность автомобиля.

Кабина автосамосвала, предназначенного для эксплуатации на объекте открытых горных работ, должна быть перекрыта специальным защитным козырьком, обеспечивающим безопасность водителя при погрузке.

При отсутствии защитного козырька водитель автомобиля обязан выйти на время загрузки из кабины и находиться за пределами максимального радиуса действия ковша экскаватора (погрузчика).

Во всех случаях при движении автомобиля задним ходом должен подаваться непрерывный звуковой сигнал.

Очистка кузова от налипшей и намерзшей горной массы должна производиться в специально отведенном месте с применением механических или иных средств.

Погрузочно-разгрузочные пункты должны иметь необходимый фронт для маневровых операций погрузочных средств, автомобилей, бульдозеров и других задействованных в технологии техники и оборудования.

Для ограничения движения машин задним ходом разгрузочные площадки должны иметь надёжную предохранительную стенку (вал) высотой не менее 0,7м.

Все места погрузки, виражи, капитальные траншеи и скользящие съезды, а также внутрикарьерные дороги в темное время суток должны быть освещены.

Перед началом движения самоходного катка машинист должен подать звуковой сигнал. Во время движения запрещается подниматься на каток и спускаться из него.

Во время движения под уклон следует обязательно включить первую передачу; на спуске или подъеме переключать передачи запрещается.

Машинисту самоходного катка во время работы запрещается передавать управления катком другому лицу, а также перевозить на площадке управления людей, кроме лиц, которые проходят практическую подготовку.

Машинист должен следить, чтобы во время работы катка возле вальцов и на пути движения не было людей.

Машинист не должен допускать резких поворотов катка, в особенности при работе на косогорах, так как это может привести к сползанию или переворачиванию катка.

При работе на насыпях высотой более 1,5 м расстояние от ближайшего вальца катка до бровки земляного полотна должно быть не менее 1 м.

Не разрешается оставлять без присмотра самоходный каток, если работает двигатель. Если машинисту надо отойти, он должен заглушить двигатель и надежно затормозить машину.

В соответствии с требованиями Трудового кодекса Республики Казахстан от 15 мая 2007 года №251-III, приказа Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 16.07.07 г. и №157-П и на основании Правил безопасности и охраны труда на каждом предприятии или организации должны быть разработаны инструкции по безопасности и охране труда для всех квалифицированных профессий рабочих, используемых на данном предприятии, скоторыми подлежат обязательному ознакомлению работники организации. Инструкции по безопасности и охране труда разрабатываются руководителями соответствующих структурных подразделений организации при участии службы охраны труда и утверждаются руководителем или главным инженером организации.

С типовыми инструкциями по безопасности и охране труда для рабочих профессий и нормативными правовые актами в этой области можно ознакомиться в приложении к изданию «Трудовые отношения в Республике Казахстан. Инструкция по безопасности и охране труда (рабочих профессий и видов работ) в Республике Казахстан» ТОО «Издательство LEM» г. Алматы 2008г.

В настоящем проекте при производстве рекультивационных работ предусматривается использование погрузчика, автосамосвалов, бульдозера и катка на пневмоходу. Следовательно, для проведения рекультивации в подрядной организации должны быть разработаны инструкции по безопасности проведения работ на этих машинах и механизмах.

## 8. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЭТАП РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ

Завершающим этапом восстановления плодородия нарушенных земель является биологическая рекультивация, включающая в себя мероприятия, направленные на восстановление продуктивности рекультивируемых земель и предотвращения развития ветровой и водной эрозии. Биологический этап рекультивации включает в себя: внесение удобрений, посев многолетних трав и уход за ними на рекультивируемой территории, после проведения технического этапа рекультивации.

Таблица 8.1

Технико-экономические показатели биологического этапа рекультивации

| Наименование |                                                                                                                       | Единица измерения | Всего       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 1            | 2                                                                                                                     | 4                 | 5           |
| 1            | Площадь, подлежащая биологическому этапу рекультивации земель/с учетом площади выполаживания и дна каменного карьера: | га                | 73,46/79,56 |
|              | в т.ч. сельскохозяйственного направления                                                                              | га                | 73,46/79,56 |
| 2            | Стоимость биологического этапа рекультивации                                                                          | тыс. тенге        | 6887,01     |
| 3            | Стоимость 1 га биологической рекультивации                                                                            | тыс. тенге        | 93,752      |

Учитывая природно-климатические условия земель, рекомендации по системе ведения сельского хозяйства для полупустынной территории Улытауского района области Улытау, для залужения из солеустойчивых засухоустойчивых, неприхотливых трав рекомендуется - житняк.

Житняк - к плодородию почвы не требователен, хорошо растет на солонцеватых почвах, улучшая их. Он жаростоек и отличается повышенной морозоустойчивостью. Норма высева житняка принята 18,0 кг/га с учетом увеличения на 30% для участков, не покрытых почвой. Посев сплошной рядовой.

Проектом рекомендуется проведение основной обработки почвы в осенний период с одновременным посевом. Посев трав принят сеялкой СТС-2. С целью повышения биологической способности нарушенных земель в первый год проектируется внесение удобрений в количестве: - карбамид (мочевина) - 0,5 ц/га; суперфосфат - 2,0 ц/га; в период ухода за посевами карбамид - 0,5 ц/га; суперфосфат - 1,0 ц/га.

В случае гибели травостоя в проекте предусмотрен повторный цикл работ по подготовке участка к посеву и посев в размере 100% рекультивируемой площади на основании п. 4.5.5 «Указаний по составлению проектов рекультивации нарушенных и нарушаемых земель в Республике Казахстан», Алматы 1993 г.

В течение мелиоративного периода (2-х лет) предусматривается 2-х кратное снегозадержание, внесение минеральных удобрений.

Таблица 8.2

Перечень и объемы работ по созданию травостоя и ухода за ним

| №<br>№<br>пп                                    | Наименование                                                        | Един.<br>изм. | Всего | Создание<br>травостоя | Уход за травостоем<br>в течение<br>мелиоративного<br>периода |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>I. Залужение</b>                             |                                                                     |               |       |                       |                                                              |
| 1                                               | Обработка почвы<br>глубокорыхлителям                                | га            | 79,56 | 79,56                 |                                                              |
| 2                                               | Боронование                                                         | га            | 79,56 | 79,56                 |                                                              |
| 3                                               | Погрузка семян                                                      | т             | 1,43  | 1,43                  |                                                              |
| 4                                               | Транспортировка семян<br>(до 50 км) и загрузка<br>сеялок            | т             | 1,43  | 1,43                  |                                                              |
| 5                                               | Погрузка минеральных<br>удобрений                                   | т             | 19,89 | 19,89                 |                                                              |
| 6                                               | Транспортировка<br>минеральных удобрений<br>свыше 50 км             | т             | 19,89 | 19,89                 |                                                              |
| 7                                               | Погрузка минеральных<br>удобрений в измельчитель                    | т             | 19,89 | 19,89                 |                                                              |
| 8                                               | Измельчение и погрузка<br>минеральных удобрений в<br>сеялки         | т             | 19,89 | 19,89                 |                                                              |
| 9                                               | Посев                                                               | га            | 79,56 | 79,56                 |                                                              |
| 10                                              | Прикатывание посевов                                                | га            | 79,56 | 79,56                 |                                                              |
| <b>II. Уход за травостоем в течение 2-х лет</b> |                                                                     |               |       |                       |                                                              |
| 1                                               | Снегозадержание (первое)                                            | га            | 79,56 |                       | 79,56                                                        |
| 2                                               | Снегозадержание (второе)                                            | га            | 79,56 |                       | 79,56                                                        |
| 3                                               | Боронование всходов                                                 | га            | 79,56 |                       | 79,56                                                        |
| 4                                               | Погрузка минеральных<br>удобрений в измельчитель                    | т             | 11,93 |                       | 11,93                                                        |
| 5                                               | Измельчение и погрузка<br>минеральных удобрений в<br>разбрасыватель | т             | 11,93 |                       | 11,93                                                        |
| 6                                               | Внесение удобрений                                                  | т             | 11,93 |                       | 11,93                                                        |

Таблица 8.3

## Расчет потребности семян и удобрений

| №№<br>п/п                                                    | Наименование                    | Един.<br>измерения | Создание<br>травостоя | Уход за<br>травостоем в<br>течение 2-х лет |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                            | 2                               | 3                  | 4                     | 5                                          |
| <b>I. Расчет потребности и стоимости семян</b>               |                                 |                    |                       |                                            |
| 1                                                            | Площадь                         | га                 | 79,56                 | -                                          |
| 2                                                            | Норма высева                    | кг/га              | 18,00                 | -                                          |
| 3                                                            | Потребность семян житняка       | т                  | 1,43                  | -                                          |
| 4                                                            | Рыночная цена 1 т семян житняка | тыс. тенге         | 500,0                 | -                                          |
| 5                                                            | Стоимость семян                 | тыс. тенге         | 716,04                | -                                          |
| <b>II. Расчет потребности и стоимость удобрений</b>          |                                 |                    |                       |                                            |
| Норма внесения минеральных удобрений (карбамид, суперфосфат) |                                 |                    |                       |                                            |
| 1                                                            | азотные                         | ц/га               | 0,5                   | 0,5                                        |
| 2                                                            | фосфорные                       | ц/га               | 2,0                   | 1,0                                        |
| Потребность минеральных удобрений                            |                                 |                    |                       |                                            |
| 1                                                            | азотные                         | т                  | 3,978                 | 3,978                                      |
| 2                                                            | фосфорные                       | т                  | 15,912                | 7,956                                      |
| Итого:                                                       |                                 | т                  | 19,89                 | 11,93                                      |
| Рыночная цена 1 тонны                                        |                                 |                    |                       |                                            |
| 1                                                            | азотных                         | тыс. тенге         | 52,0                  | 52,0                                       |
| 2                                                            | фосфорных                       | тыс. тенге         | 180,0                 | 180,0                                      |
| Стоимость удобрений                                          |                                 |                    |                       |                                            |
| 1                                                            | азотных                         | тыс. тенге         | 206,856               | 206,856                                    |
| 2                                                            | фосфорных                       | тыс. тенге         | 2864,16               | 1432,08                                    |
| <b>Итого:</b>                                                |                                 | тыс. тенге         | 3071,016              | 1638,936                                   |

Удобрения завозятся, по технологии возделывания, ежегодно, в течение мелиоративного периода и хранятся в специально оборудованных складах.

При транспортировке удобрений рекомендуется соблюдать необходимые меры предосторожности - транспортные средства должны быть оснащены тентами, позволяющими закрывать дно кузова и перевозимые минеральные удобрения, во избежание потерь и попадания атмосферных осадков.

Сметная стоимость рекомендуемых работ по биологическому этапу рекультивации 1 га (снегозадержание, глубокое рыхление почвы, боронование почвы, внесение минеральных удобрений, посев семян, прикатывание посевов) в базисных ценах 2001 г. в соответствии с СНиП 2002 г., составляет 3619,5 тенге. Переход на современный уровень сметной стоимости от базисного осуществляется через индекс изменения месячного расчетного показателя, устанавливаемого ежегодно согласно бюджетному



законодательству. МРП<sub>2001</sub>=775 тенге, МРП<sub>2025</sub>=3932 тенге, индекс изменения = 5,07. Приведенная к 2025г. стоимость перечисленных работ составит 18,351тенге за 1 га.

Таким образом, сметная стоимость работ по биологическому этапу рекультивациисоставит 6887,01тыс. тг. или 93,752 тыс. тг. на 1 га площади нарушенных земель, в том числе: а) обработка почвы, боронование, погрузка и доставка удобрений и семян и т.д. – 1461,017тыс. тг; б) стоимость семян – 716,04тыс.тг; стоимость удобрений – 4709,952тыс.тг. Сводная таблица сметной стоимости технической и биологической рекультивации приведена в таблице 8.4.

Таблица 8.4

Сводная таблица сметной стоимости работ по рекультивации

| № п/п        | Наименование участка | Площадь, га тех./биол. | Техническая      |                | Биологическая    |                | Всего             |                 |
|--------------|----------------------|------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-----------------|
|              |                      |                        | Ст-ть га, тыс.тг | Всего, тыс.тг  | Ст-ть га, тыс.тг | Всего, тыс.тг  | Ст-ть* га, тыс.тг | Итого, тыс.тг   |
| 1            | 2                    | 3                      | 4                | 5              | 6                | 7              | 8                 | 9               |
| 1            | «км 224»             | 15,75/17,04            | 194,68           | 3066,23        | 93,654           | 1475,05        | 288,335           | 4541,28         |
| 2            | «км 238»             | 12,5/13,5              | 188,87           | 2360,88        | 93,489           | 1168,61        | 282,359           | 3529,49         |
| 3            | «км 330Б»            | 16,8/18,69             | 234,95           | 3947,19        | 96,302           | 1617,88        | 331,254           | 5565,07         |
| 4            | «км 252»             | 6,75/7,52              | 680,84           | 4595,7         | 96,438           | 650,96         | 777,283           | 5246,66         |
| 5            | «км 264»             | 21,66/22,81            | 162,05           | 3510,1         | 91,160           | 1974,52        | 253,214           | 5484,62         |
| <b>Итого</b> |                      | <b>73,46/79,56</b>     | <b>237,95</b>    | <b>17480,1</b> | <b>93,752</b>    | <b>6887,01</b> | <b>331,706</b>    | <b>24367,11</b> |

Примечание: Усредненная стоимость 1 га рекультивации, отнесенная на площадь нарушенных земель участка.

Технико-экономические показатели рекультивации по отдельным участкам приведены в таблицах 8.5-8.9.

Проект рекультивации будет являться составной частью проекта ликвидации объекта. Для полного финансового обеспечения выполнения программы ликвидации (консервации) объекта работ или ликвидации последствий своей деятельности недропользователь создает ликвидационный фонд. Размер ликвидационного фонда определяется проектом разработки. Средства этого фонда подлежат обязательному зачислению на специальный счет в порядке и на условиях, устанавливаемых Правительством РК с последующим использованием этих средств недропользователем для выполнения работ по рекультивации и ликвидации последствий своей деятельности при разработке грунтовых резервов.

**Технико-экономические показатели рекультивации участка «км 224»**

| №№<br>п/п                                        | Наименование показателя                                                 | ед.изм             | Кол-во  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| <b>Этап проведения добычи (нарушения земель)</b> |                                                                         |                    |         |
| 1                                                | Площадь карьера                                                         | га                 | 15,75   |
| 2                                                | Мощность вскрыши                                                        | м                  | 0,2     |
| 3                                                | Объем вскрыши - внутренний отвал                                        | тыс.м <sup>3</sup> | 31,50   |
| <b>Технический этап рекультивации</b>            |                                                                         |                    |         |
| 1                                                | Ширина снятия дополнительной вскрыши при выполаживании бортов карьера   | м                  | 8,06    |
| 2                                                | Площадь дополнительной вскрыши при выполаживании бортов карьера         | га                 | 1,29    |
| 3                                                | Дополнительный объем вскрыши при выполаживании бортов карьера           | тыс.м <sup>3</sup> | 2,58    |
| 4                                                | Общий объем пород вскрыши                                               | тыс.м <sup>3</sup> | 34,08   |
| 5                                                | Объем срезки грунта при выполаживании бортов карьера до 10°.            | тыс.м <sup>3</sup> | 12,25   |
| 6                                                | Нанесение пород вскрыши на дно и откосы карьера                         | тыс.м <sup>3</sup> | 34,08   |
| 7                                                | Планировка, уплотнение и прикатывание поверхности дна и откосов карьера | га                 | 17,04   |
| <b>Биологический этап рекультивации</b>          |                                                                         |                    |         |
| 1                                                | Посев многолетних трав и уход за ними                                   | га                 | 17,04   |
| <b>Сметная стоимость работ по рекультивации</b>  |                                                                         |                    |         |
| 1                                                | Технического этапа                                                      | тыс.тенге          | 3066,23 |
| 2                                                | Биологического этапа                                                    | тыс.тенге          | 1475,05 |
| 3                                                | Всего                                                                   | тыс.тенге          | 4541,28 |
| <b>Сметная стоимость 1 га рекультивации</b>      |                                                                         |                    |         |
| 1                                                | Технический этап                                                        | тыс.тенге          | 194,68  |
| 2                                                | Биологический этап                                                      | тыс.тенге          | 93,654  |
| 3                                                | Всего                                                                   | тыс.тенге          | 288,33* |

Примечание:

Работы по этапу добычи (нарушения земель) не относятся к проекту рекультивации.

\*Сметная стоимость, отнесенная к площади карьера (15,75 га)

**Технико-экономические показатели рекультивации участка «км 238»**

| №№<br>п/п                                        | Наименование показателя                                                 | ед.изм             | Кол-во  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| <b>Этап проведения добычи (нарушения земель)</b> |                                                                         |                    |         |
| 1                                                | Площадь карьера                                                         | га                 | 12,5    |
| 2                                                | Мощность вскрыши                                                        | м                  | 0,2     |
| 3                                                | Объем вскрыши - внутренний отвал                                        | тыс.м <sup>3</sup> | 25,0    |
| <b>Технический этап рекультивации</b>            |                                                                         |                    |         |
| 1                                                | Ширина снятия дополнительной вскрыши при выполаживании бортов карьера   | м                  | 6,7     |
| 2                                                | Площадь дополнительной вскрыши при выполаживании бортов карьера         | га                 | 1,0     |
| 3                                                | Дополнительный объем вскрыши при выполаживании бортов карьера           | тыс.м <sup>3</sup> | 2,01    |
| 4                                                | Общий объем пород вскрыши                                               | тыс.м <sup>3</sup> | 27,01   |
| 5                                                | Объем срезки грунта при выполаживании бортов карьера до 10°.            | тыс.м <sup>3</sup> | 8,54    |
| 6                                                | Нанесение пород вскрыши на дно и откосы карьера                         | тыс.м <sup>3</sup> | 27,01   |
| 7                                                | Планировка, уплотнение и прикатывание поверхности дна и откосов карьера | га                 | 13,5    |
| <b>Биологический этап рекультивации</b>          |                                                                         |                    |         |
| 1                                                | Посев многолетних трав и уход за ними                                   | га                 | 13,5    |
| <b>Сметная стоимость работ по рекультивации</b>  |                                                                         |                    |         |
| 1                                                | Технического этапа                                                      | тыс.тенге          | 2360,88 |
| 2                                                | Биологического этапа                                                    | тыс.тенге          | 1168,61 |
| 3                                                | Всего                                                                   | тыс.тенге          | 3529,49 |
| <b>Сметная стоимость 1 га рекультивации</b>      |                                                                         |                    |         |
| 1                                                | Технический этап                                                        | тыс.тенге          | 188,87  |
| 2                                                | Биологический этап                                                      | тыс.тенге          | 93,489  |
| 3                                                | Всего                                                                   | тыс.тенге          | 282,36* |

Примечание:

Работы по этапу добычи (нарушения земель) не относятся к проекту рекультивации.

\*Сметная стоимость, отнесенная к площади карьера (12,5га)

**Технико-экономические показатели рекультивации участка «км 330Б»**

| №№<br>п/п                                        | Наименование показателя                                                 | ед.изм             | Кол-во  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| <b>Этап проведения добычи (нарушения земель)</b> |                                                                         |                    |         |
| 1                                                | Площадь карьера                                                         | га                 | 16,8    |
| 2                                                | Мощность вскрыши                                                        | м                  | 0,2     |
| 3                                                | Объем вскрыши - внутренний отвал                                        | тыс.м <sup>3</sup> | 33,60   |
| <b>Технический этап рекультивации</b>            |                                                                         |                    |         |
| 1                                                | Ширина снятия дополнительной вскрыши при выполаживании бортов карьера   | м                  | 10,18   |
| 2                                                | Площадь дополнительной вскрыши при выполаживании бортов карьера         | га                 | 1,89    |
| 3                                                | Дополнительный объем вскрыши при выполаживании бортов карьера           | тыс.м <sup>3</sup> | 3,79    |
| 4                                                | Общий объем пород вскрыши                                               | тыс.м <sup>3</sup> | 37,39   |
| 5                                                | Объем срезки грунта при выполаживании бортов карьера до 10°.            | тыс.м <sup>3</sup> | 22,72   |
| 6                                                | Нанесение пород вскрыши на дно и откосы карьера                         | тыс.м <sup>3</sup> | 37,39   |
| 7                                                | Планировка, уплотнение и прикатывание поверхности дна и откосов карьера | га                 | 18,69   |
| <b>Биологический этап рекультивации</b>          |                                                                         |                    |         |
| 1                                                | Посев многолетних трав и уход за ними                                   | га                 | 18,69   |
| <b>Сметная стоимость работ по рекультивации</b>  |                                                                         |                    |         |
| 1                                                | Технического этапа                                                      | тыс.тенге          | 3947,19 |
| 2                                                | Биологического этапа                                                    | тыс.тенге          | 1617,88 |
| 3                                                | Всего                                                                   | тыс.тенге          | 5565,07 |
| <b>Сметная стоимость 1 га рекультивации</b>      |                                                                         |                    |         |
| 1                                                | Технический этап                                                        | тыс.тенге          | 234,95  |
| 2                                                | Биологический этап                                                      | тыс.тенге          | 96,302  |
| 3                                                | Всего                                                                   | тыс.тенге          | 331,25* |

Примечание:

Работы по этапу добычи (нарушения земель) не относятся к проекту рекультивации.

\*Сметная стоимость, отнесенная к площади карьера (16,8га)

**Технико-экономические показатели рекультивации участка «км 252»**

| №№<br>п/п                                        | Наименование показателя                                                 | ед.изм             | Кол-во  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| <b>Этап проведения добычи (нарушения земель)</b> |                                                                         |                    |         |
| 1                                                | Площадь карьера                                                         | га                 | 6,75    |
| 2                                                | Мощность вскрыши                                                        | м                  | 0,2     |
| 3                                                | Объем вскрыши - внутренний отвал                                        | тыс.м <sup>3</sup> | 70,2**  |
| <b>Технический этап рекультивации</b>            |                                                                         |                    |         |
| 1                                                | Ширина снятия дополнительной вскрыши при выполаживании бортов карьера   | м                  | 5,6     |
| 2                                                | Площадь дополнительной вскрыши при выполаживании бортов карьера         | га                 | 0,77    |
| 3                                                | Дополнительный объем вскрыши при выполаживании бортов карьера           | тыс.м <sup>3</sup> | 1,55    |
| 4                                                | Общий объем пород вскрыши                                               | тыс.м <sup>3</sup> | 71,75   |
| 5                                                | Объем срезки грунта при выполаживании бортов карьера до 10°.            | тыс.м <sup>3</sup> | 5,12    |
| 6                                                | Нанесение пород вскрыши на дно и откосы карьера                         | тыс.м <sup>3</sup> | 71,75   |
| 7                                                | Планировка, уплотнение и прикатывание поверхности дна и откосов карьера | га                 | 7,52    |
| <b>Биологический этап рекультивации</b>          |                                                                         |                    |         |
| 1                                                | Посев многолетних трав и уход за ними                                   | га                 | 7,52    |
| <b>Сметная стоимость работ по рекультивации</b>  |                                                                         |                    |         |
| 1                                                | Технического этапа                                                      | тыс.тенге          | 4595,7  |
| 2                                                | Биологического этапа                                                    | тыс.тенге          | 650,96  |
| 3                                                | Всего                                                                   | тыс.тенге          | 5246,66 |
| <b>Сметная стоимость 1 га рекультивации</b>      |                                                                         |                    |         |
| 1                                                | Технический этап                                                        | тыс.тенге          | 680,84  |
| 2                                                | Биологический этап                                                      | тыс.тенге          | 96,438  |
| 3                                                | Всего                                                                   | тыс.тенге          | 777,28* |

Примечание:

Работы по этапу добычи (нарушения земель) не относятся к проекту рекультивации.

\*Сметная стоимость, отнесенная к площади карьера (6,75га)

\*\*В том числе некондиционные глины (ТМО) - 56,7тыс.м<sup>3</sup>

**Технико-экономические показатели рекультивации участка «км 264»**

| №№<br>п/п                                        | Наименование показателя                                                 | ед.изм             | Кол-во  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| <b>Этап проведения добычи (нарушения земель)</b> |                                                                         |                    |         |
| 1                                                | Площадь карьера                                                         | га                 | 21,66   |
| 2                                                | Мощность вскрыши                                                        | м                  | 0,2     |
| 3                                                | Объем вскрыши - внутренний отвал                                        | тыс.м <sup>3</sup> | 43,32   |
| <b>Технический этап рекультивации</b>            |                                                                         |                    |         |
| 1                                                | Ширина снятия дополнительной вскрыши при выполаживании бортов карьера   | м                  | 4,88    |
| 2                                                | Площадь дополнительной вскрыши при выполаживании бортов карьера         | га                 | 1,15    |
| 3                                                | Дополнительный объем вскрыши при выполаживании бортов карьера           | тыс.м <sup>3</sup> | 2,3     |
| 4                                                | Общий объем пород вскрыши                                               | тыс.м <sup>3</sup> | 45,62   |
| 5                                                | Объем срезки грунта при выполаживании бортов карьера до 10°.            | тыс.м <sup>3</sup> | 7,14    |
| 6                                                | Нанесение пород вскрыши на дно и откосы карьера                         | тыс.м <sup>3</sup> | 45,62   |
| 7                                                | Планировка, уплотнение и прикатывание поверхности дна и откосов карьера | га                 | 22,81   |
| <b>Биологический этап рекультивации</b>          |                                                                         |                    |         |
| 1                                                | Посев многолетних трав и уход за ними                                   | га                 | 22,81   |
| <b>Сметная стоимость работ по рекультивации</b>  |                                                                         |                    |         |
| 1                                                | Технического этапа                                                      | тыс.тенге          | 3510,1  |
| 2                                                | Биологического этапа                                                    | тыс.тенге          | 1974,52 |
| 3                                                | Всего                                                                   | тыс.тенге          | 5484,62 |
| <b>Сметная стоимость 1 га рекультивации</b>      |                                                                         |                    |         |
| 1                                                | Технический этап                                                        | тыс.тенге          | 162,05  |
| 2                                                | Биологический этап                                                      | тыс.тенге          | 91,16   |
| 3                                                | Всего                                                                   | тыс.тенге          | 253,21* |

Примечание:

Работы по этапу добычи (нарушения земель) не относятся к проекту рекультивации.

\*Сметная стоимость, отнесенная к площади карьера (21,66га)

## **9. КОНТРОЛЬ НАД ПРОЦЕССОМ РЕКУЛЬТИВАЦИИ. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ РЕКУЛЬТИВИРОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬ**

Контроль за ходом производства технического этапа осуществляется технической службой Филиала Компании с ограниченной ответственностью «STECOLCORPORATION» в РК.

Приемка-передача рекультивированных земель землепользователю производится комиссией, назначаемой акимом района (города) на территории которого находится эти земли, и оформляется актом.

В состав комиссии по приемке-передаче рекультивированных земель включаются: заместитель акима района (города); инженер-землеустроитель; представители предприятия, передающего земли, и землепользователя, принимающих земли.

При приемке-передаче рекультивированных земель комиссия обязана:

- проверить соответствие выполненных рекультивационных работ по утвержденному проекту и дать оценку;
- дать заключение о готовности объекта к проведению работ по восстановлению плодородия нарушенных земель;
- уточнить продолжительность периода мелиоративной подготовки, а также последующие использование рекультивированных земель.

При наличии дефектов и недоделок комиссия устанавливает сроки их исправления. Акт приемки-передачи рекультивированных земель не позднее чем в двухнедельный срок после устранения дефектов и недоделок утверждается акиматом.

Принятые комиссией рекультивированные земельные участки возвращаются прежним или отводятся другим землепользователям в установленном порядке.

Акт приемки-передачи рекультивированных земель составляется в трех экземплярах.

Один экземпляр направляется в акимат инженеру-землеустроителю, второй - землепользователю, третий - предприятию, передающему рекультивированные земли. К акту прилагается план передаваемого земельного участка.

Предприятие, осуществляющее рекультивацию земель, несет ответственность:

- за качественное выполнение в установленные сроки всех работ в соответствии с утвержденным проектом, за своевременную передачу для дальнейшего использования рекультивированных земель;
- за своевременное перечисление средств землепользователям на осуществление мероприятий по восстановлению плодородия рекультивируемых земель (в соответствии с утвержденным проектом) после завершения работ по рекультивации и передаче (возврате) этих земель для использования в сельском хозяйстве.

## 10. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В соответствии с положением ст. 397 п.2 пп 11). Экологического кодекса Республики Казахстан, недропользователи при разработке полезных ископаемых обязаны проводить рекультивацию нарушенных земель.

Рекультивация земель - комплекс работ, направленных на восстановление нарушенных земель для определенного целевого использования, в том числе прилегающих земельных участков, полностью или частично утративших свою ценность в результате отрицательного воздействия нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды.

Согласно Земельного кодекса Республики Казахстан (глава 17 статьи 139, 140, 141) и Постановления Правительства Республики Казахстан от 17 сентября 1997года № 1347 «Об утверждении порядка ведения мониторинга земель в Республике Казахстан» собственники земельных участков и землепользователи должны предусматривать и осуществлять мероприятия по охране земель направленные на:

- рекультивацию нарушенных земель, восстановления их плодородия и других полезных свойств земли и своевременное вовлечение ее в хозяйственный оборот;
- снятие, сохранение и использование плодородного слоя почвы при проведении работ, связанных с нарушением земель;
- устранение очагов неблагоприятного влияния на окружающую среду;
- улучшение санитарно-гигиенических условий жизни населения, повышение эстетической ценности ландшафта.

Охрана земель включает систему правовых, организационных, экономических, технологических и других мероприятий, направленных на охрану земли, как части окружающей среды. В этих целях в Республике Казахстан ведется мониторинг земель, который представляет собой систему базовых (исходных), оперативных и периодических наблюдений за качественным и количественным состоянием земельного фонда.

Социально-экологический результат рекультивации заключается в создании благоприятных условий для жизнедеятельности человека и функционирования экологических систем в районе размещения нарушенных земель и предусматривает следующие виды:

- природоохранный результат - устранение экологического ущерба причиняемого нарушенными землями, в период осуществления рекультивационных работ независимо от направления рекультивации;
- природовосстановительный результат - создание условий в районе размещения нарушенных земель после их рекультивации, наиболее отвечающих социально-экологическим требованиям (санитарно-гигиеническим, эстетическим, рекреационным и др.).

Рекультивация земель обеспечивает снижение воздействия нарушенных земель на компоненты окружающей среды: атмосферу, поверхностные и грунтовые



воды, грунты и почвы, растительный и животный мир, оказывает благотворное влияние на здоровье человека и направлена на устранение экологического ущерба.

Перед началом производства работ строительные машины и механизмы должны пройти технический осмотр и проверку на токсичность.

Все земляные работы необходимо проводить в строгом соответствии с проектом. Строительная техника и передвижной автотранспорт должны содержаться на специально подготовленных местах парковки с твердым покрытием и устройством ливневой канализации (сбор и очистка).

В целях исключения попадания горюче-смазочных материалов на почву, заправку и ремонт техники необходимо производить в специально отведенном для этого месте. Заправка стационарных машин и машин с ограниченной подвижностью производится заправщиками.

На каждом объекте работы механизмов должен быть организован сбор отработанных и заменяемых масел с последующей отправкой их на регенерацию. Слив масел на почвенный покров или водные объекты категорически запрещается.

Для предотвращения пыления при производстве земляных работ необходимо, чтобы почвогрунты имели оптимальную влажность. В этих целях перед началом производства работ и, периодически, в период производства работ проводить мероприятия по увлажнению почвогрунтов.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Земельный Кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 г. N 442-III Алматы, 2008г.
2. Указания по составлению проектов рекультивации нарушенных и нарушаемых земель в Республике Казахстан , Алматы, 1993 г.
3. ГОСТы Охрана природы 17.5.3.04-83, 17.5.1.02-85, 17.5.3.05-84, 17.5.1.03-86, 17.4.2.02-83, 17.5.3.06-85, 17.5.1.06-84, 17.4.3.01-83, 17.4.4.02-84, 27593-88, 28168-89
4. СНиПы 1.04.03-85, III-8-76. Правила производства и приемки работ. Земляные сооружения.
5. Технические указания по проведению почвенно-мелиоративных и почвенно-грунтовых изысканий при проектировании рекультивации земель, снятия, сохранения и использования плодородного слоя почвы. Алма-Ата 1984 г.
6. Справочник по землеустройству, Образцова Н.Р., Пузанов К.С.Диев, 1973г.
7. Рекультивация земель нарушенных открытыми разработками Дороненко Е.П., Москва, 1979г.
8. Техника и технология рекультивации на открытых разработках. Полищук А.К., Михайлов А.М., Москва, 1977г.
9. Рекомендации по охране почв, растительности, животного мира в составе раздела «Охрана окружающей среды» в проектах хозяйственной деятельности, Кокшетау, 2000 г.
10. Экологический кодекс Республики Казахстан.
11. Инструкция о разработке проектов рекультивации нарушенных земель. Приказ Министра сельского хозяйства РК №289 от 02.08.2023г.
12. Инструкция по проведению оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при разработке предплановой, предпроектной и проектной документации. - Астана: Министерство охраны окружающей среды РК, 28 июня 2007 г.
13. Почва Карагандинской области. Основные характеристики, классификации и экология почвы, Карагандинский филиал АДГП НПЦзем, 2011г.

## **ПРИЛОЖЕНИЯ**

СОГЛАСОВАНО:

Директор

ТОО «Жетісу-Жерқойнауы»

А.Рахметов

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2025 года



«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель проекта

Филиала Компании с

ограниченной ответственностью

«STECOL CORPORATION» ВРК

Янг Хонвэй

2025г.



ЗАДАНИЕ

на разработку проекта рекультивации нарушенных земель

| №<br>п/п | Перечень                                                                                                           | Показатели                                                                                           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                  | 3                                                                                                    |
| 1        | Основание для проектирования (акт обследования нарушенных (подлежащих нарушению) земель, подлежащих рекультивации) | Акт обследования нарушенных земель по Ұлытаускому району области Ұлытау                              |
| 2        | разработчик проекта                                                                                                | ТОО «Жетісу-Жерқойнауы»                                                                              |
| 3        | Стадийность проектирования                                                                                         | Одностадийный проект                                                                                 |
|          | технический этап                                                                                                   | ТОО «Жетісу-Жерқойнауы»                                                                              |
|          | биологический этап                                                                                                 | ТОО «Жетісу-Жерқойнауы»                                                                              |
| 4        | Наименование объекта – участка                                                                                     | Добыча общераспространенных полезных ископаемых, используемых при реконструкции автомобильной дороги |
| 5        | Местоположение объекта – участка (административный район)                                                          | Ұлытауский район области Ұлытау                                                                      |
| 6        | Характеристика объекта рекультивации:                                                                              | Карьер, образованный при добыче общераспространенных полезных ископаемых                             |
|          | общая площадь, гектар                                                                                              | 73,46                                                                                                |
|          | из них предполагается использовать под (предварительно):                                                           |                                                                                                      |
|          | пашню                                                                                                              | -                                                                                                    |
|          | сенокосы                                                                                                           | -                                                                                                    |
|          | пастбища                                                                                                           | 73,46                                                                                                |
|          | многолетние насаждения                                                                                             | -                                                                                                    |
|          | лесные насаждения, включая лесные                                                                                  | -                                                                                                    |

|    |                                                                                                            |                                                                                                                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | полосы                                                                                                     |                                                                                                                                   |
| 1  | 2                                                                                                          | 3                                                                                                                                 |
|    | залужение                                                                                                  | -                                                                                                                                 |
|    | производственное и<br>непроизводственное строительство                                                     | -                                                                                                                                 |
| 7  | Наличие заскладированного (или<br>снимаемого) плодородного слоя<br>почвы, тысячи метров <sup>3</sup>       | Не имеются                                                                                                                        |
| 8  | Наличие заскладированного (или<br>снимаемого) потенциально-<br>плодородного слоя почвы, тысяч <sup>3</sup> | 203,62 – породы вскрыши, будут<br>заскладированы в процессе<br>добычи (внешние отвалы)                                            |
| 9  | Площадь отвода земель для<br>временных отвалов, гектар                                                     | -                                                                                                                                 |
| 10 | Технические проблемы:                                                                                      | Не имеются                                                                                                                        |
|    | степень засоления и вторичной<br>токсичности пород                                                         | Не загрязнен                                                                                                                      |
|    | уровень загрязнения                                                                                        | -                                                                                                                                 |
|    | глубина проникновения загрязнения                                                                          | -                                                                                                                                 |
|    | степень обводненности объекта и<br>необходимость дренажа                                                   | Не обводнен. Дренаж не<br>требуется                                                                                               |
|    | степень развития водной и ветровой<br>эрозии других геодинамических<br>процессов                           | В слабой степени водная и<br>ветровая эрозия                                                                                      |
|    | степень засоренности камнем                                                                                | Не засорены                                                                                                                       |
|    | степень зарастания древесной и<br>кустарниковой растительностью                                            | Древесной и кустарниковой<br>растительности - нет                                                                                 |
| 11 | Виды и объемы необходимых<br>изысканий                                                                     | Почвенно-грунтовые изыскания<br>(определение<br>гранулометрического состава,<br>общего гумуса, валового азота,<br>фосфора, калия) |
| 12 | Предварительные сроки начала и<br>окончания работ: технического этапа<br>рекультивации                     | 3 месяца после окончания добычи<br>(2026г)                                                                                        |
| 13 | Срок завершения разработки<br>проекта рекультивации                                                        | Декабрь 2025г.                                                                                                                    |
| 14 | Особые условия                                                                                             | нет                                                                                                                               |



## ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

18.08.2011 года0004297

Выдана

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жетісу-Жеркөйнағы"

040900, Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, Каскеленская г.а., г.Каскелен, АЛМАЛЫ, дом № 6., БИН: 110440009773

(полное наименование, местонахождение, реквизиты БИН юридического лица / полностью фамилия, имя, отчество, реквизиты ИИН физического лица)

на занятие

Проектирование (технологическое) и (или) эксплуатация горных (разведка, добыча полезных ископаемых), нефтехимических, химических производств, проектирование (технологическое) нефтегазоперерабатывающих производств, эксплуатация магистральных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов;

(наименование лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

Вид лицензии

генеральнаяОсобые условия  
действия лицензии

(в соответствии со статьей 9-1 Закона Республики Казахстан «О лицензировании»)

Лицензиар

Комитет промышленности, Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан.

(полное наименование лицензиара)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара)

Место выдачи

г.Астана



## ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

Номер лицензии 0004297

Дата выдачи лицензии 18.08.2011

Перечень лицензируемых видов работ и услуг, входящих в состав лицензируемого вида деятельности

проектирование добычи твердых полезных ископаемых, нефти, газа, нефтегазоконденсата, составление проектов и технологических регламентов на разработку месторождений твердых полезных ископаемых, нефтегазовых месторождений, составление технико-экономического обоснования проектов разработки месторождений твердых полезных ископаемых, нефтегазовых месторождений;

Филиалы,  
представительства

(полное наименование, местонахождение, реквизиты)

Производственная база

(местонахождение)

Орган, выдавший  
приложение к лицензии

Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан. Комитет промышленности

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) органа, выдавшего лицензию)

Дата выдачи приложения к  
лицензии

Номер приложения к  
лицензии 001

0004297





## ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

04.09.2013 года

13014203

**Выдана**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "Жетісу-Жеркойнавы"**

040900, Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, Каскеленская г.а., г.Каскелен, улица Алмалы, дом № 6., БИН: 110440009773

(полное наименование, местонахождение, реквизиты БИН юридического лица / полностью фамилия, имя, отчество, реквизиты ИИН физического лица)

**на занятие**

**Изыскательская деятельность**

(наименование лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

**Вид лицензии**

**генеральная**

**Особые условия  
действия лицензии**

(в соответствии со статьей 9-1 Закона Республики Казахстан «О лицензировании»)

**Лицензиар**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального  
хозяйства Министерства регионального развития Республики  
Казахстан**

(полное наименование лицензиара)






**Руководитель  
(уполномоченное лицо)**

**ГАЛИЕВ ВЛАДИСЛАВ GERMAHOVИЧ**

(фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара)

**Место выдачи**

**г.Астана**



Берілген құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаба туралы» 2003 жылғы 7 қазтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатқа тең.  
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





## ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

Номер лицензии 13014203  
Дата выдачи лицензии 04.09.2013 год

### Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

- Инженерно-геодезические работы, в том числе:

- Геодезические работы, связанные с переносом в натуру с привязкой инженерно-геологических выработок, геофизических и других точек изысканий
- Топографические работы для проектирования и строительства (съемки в масштабах от 1:10000 до 1:200, а также съемки подземных коммуникаций и сооружений, трассирование и съемка наземных линейных сооружений и их элементов)

Производственная база Алматинская область, город Талдыкорган, улица Гали Орманова, 72  
(местонахождение)

Лицензиат Товарищество с ограниченной ответственностью "Жетісу-Жерқойнауы"

040900, Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, Каскеленская г.а., г.Каскелен, улица Алмалы, дом № 6., БИН: 110440009773  
(полное наименование, местонахождение, реквизиты БИН юридического лица / полностью фамилия, имя, отчество, реквизиты ИИН физического лица)

Лицензиар Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства регионального развития Республики Казахстан  
(полное наименование лицензиара)


Руководитель (уполномоченное лицо) ГАЛИЕВ ВЛАДИСЛАВ GERMAHOVICH  
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Номер приложения к лицензии 001

Дата выдачи приложения к лицензии 06.06.2012

Срок действия лицензии

Место выдачи г.Астана



Берілген құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» 2003 жылғы 7 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатқа тең.  
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

**АКТ**

обследования нарушенных (подлежащих нарушению) земель,  
подлежащих рекультивации

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2025 года

**1. Разработчик проекта ТОО «Жетісу-Жерқойнауы» - Директор  
Рахметов Аскар Тулумканович**

(Фамилия И.О., должность)

**2. Заказчик проекта Филиал Компании с ограниченной  
ответственностью «STECOLCORPORATION» в РК-  
Руководитель проекта - Янг Хонвэй**

(Фамилия И.О., должность)

**3. Руководитель ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и  
градостроительства Улытауского района» области Улытау –  
Есназаров Болатбек Камариденович**

(Фамилия И.О., должность)

Провели обследование земельного участка, нарушенных или подлежащих  
нарушению.

**Филиал Компании с ограниченной ответственностью  
«STECOLCORPORATION» в РК**

(наименование организации, разрабатывающая месторождения, проводящая строительные работы)

В результате обследования установлено:

1. Участки нарушенных земель «км 224» - 15,75га; «км 238» - 12,5га; «км  
330Б» - 16,8га; «км 252» - 6,75га; «км 264» - 21,66га, общей площадью –  
73,46 га расположен в Улытауском районе области Улытау.

2. Земля, примыкающая к участку нарушенных земель, используется как  
**пастбищные угодья и являются землями сельхозназначения.**

(указывается фактическое использование, а также возможное перспективное использование земель)

3. Описание нарушенных земель **Проектируемый участок земли будет  
нарушен при проведении добычи строительного камня с площадью,  
указанной в п.1.**

(вид нарушений, площадные характеристики)

4. Рекомендации землепользователя или землевладельца:

**-выполаживание бортов карьера до уклона 10°, нанесение  
потенциально-плодородного слоя почвы (пород вскрыши) на  
нарушенную поверхность;**

В результате обследования земельных участков рекомендовано рассмотреть в  
проекте:

1. Направление рекультивации **Сельскохозяйственное – создание на  
нарушенных землях сельскохозяйственных угодий (пастбищ).**

(вид угодий или иного направления хозяйственного использования земель)

2. Виды работ технического этапа рекультивации:

- снятие, транспортировка, складирование и хранение потенциально-плодородного слоя почвы (пород вскрыши);

- выполаживание бортов карьеров до уклона 10°;

- нанесение потенциально – плодородного слоя почвы (пород вскрыши) на рекультивируемую поверхность.

3. Использовать для рекультивации потенциально плодородные породы и плодородный слой почвы с вскрыши участков.

4. Необходимо проведение биологического этапа рекультивации:

Установить по результатам исследования почв.

5. Использовать имеющиеся топографические планы нарушаемых земель в масштабе 1:2000-1:5000, материалы по проведению разведки участков, проектированию добычных работ и результаты лабораторных исследований почв.

Директор  
ТОО «Жетісу-Жерқойнауы»

А.Т. Рахметов

Руководитель проекта  
Филиала Компании с  
ограниченной ответственностью  
«STECOLCORPORATION» ВРК

Янг Хонвэй

РуководительГУ «Отдел  
земельных отношений, архитектуры  
и градостроительства Ұлытауского  
района»областиҰлытау

Б.К. Есназаров
